PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02198**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 194,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02199	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

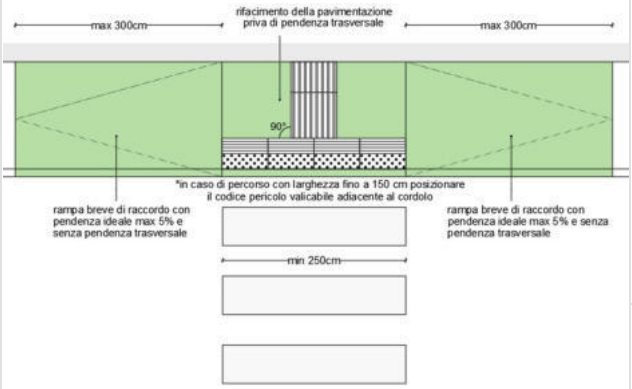

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.016 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Bariglaria 8, Udine	1	E 00FF5-02199

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 194,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02198	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	4016 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

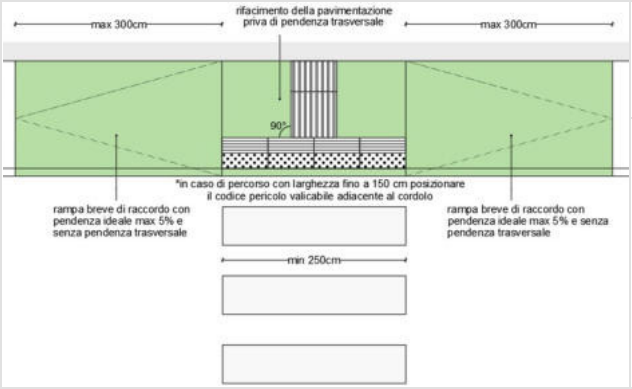

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02198.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02200**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

61 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02201**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

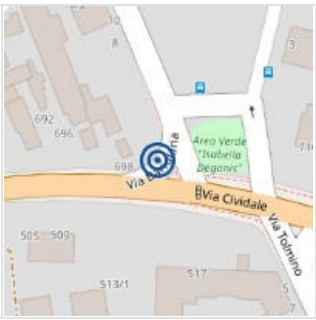

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

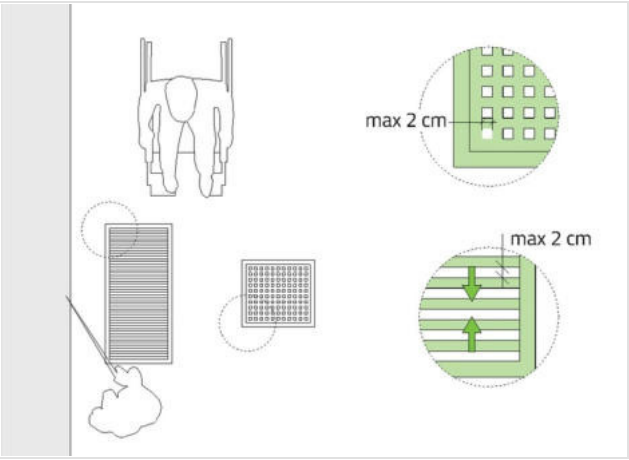

PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **339 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02202**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

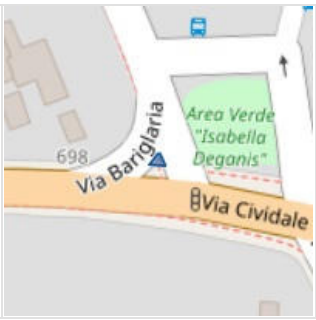

Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Assenza di segnaletica tattilo plantare in tre direzioni.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

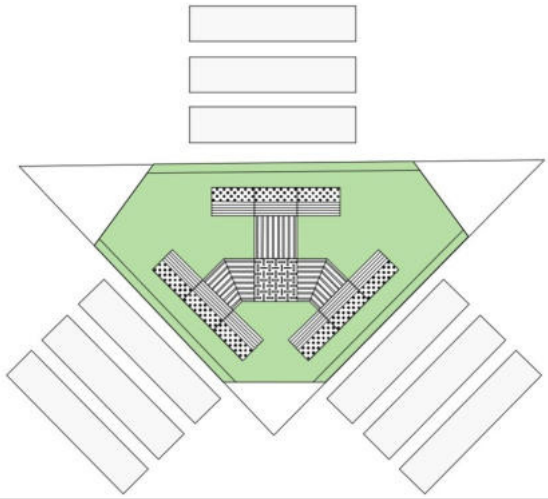

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.053 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02203**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 730,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02204**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 730,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

65 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02205**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02207**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02208**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03451	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 8, Udine	**2313 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03451.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02209**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

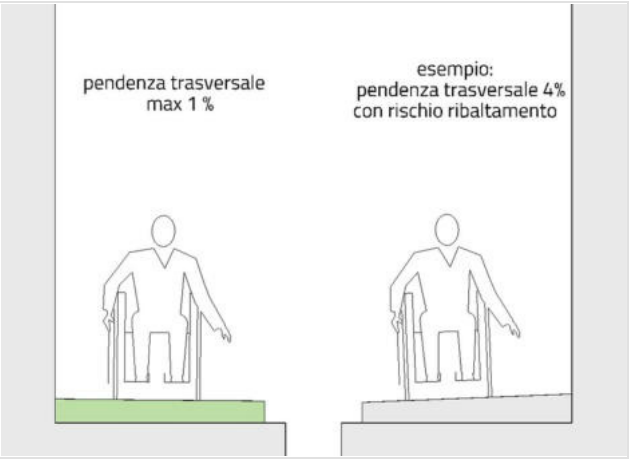

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.320 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02210**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02211	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02213	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

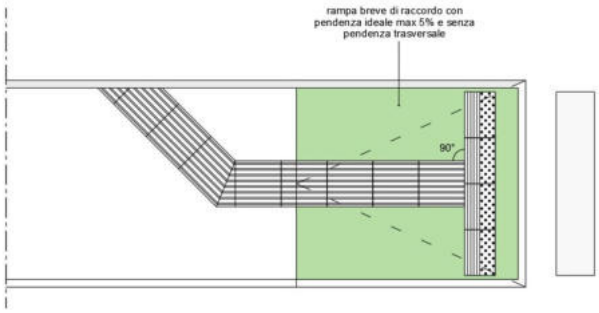

(modificato)
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, posa di moduli tattilo-plantari

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale e posa di moduli tattilo-plantari

2.190 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02211**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02210	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato **2190 €**
E 00FF5-02213	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

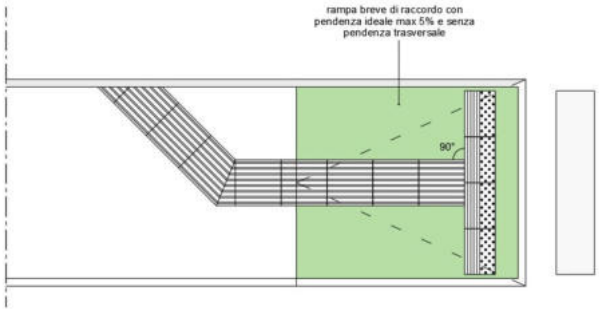

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02210.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02212**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1080,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

96 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02213**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1080,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02210	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato **2190 €**
E 00FF5-02211	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

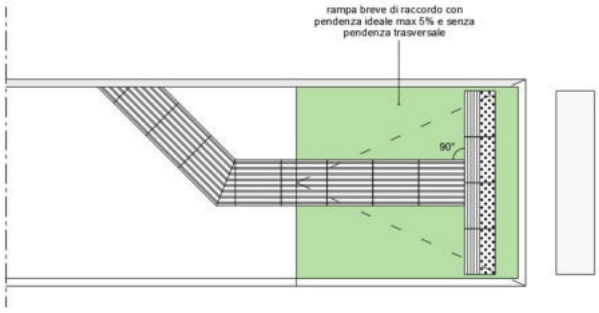

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02210.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02363**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

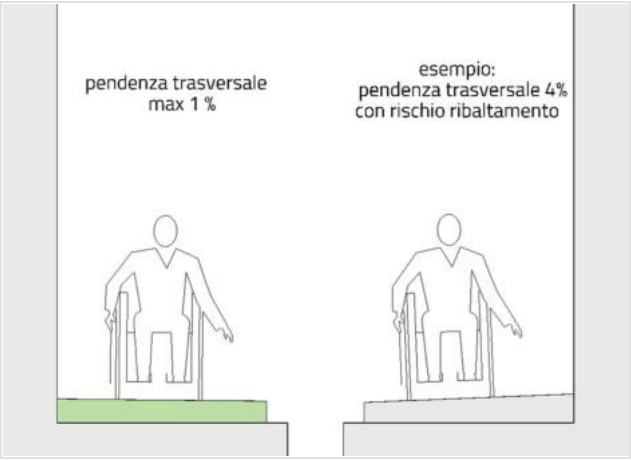

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

539 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 3, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02364

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

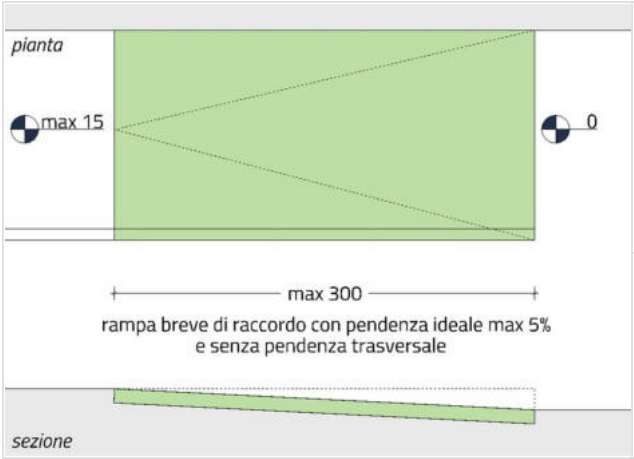

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.407 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02365**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

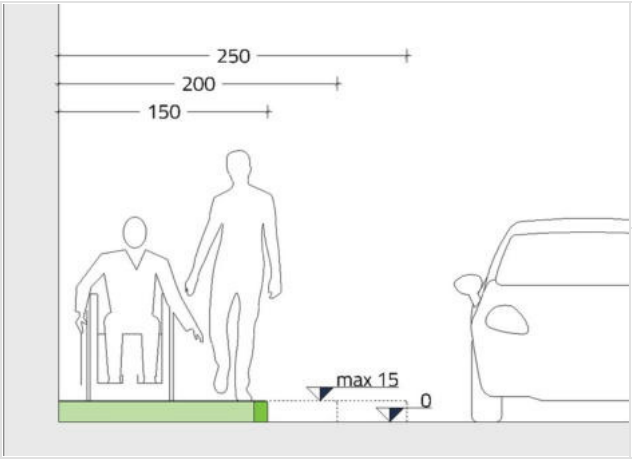

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **20.150 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 3, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02366**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 2900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

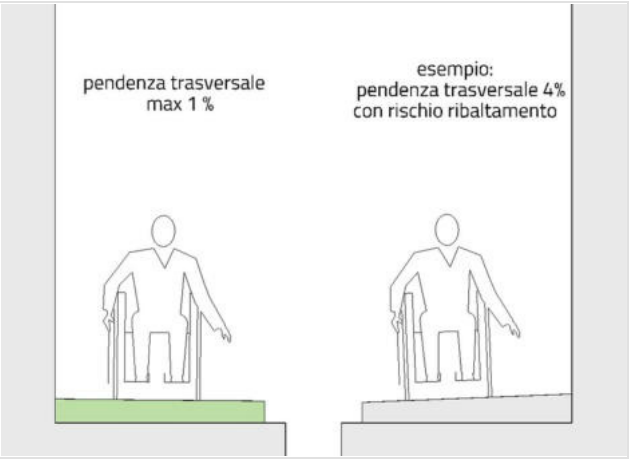

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.060 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02367**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 162,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

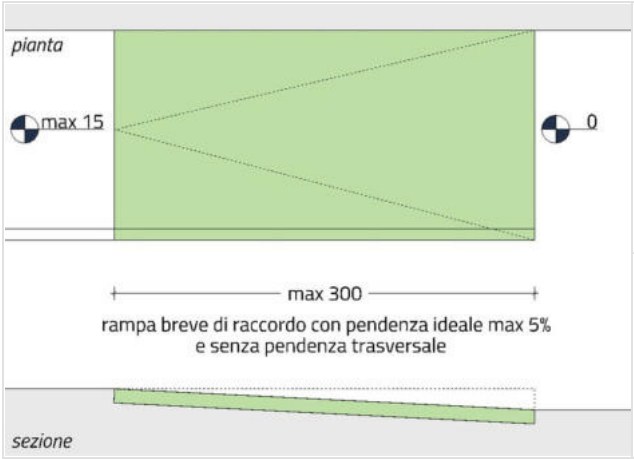

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.253 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Bariglaria 9, Udine	3	E 00FF5-02368

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 47 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 132 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

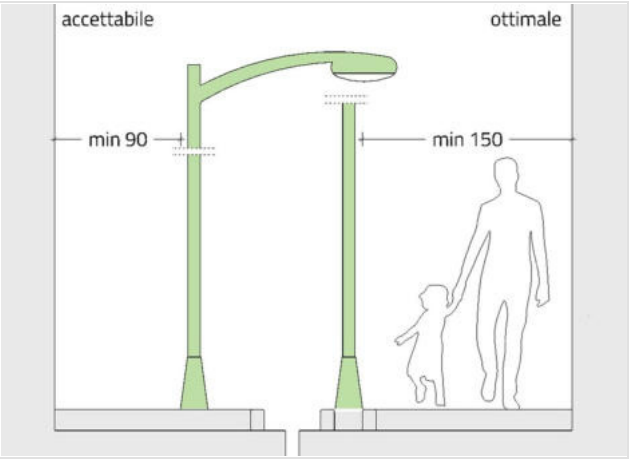

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02369**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02370	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Bariglaria 9, Udine	Costo stimato **5365 €**
E 00FF5-02186	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

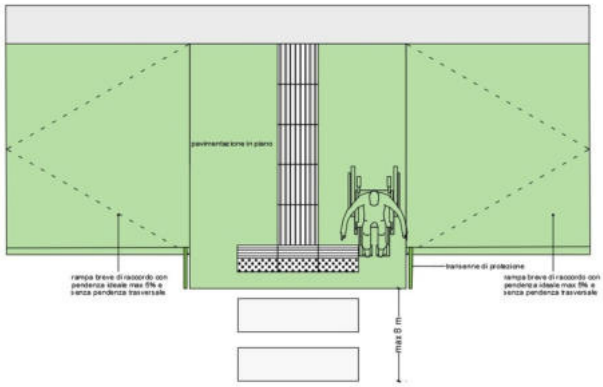

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 9, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02370**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02186	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Bariglaria 24/4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02369	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 9, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

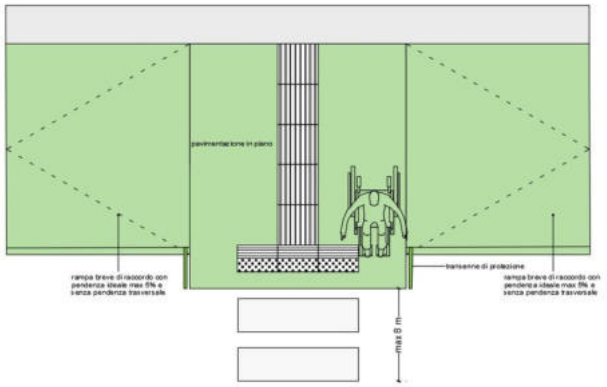

(modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posizionamento di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale **5.365 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Bariglaria 11, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02416

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 33 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 193 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

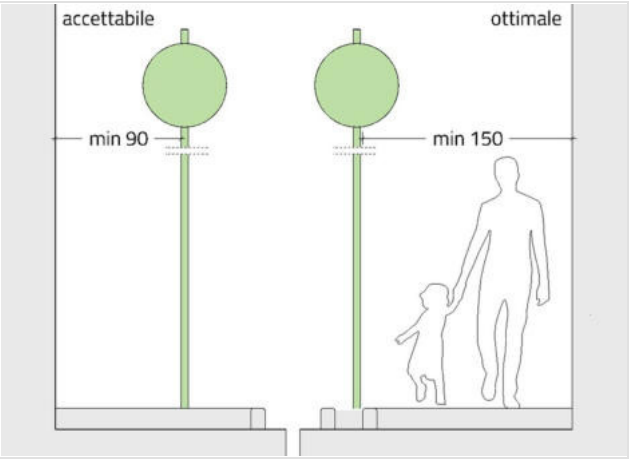

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02417**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

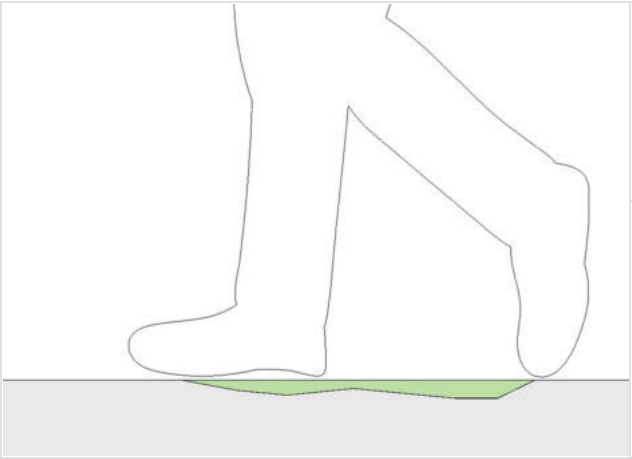

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.548 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02418**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02173)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.125 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Bariglaria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **27 Agosto 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Bariglaria 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03451**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02208	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Bariglaria 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di rampa longitudinale e posa di segnaletica tattilo plantare

Rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di rampa longitudinale e posa di segnaletica tattilo plantare

2.313 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 699, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02214**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 156,00 cm	Y 1480,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

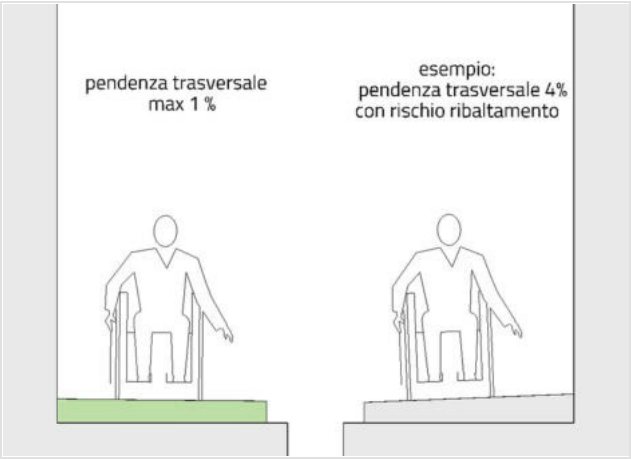

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.704 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 699, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02215**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 1180,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

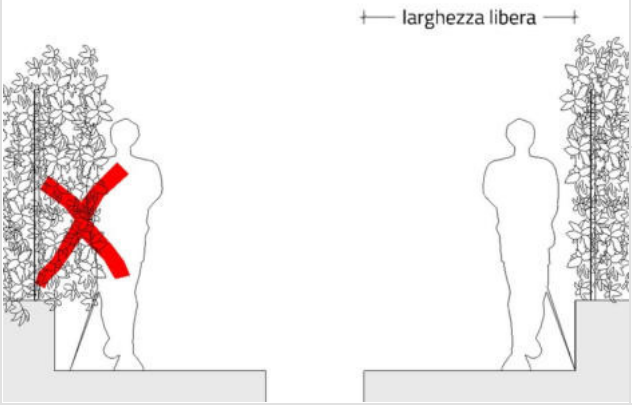

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

194 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 699, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02216**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	68	≥ 90cm
Dimensioni	X 68,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

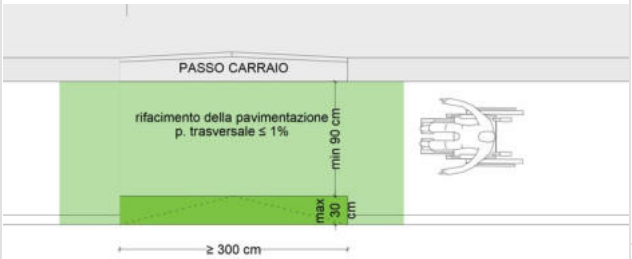

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Restringimento lungo la carreggiata della rampa carrabile esistente in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.914 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 694, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02217**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 3200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

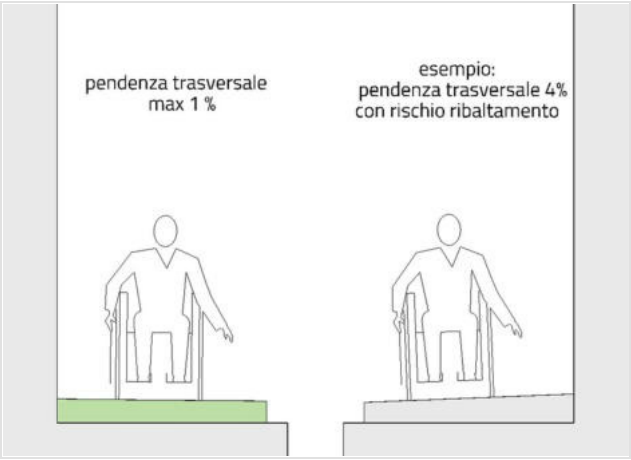

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.151 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 694, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02218**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

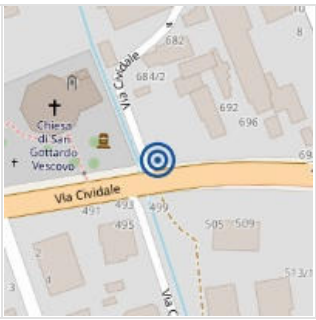

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 169,00 cm	Y 185,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

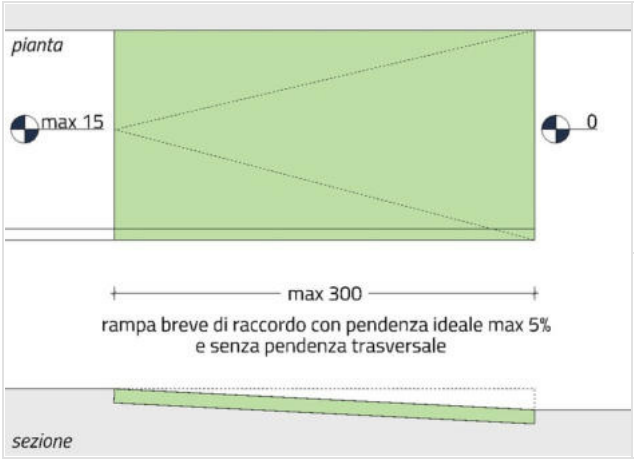

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.230 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 694, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02219**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 255,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

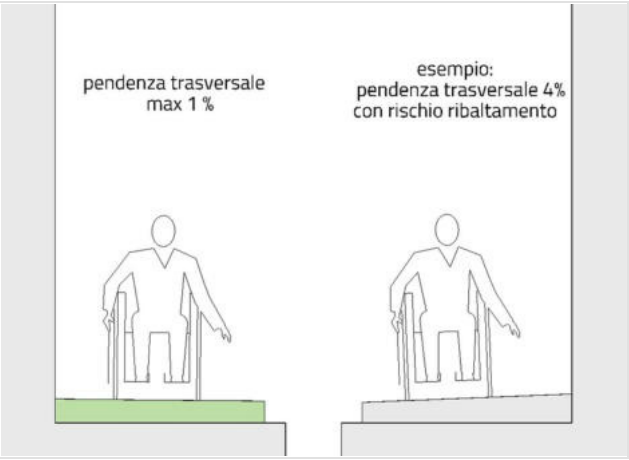

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.417 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 694, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02220**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 153,00 cm	Y 10300,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

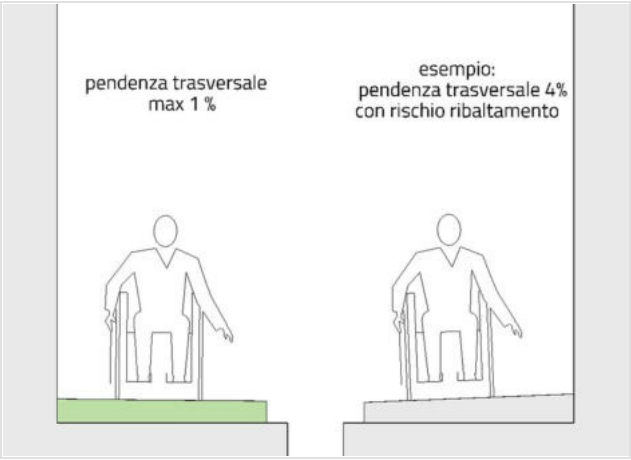

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

19.317 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 652, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02221**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 86 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 126 cm. Larghezza totale del marciapiede di 218 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

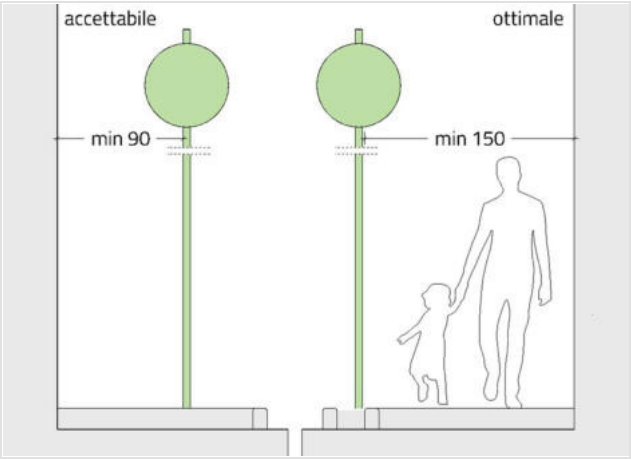

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 652, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02222**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 66,00 cm	Y 66,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

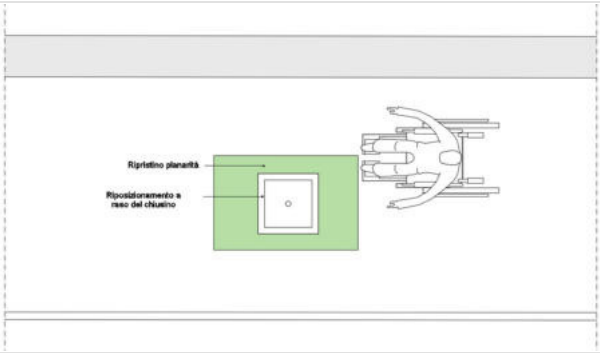

PS1739 (modificato)
Messa in quota del chiusino e riparazione della pavimentazione

Messa in quota del chiusino e rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Messa in quota del chiusino e riparazione della pavimentazione

243 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 652, Udine	1	E 00FF5-02223

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

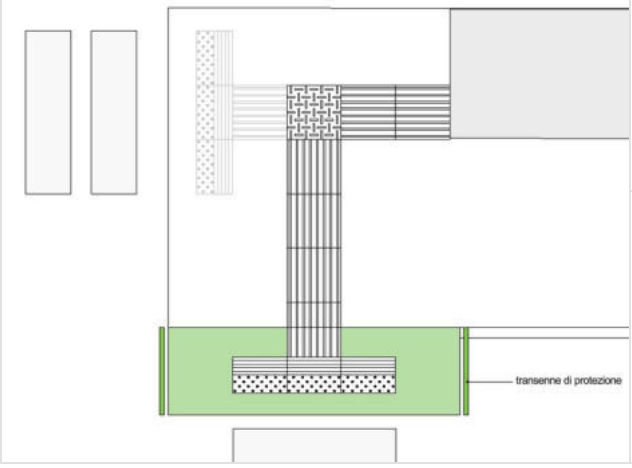

P0769 (modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. (Altra porzione di segnaletica censita con criticità n 00FF5-02224)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale **2.405 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 652, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02224**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 475 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

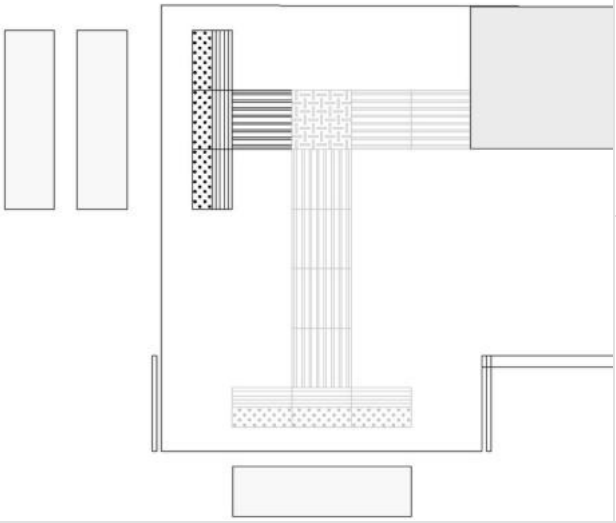

PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Altra porzione di segnaletica censita con criticità n 00FF5-02223)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.235 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 652, Udine	1	E 00FF5-02225

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 815 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di porzione in piano e di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02224)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.410 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 652, Udine	1	E 00FF5-02226

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

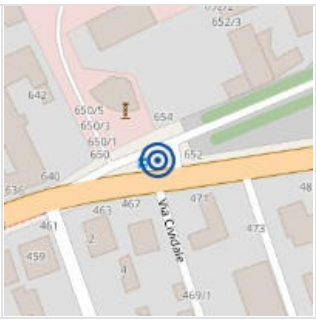

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo segnaletica in mezzo a possibile nuovo attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

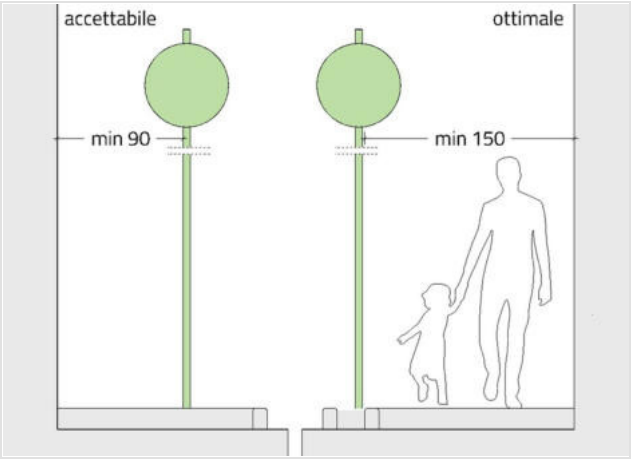

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 652, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02227

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1210,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali inadeguate.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

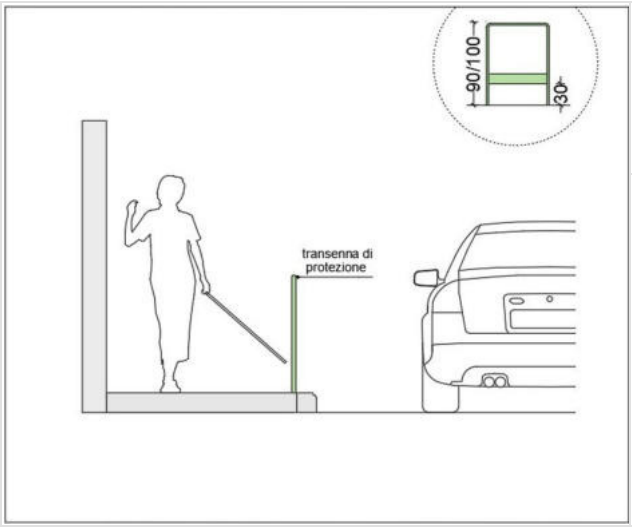

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

5.630 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 652, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02228

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

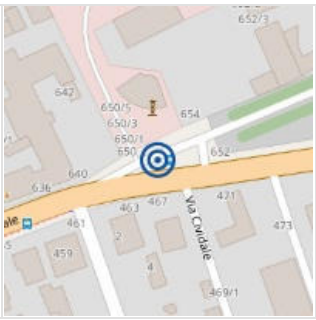

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 162,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Panchina priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

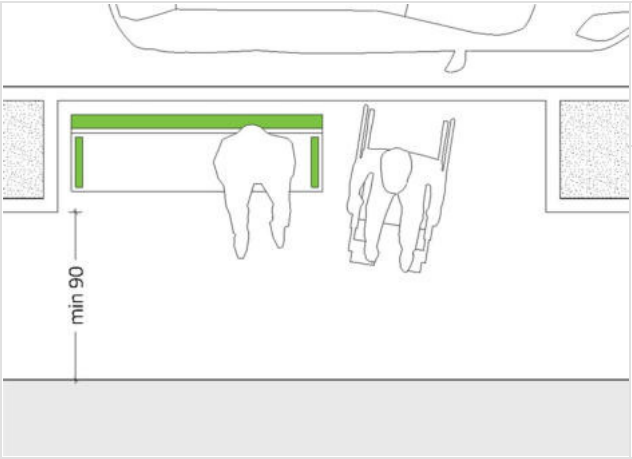

PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL con posa di panchina dotata di schienale e braccioli

582 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 652, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02229**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

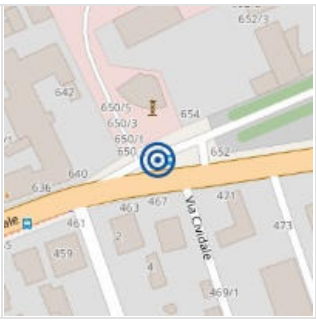

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 90 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 210 cm. Larghezza totale del marciapiede di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02230	**3**	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Cividale 652, Udine	**182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

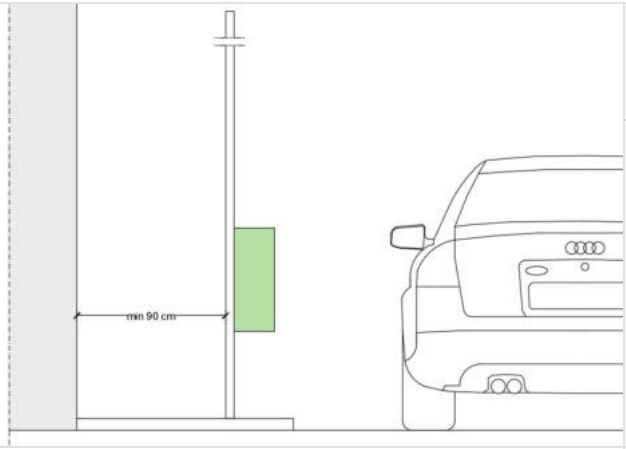

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 000FF5-02230.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 652, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02230**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

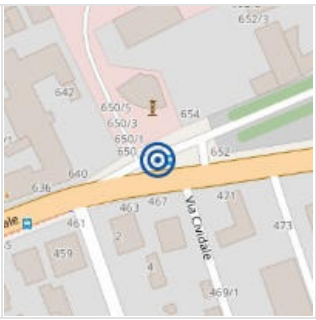

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 40 cm. Altezza del cestino di 53 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02229	3	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Cividale 652, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

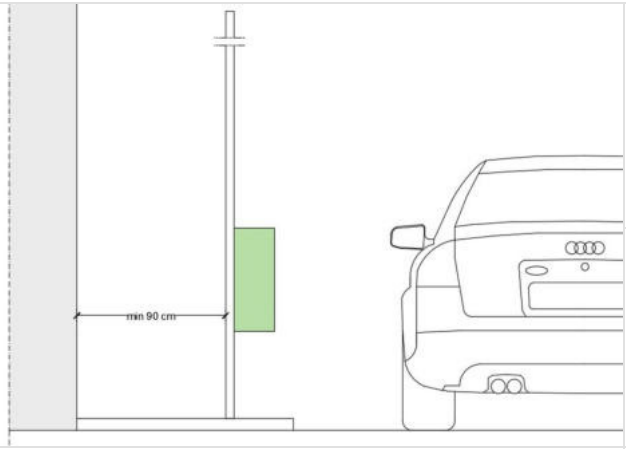

PS1970
Spostamento in area esterna e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 640, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02231**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 340,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02232	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02234	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02235	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 638, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento e incremento del marciapiede nel tratto d'accesso pedonale e realizzazione di breve rampa di raccordo

Rifacimento della pavimentazione. Incremento del tratto di marciapiede frontale all'accesso pedonale per portarlo a livello con i tratti adiacenti. Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza max del 5%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento e incremento del marciapiede nel tratto d'accesso pedonale e realizzazione di breve rampa di raccordo

3.970 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 640, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02232**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 532,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02231	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato **3970 €**
E 00FF5-02235	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 638, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02234	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02231.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 640, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02233**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 74,00 cm	Y 55,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 640, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02234**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 274,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02231	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato **3970 €**
E 00FF5-02235	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 638, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02232	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02231.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 638, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02235**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 230,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02231	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato **3970 €**
E 00FF5-02234	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02232	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 640, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1931 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02231.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 638, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02236**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

363 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 638-630, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02237**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 218,00 cm	Y 3050,00 cm
Materiale	Calcestruzzo e Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

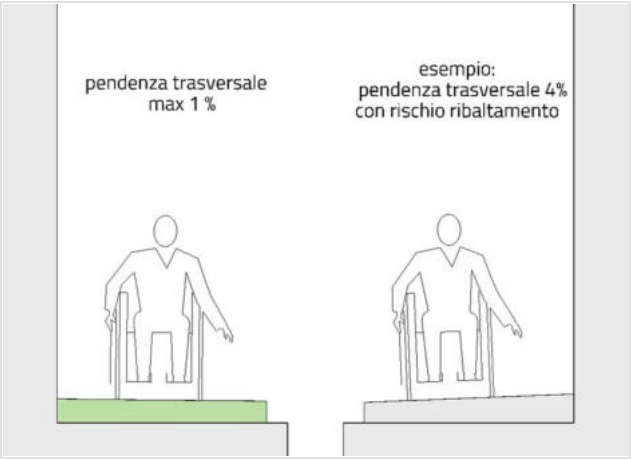

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.011 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 630, Udine	1	E 00FF5-02238

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 227,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

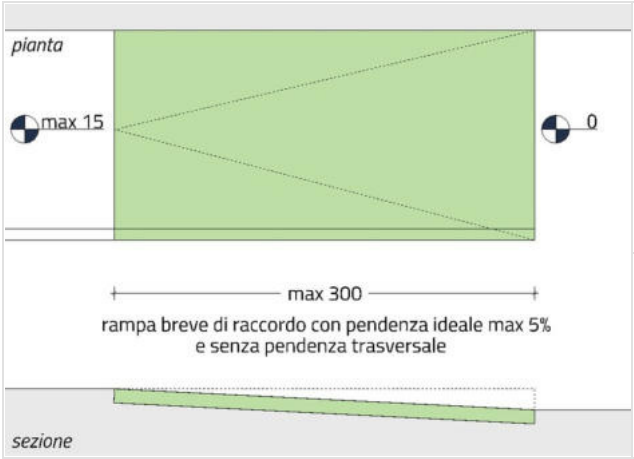

PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.742 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 630, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02239**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

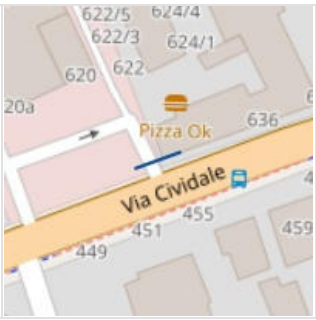

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 217,00 cm	Y 1170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

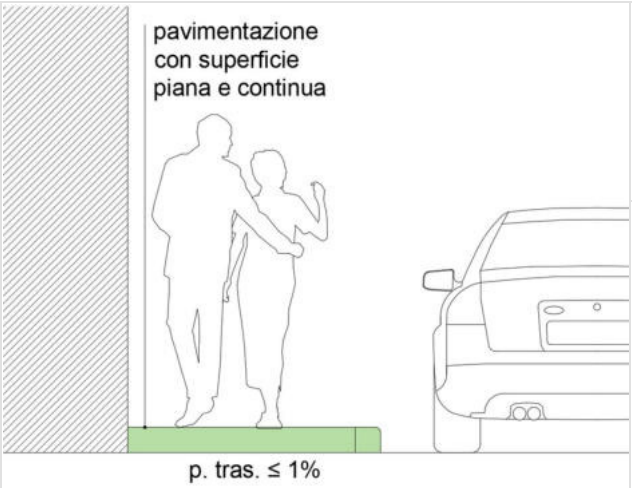

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **4.777 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 628, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02240**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4030,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

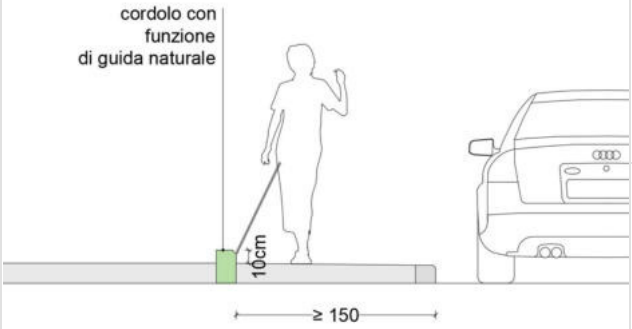

PS1792 (modificato)
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini, almeno nel tratto di percorso antistante i parcheggi del supermercato. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare. Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di cordolo **6.906 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 628, Udine	2	E 00FF5-02241

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 605,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

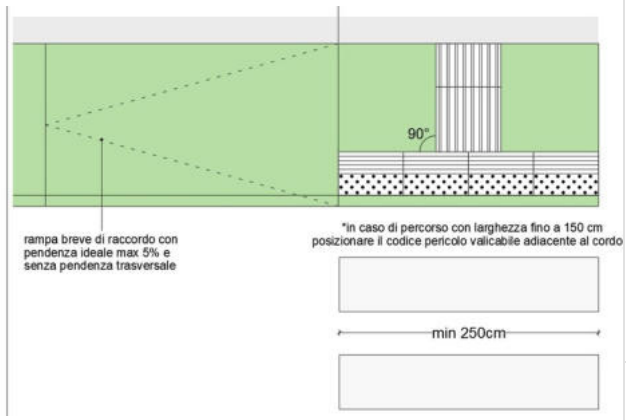

(modificato)
Rifacimento pavimentazione, riposizionamento segnaletica tattilo-plantare, rifacimento rampa longitudinale

Rifacimento della pavimentazione in piano priva di pendenza trasversale (max 1%). Riposizionamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.909 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 628, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02242**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 930,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

2.256 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 628, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02243**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 930,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 620, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02244**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 328,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1786 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (ingresso parcheggio supermercato) mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

7.947 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 620, Udine	2	E 00FF5-02245

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

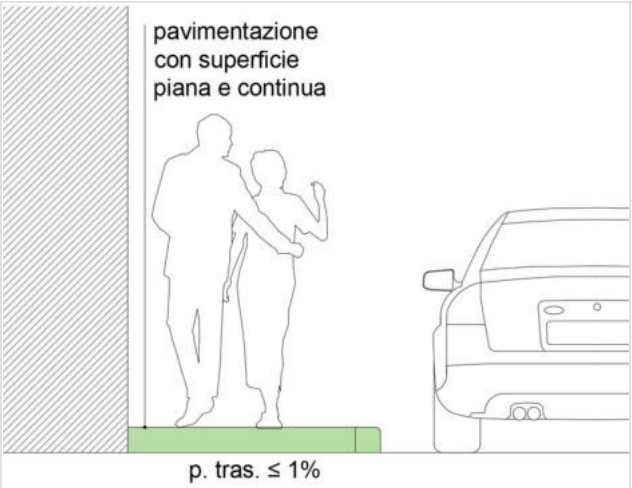

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.237 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 604, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02248**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Rastrelliera porta bicicletta a muro. Sporge di 30 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0633 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per valutare l'eliminazione dell'elemento di proprietà privata che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti. Si suggerisce di concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo Via Cividale 604-596, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-02249

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 6400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02252	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 604-596, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

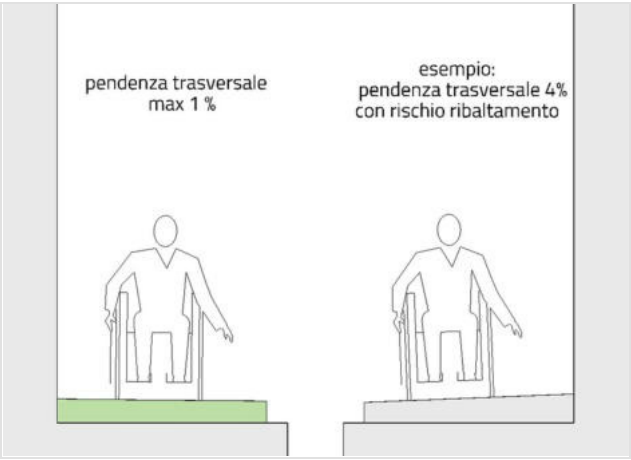

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

21.827 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 594, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02250**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

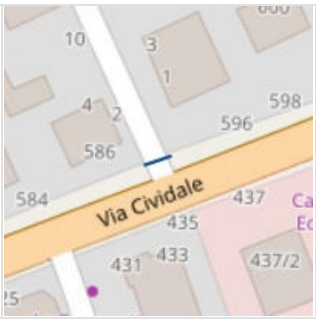

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 620 cm. Larghezza del marciapiede di 210 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02251)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **2.905 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 594, Udine	1	E 00FF5-02251

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 620 cm. Larghezza del marciapiede di 186 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02250)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **2.942 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **16 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 604-596, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-02252

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 6400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02249	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 604-596, Udine	Costo stimato **21827 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

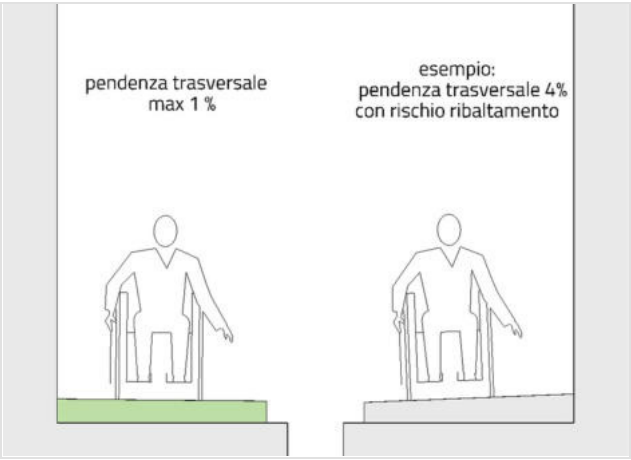

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02249.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 586-582, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02253**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 335,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

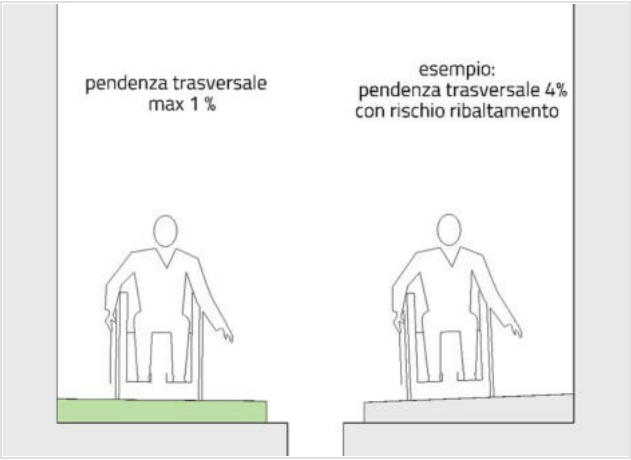

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

15.219 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 586-582, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02254**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

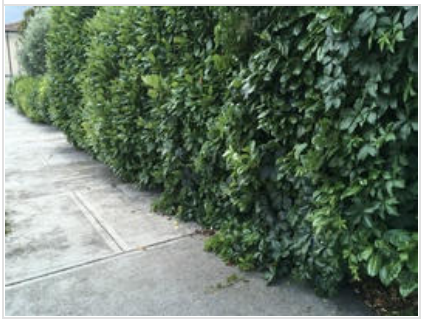

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

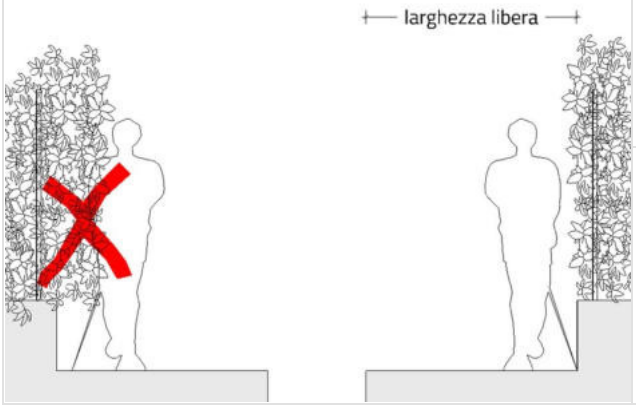

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

724 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 582, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02255**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 605,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 605 cm. Larghezza del marciapiede di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02256)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.080 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **16 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 582, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02256**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

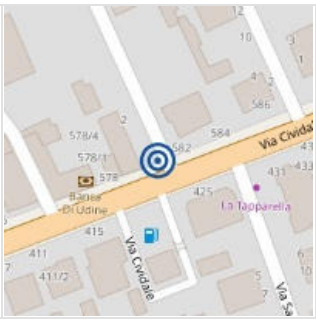

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 605,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 605 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 3 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02255)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di rampa longitudinale, posa di segnaletica tattilo-plantare

2.836 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 582, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02257**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 277,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

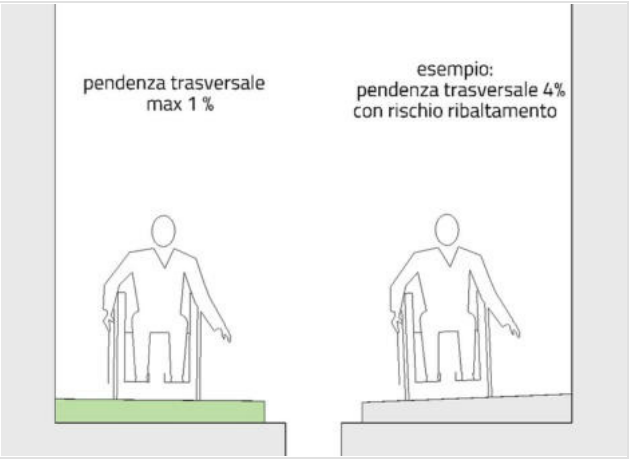

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.034 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 582, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02258**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

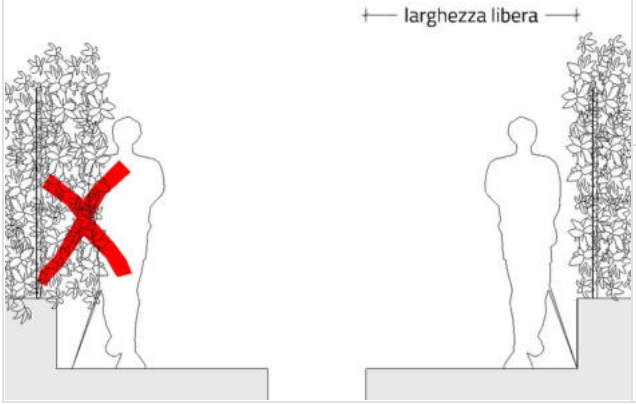

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

99 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 582, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02259**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 12 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 330 cm. Larghezza totale del marciapiede di 347 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

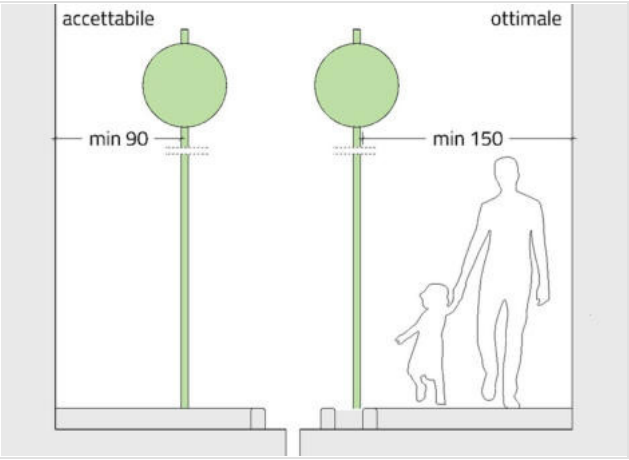

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 576, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02260**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

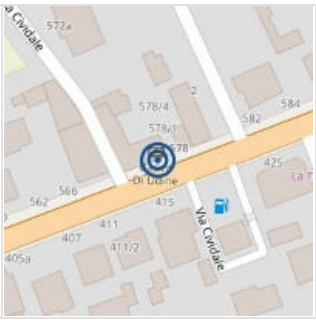

Pendenza longitudinale	17	≤ 15%
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02261	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02262	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato **4334 €**
E 00FF5-02263	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 578, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

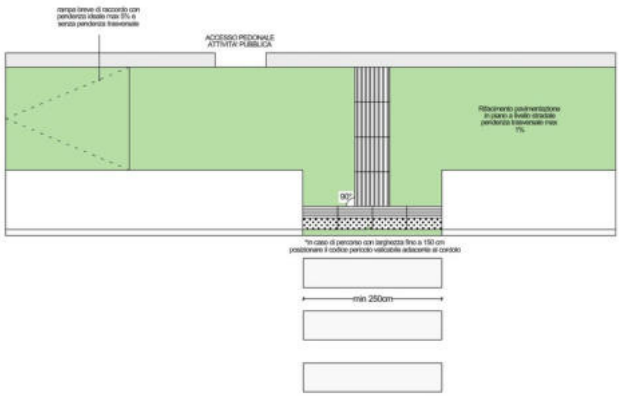

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02262.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 576, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02261**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

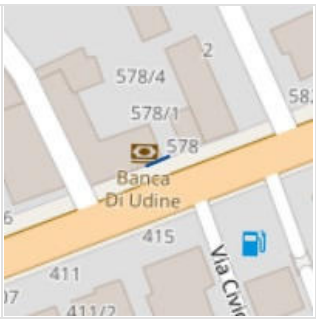

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 107,00 cm	Y 337,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02260	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02262	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato **4334 €**
E 00FF5-02263	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 578, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

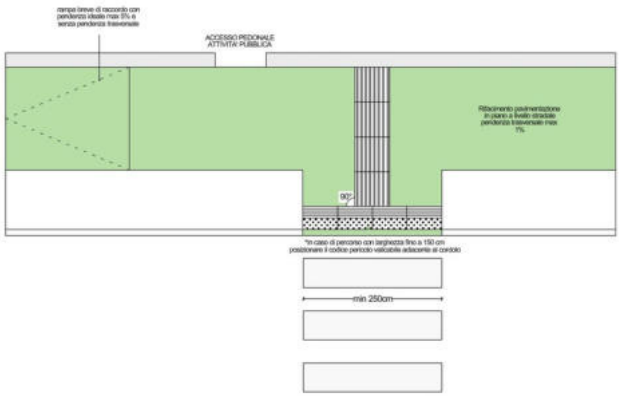

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02262.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 576, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02262**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

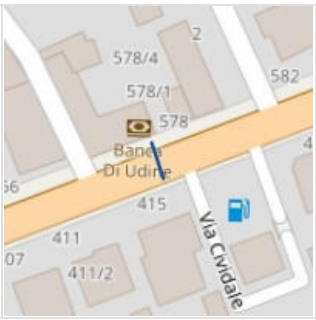

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 760 cm. Larghezza del marciapiede di 107 cm. Larghezza dell'area adibita a parcheggio di 310 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02260	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02261	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02263	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 578, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

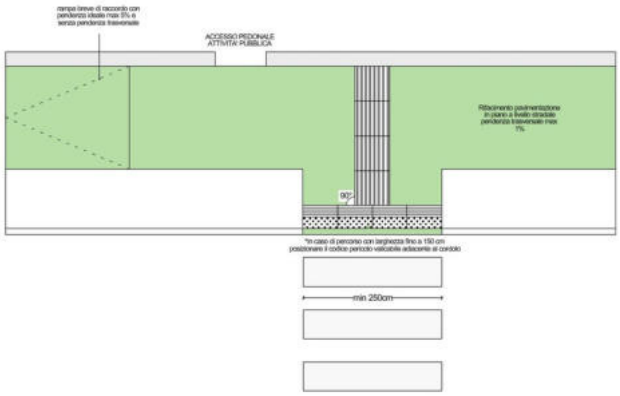

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Eliminazione della porzione di marciapiede rialzato e rifacimento a livello stradale della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02266)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.334 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 578, Udine	1	E 00FF5-02263

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 104,00 cm	Y 67,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02262	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato **4334 €**
E 00FF5-02261	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02260	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 576, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

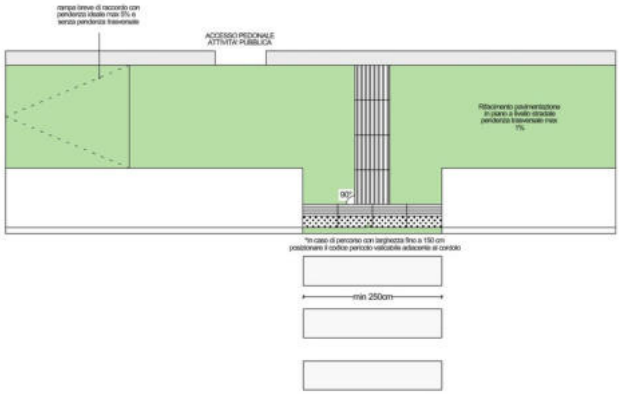

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02262.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 572, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02264**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 572, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02265**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 105,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

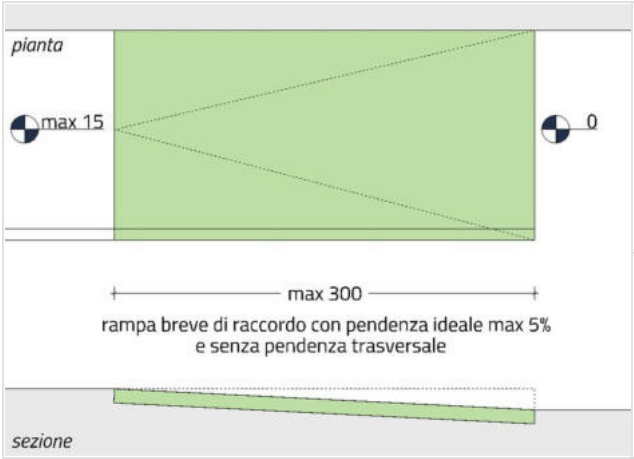

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.195 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 415, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02266**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 760 cm. Larghezza del marciapiede di 310 cm. Larghezza dell'area tra marciapiede e bordo strada 143 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02267	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

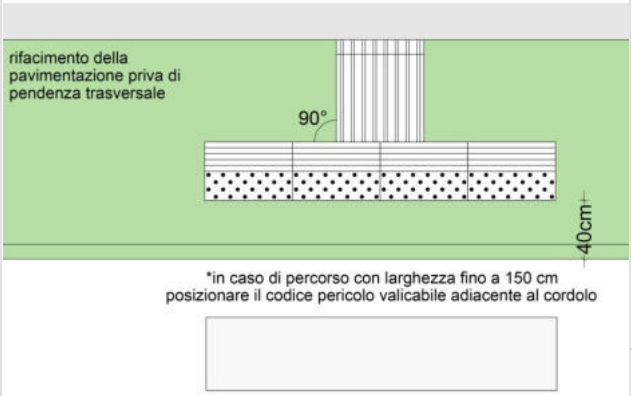

(modificato)
Eliminazione della porzione di marciapiede rialzato e rifacimento a livello stradale della pavimentazione, posa di segnaletica tattilo-plantare

Eliminazione della porzione di marciapiede rialzato e rifacimento a livello stradale della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento di rampa longitudinale con pendenza max del 5%. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02262)

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della porzione di marciapiede rialzato e rifacimento a livello stradale della pavimentazione, posa di segnaletica tattilo-plantare

4.701 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 415, Udine	1	E 00FF5-02267

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 152,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02266	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Cividale 415, Udine	4701 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

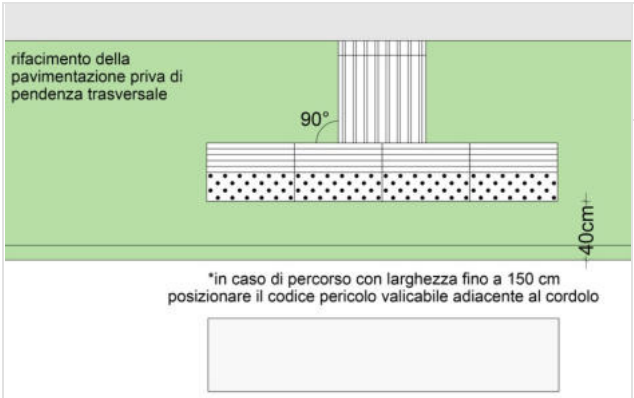

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02266.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 415, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02268**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm. La rampa è seguita da una porzione in piano di lunghezza 293 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02270	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02271	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1735 (modificato)
Demolizione del marciapiede e sua ricostruzione in piano a livello stradale

Rifacimento della pavimentazione antistante l'area di servizio tramite demolizione della parte di marciapiede in risalto e sua ricostruzione a raso a livello della pavimentazione adiacenti privo di pendenza trasversale. Posa di fioriere o arredo urbano che costituiscano guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e sua ricostruzione in piano a livello stradale

5.124 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 415, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02269

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 153,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm. La rampa è preceduta da una porzione in piano di lunghezza 293 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02268	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato **5124 €**
E 00FF5-02271	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02270	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1735 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02268.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 419, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02270**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

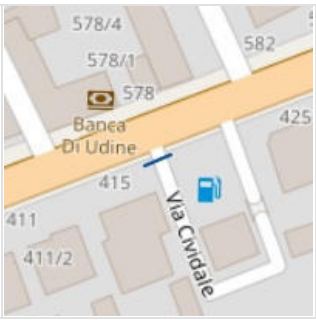

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02268	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato **5124 €**
E 00FF5-02271	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02268.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 419, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02271**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02268	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato **5124 €**
E 00FF5-02270	LIV. 1	**Assenza Arredo urbano** Via Cividale 419, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02269	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 415, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02268.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 415, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02272**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

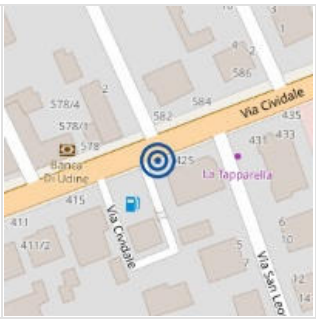

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 286,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

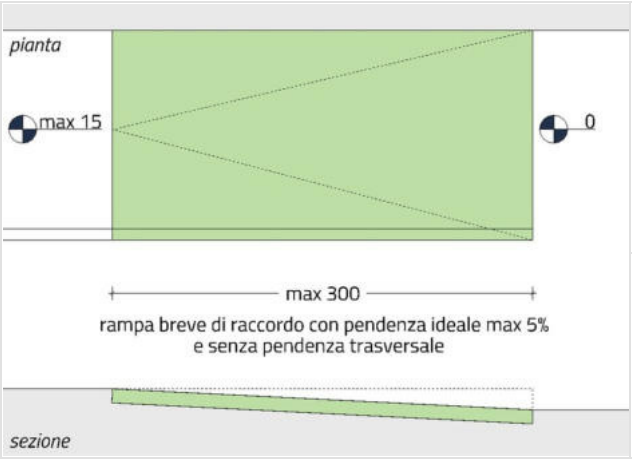

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.620 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo Via Cividale 419-515, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-02273

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 286,00 cm	Y 51000,00 cm
Materiale	Porfido e Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

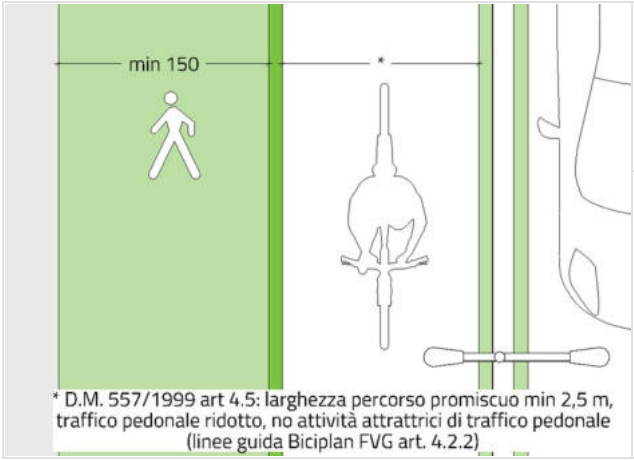

P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

473 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02274**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di direzione rettilinea non conduce a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1896 (modificato)
Integrazione della segnaletica tattilo-plantare

Integrazione di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Integrazione della segnaletica tattilo-plantare **2.473 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02275**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

39 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02276**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di direzione rettilinea non conduce a guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02280	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 425, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1896 (modificato)
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva, sua ricostruzione e integrazione della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Integrazione di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva, sua ricostruzione e integrazione della segnaletica tattilo-plantare

2.473 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02277**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 20,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

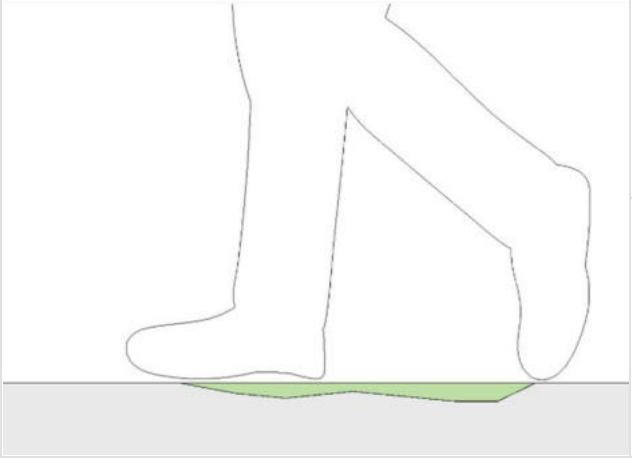

PS1693 (modificato)
Eliminazione dell'incasso

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'incasso

112 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02278**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 23 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 240 cm. Larghezza totale del marciapiede di 260 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

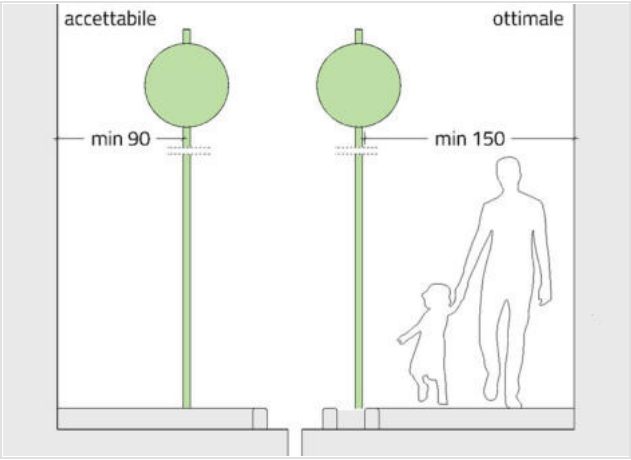

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 425, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02279**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 23 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 240 cm. Larghezza totale del marciapiede di 260 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

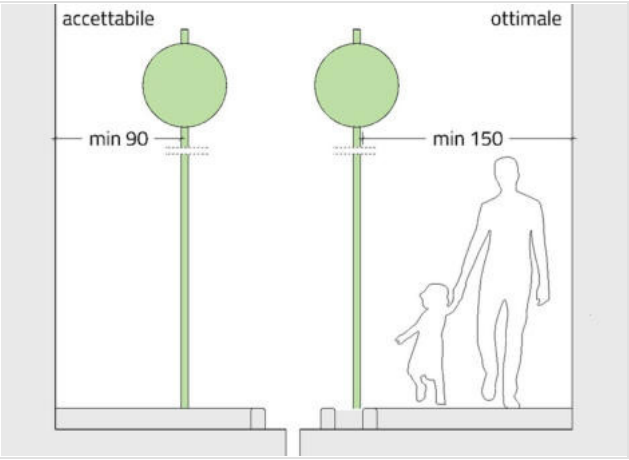

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 425, Udine	1	E 00FF5-02280

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02276	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Cividale 425, Udine	2473 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02276.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 435, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02281**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

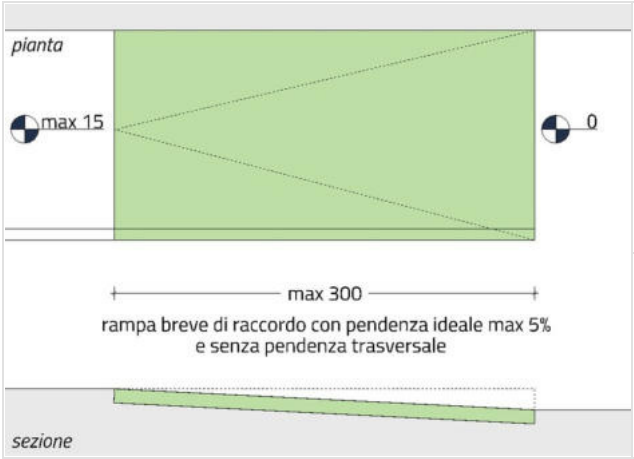

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.650 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 435, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02282**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

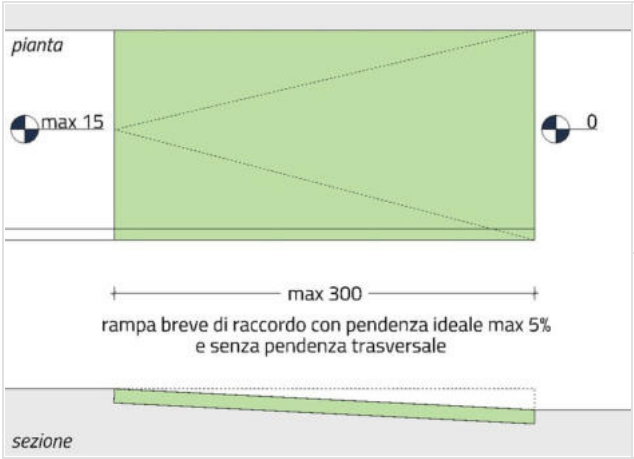

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.660 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 441, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02283**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1823 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio del parcheggio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio del parcheggio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

8.268 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 441, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02284**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1050,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

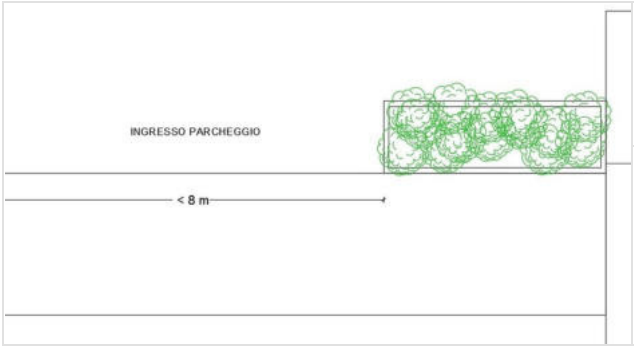

PS1930 (modificato)
Prolungamento della guida naturale esistente

Prolungamento della guida naturale esistente per ridurre la lunghezza del percorso privo di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento delle aiuole esistenti **825 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 443, Udine	2	E 00FF5-02285

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

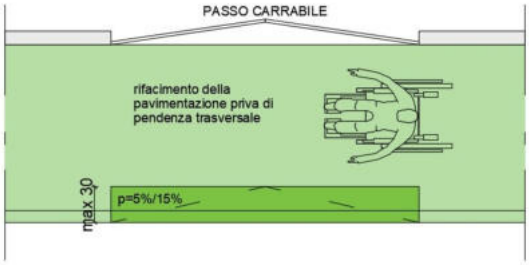

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.611 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 443, Udine	2	E 00FF5-02286

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02287	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 443, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento della pavimentazione in piano, breve rampa longitudinale, riposizionamento di moduli tattilo-plantari

Rifacimento della pavimentazione con area in piano priva di pendenza trasversale e breve rampa longitudinale con pendenza max del 5%. Riposizionamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione in piano, breve rampa longitudinale, riposizionamento di moduli tattilo-plantari

3.290 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 443, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02287**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02286	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 443, Udine	Costo stimato **3290 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02286.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 443, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02288**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

610 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 449, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02289**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

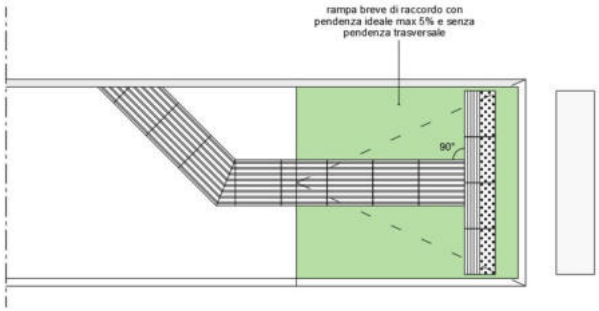

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, riposizionamento di moduli tattilo-plantari

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Riposizionamento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, riposizionamento di moduli tattilo-plantari	**3.201 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 449, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02290**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza trasversale	2	0%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

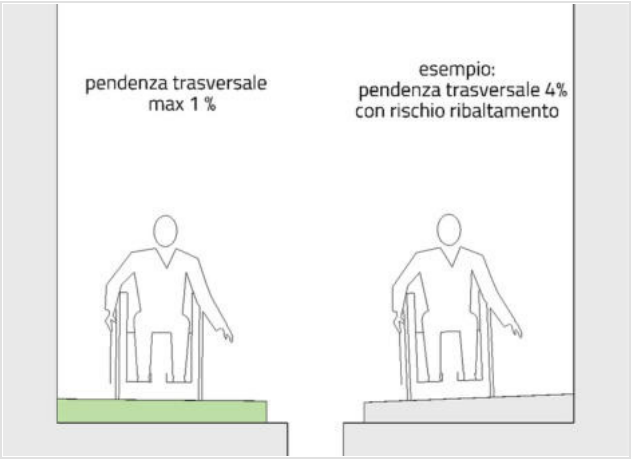

P0692 (modificato)
Demolizione e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.738 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 453, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02291**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

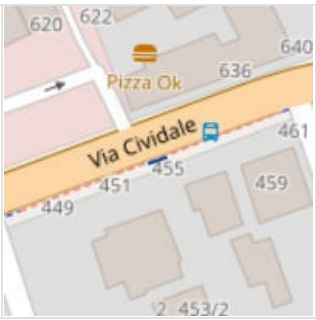

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02292	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 455, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
ifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

8.025 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 455, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02292**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

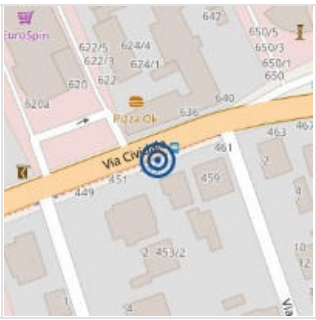

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02291	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 453, Udine	**8025 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02291.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 455, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02293**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

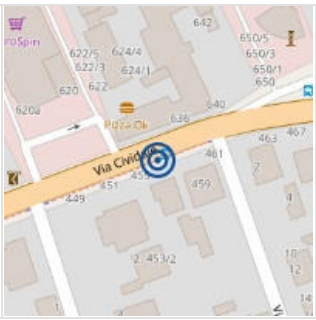

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

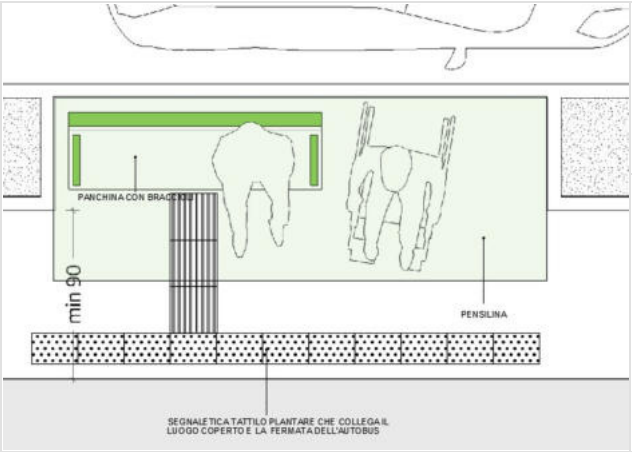

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 457, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02294**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

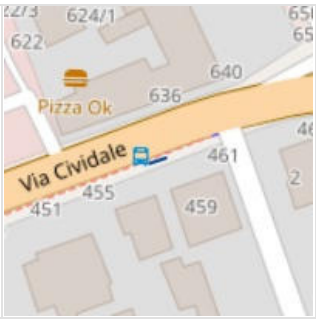

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

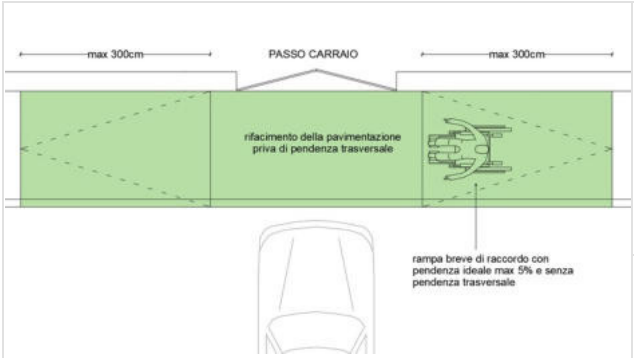

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.728 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 461, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02295**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02296	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 461, Udine	Costo stimato **582 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02296.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 461, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02296**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02295	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 461, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

582 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 463, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02297**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 315,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

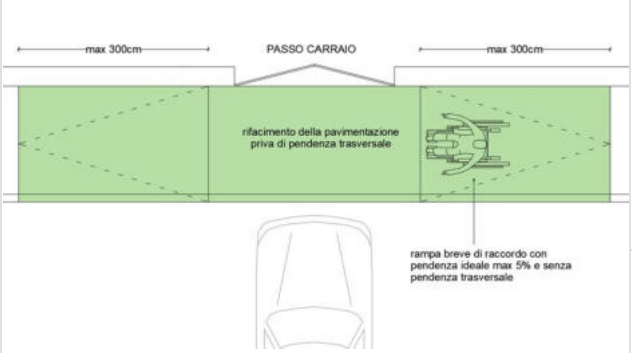

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.401 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 467, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02298**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

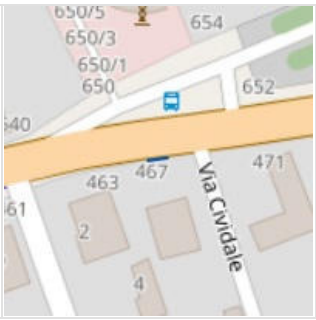

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

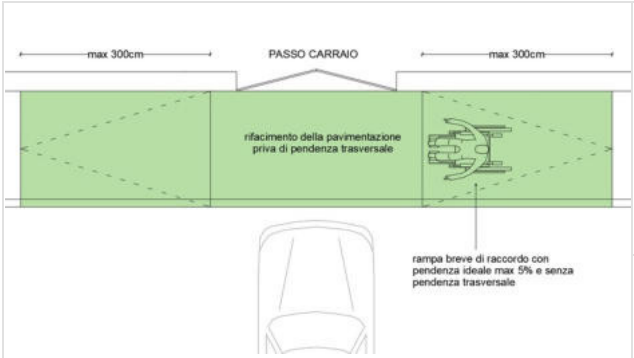

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.929 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 469, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02299**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

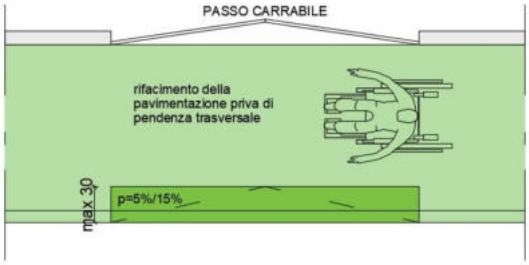

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.749 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 471, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02300**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

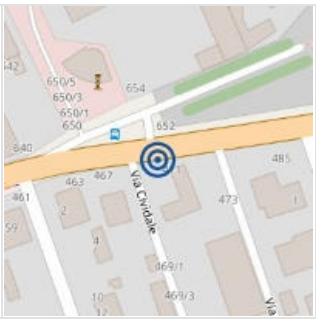

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 27 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 220 cm. Larghezza totale del marciapiede di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

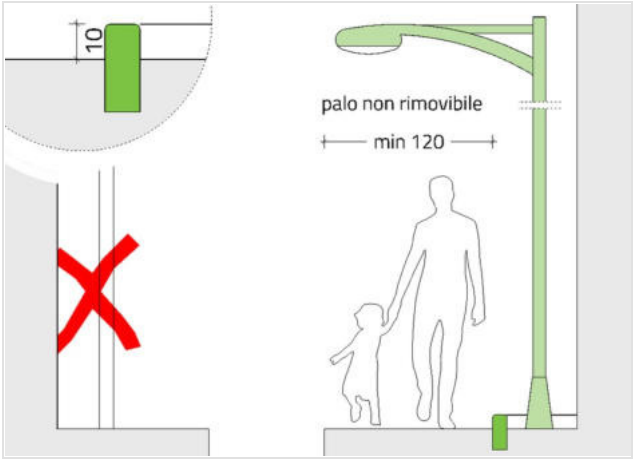

PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **19 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 471, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02301**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

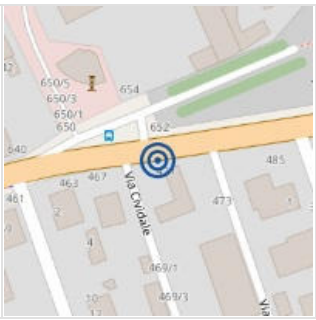

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

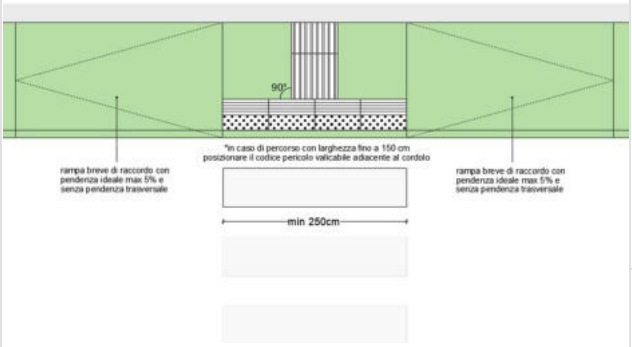

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.752 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 471, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02302**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

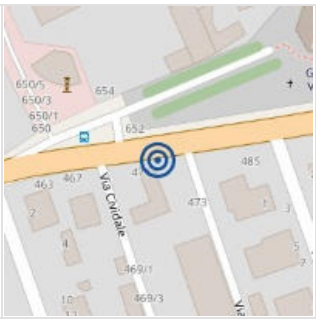

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza del basamento di 6 cm. Diametro di 22 cm. Distanza dal cordolo di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

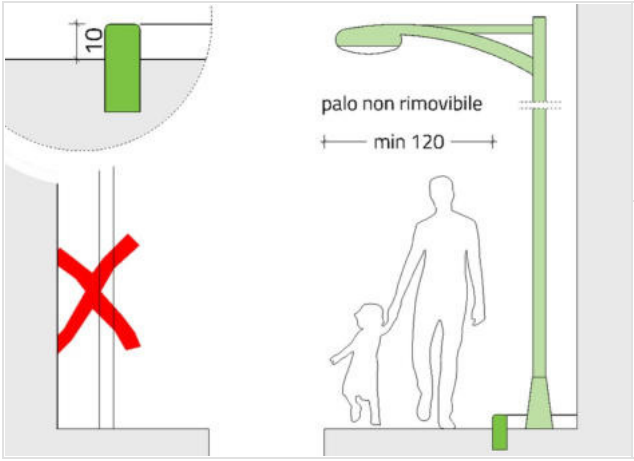

PS1787
Presegnalazione del palo (prolungamento del collare)

Realizzazione di prolungamento del collare alla base del palo per aumentarne la percezione e colmare il vuoto verso la guida naturale. Collare tinteggiato a contrasto cromatico con altezza 15 cm, larghezza libera di passaggio minima 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con prolungamento del collare del palo luce **19 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 471, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02303**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

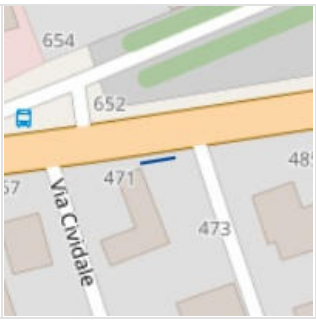

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 750,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

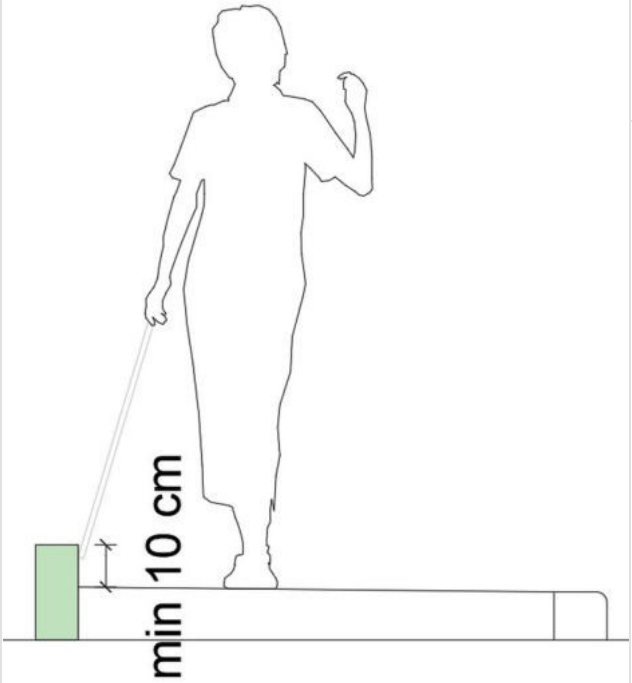

PS1804 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del cordolo

321 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 471, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02304**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1020,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

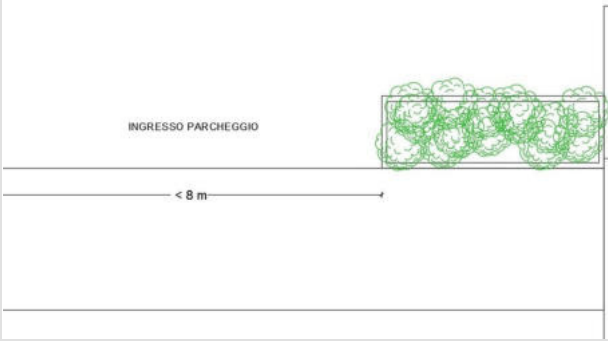

PS1930 (modificato)
Prolungamento della guida naturale esistente

Prolungamento della guida naturale esistente per ridurre la lunghezza del percorso privo di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento delle aiuole esistenti **766 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 485, Udine**	3	E **00FF5-02305**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

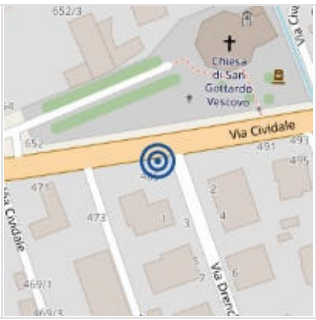

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 17 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 220 cm. Larghezza totale del marciapiede di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

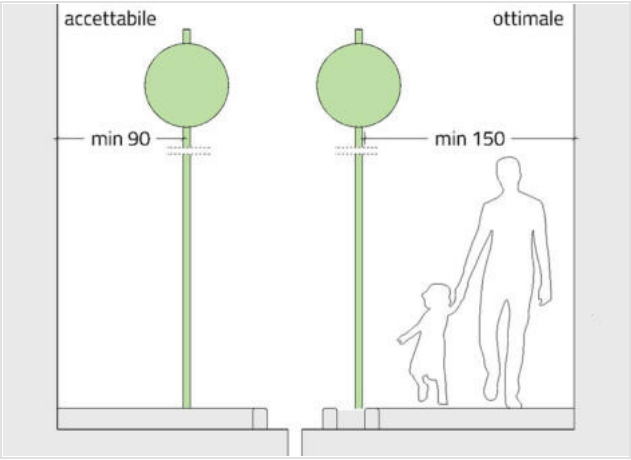

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 485, Udine	1	E 00FF5-02306

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

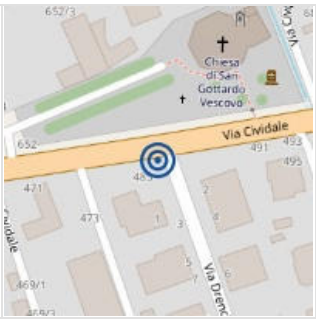

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 315,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è parallelo alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1896 (modificato)
Integrazione della segnaletica tattilo-plantare

Integrazione di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Integrazione della segnaletica tattilo-plantare **1.061 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 485, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02307**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**

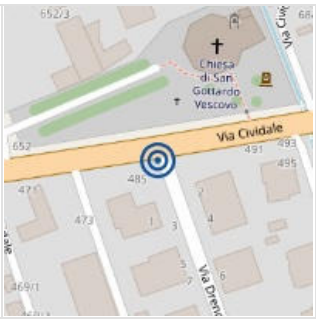

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

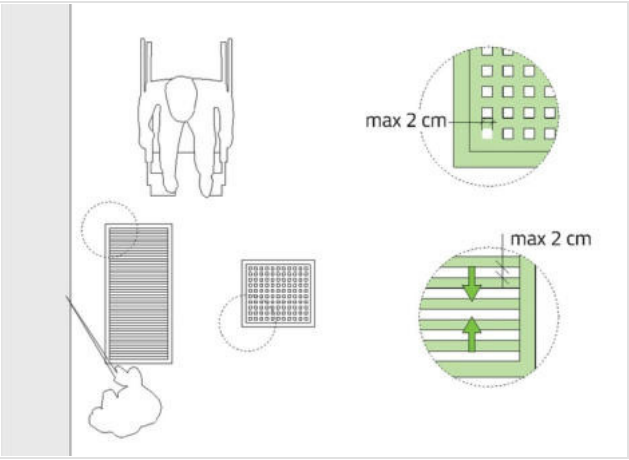

PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 485, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02308**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

43 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 485, Udine	1	E 00FF5-02309

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è parallelo alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1896 (modificato)
Integrazione e riparazione della segnaletica tattilo-plantare

Integrazione e riparazione di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Integrazione e riparazione della segnaletica tattilo-plantare

1.061 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 485, Udine	3	E 00FF5-02310

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

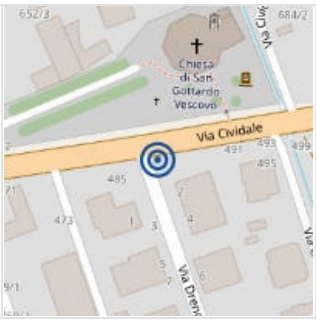

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 75 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 265 cm. Larghezza totale del marciapiede di 340 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

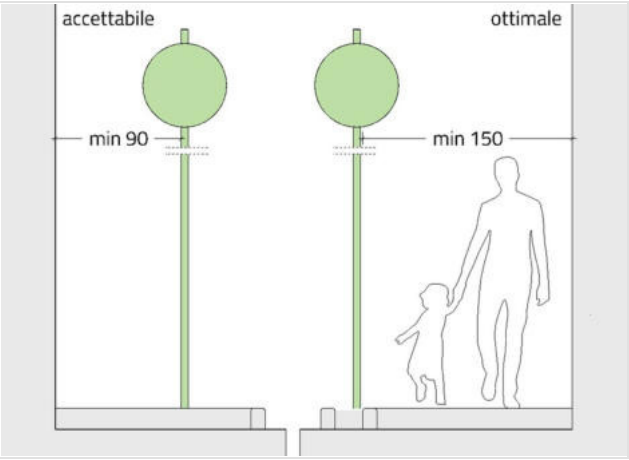

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 491, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02311**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

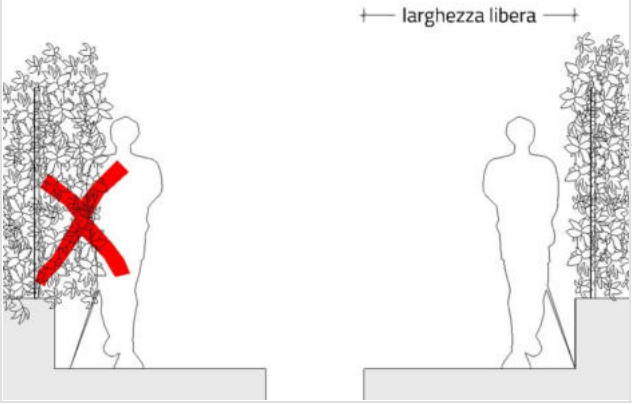

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

197 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 495, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02312**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

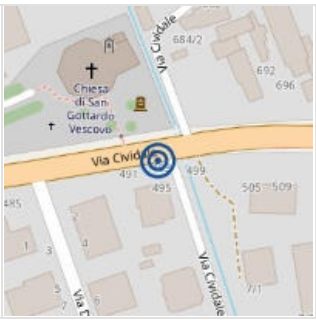

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02313	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato **1900 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

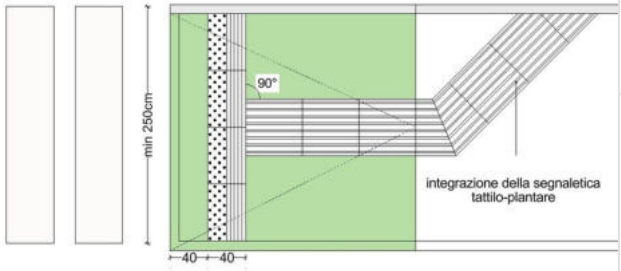

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02313.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 495, Udine	1	E 00FF5-02313

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

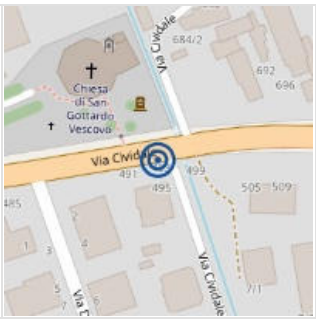

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è parallelo alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02312	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 495, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

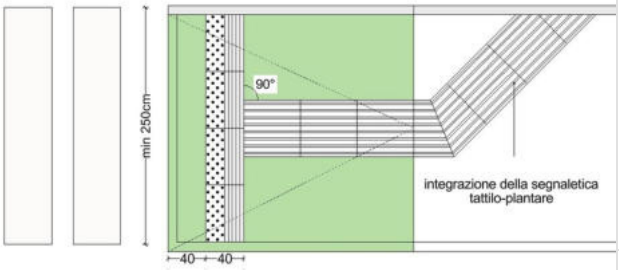

PS1896 (modificato)
Rifacimento della rampa di raccordo rifacimento della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Rifacimento di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della rampa di raccordo rifacimento della segnaletica tattilo-plantare

1.900 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 495, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02314**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

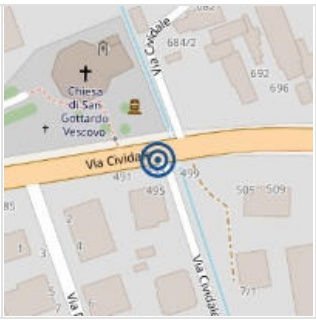

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

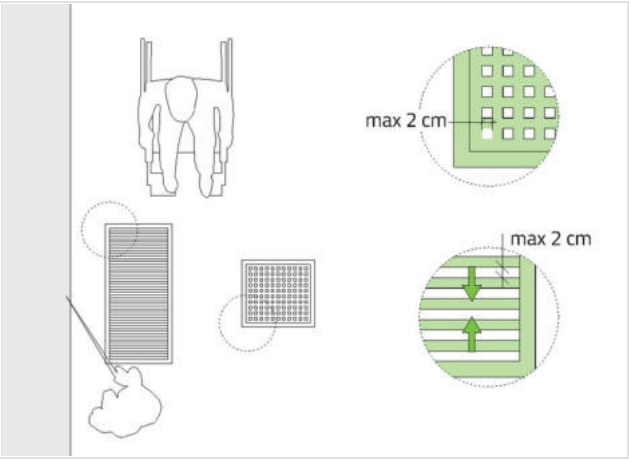

PS1922
Sostituzione della caditoia

Sostituzione della caditoia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 495, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02315**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

53 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 495, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02316**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

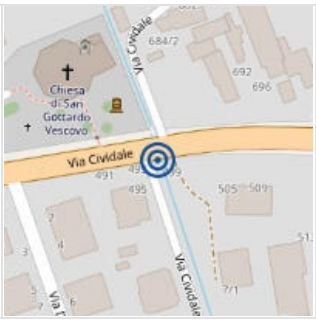

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 210,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02317	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02318	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02319	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento di pavimentazione priva di pendenza trasversale e rifacimento di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" in posizione ortogonale all'attraversamento e realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di pavimentazione priva di pendenza trasversale e rifacimento di segnaletica tattilo plantare
6.427 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 495, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02317

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

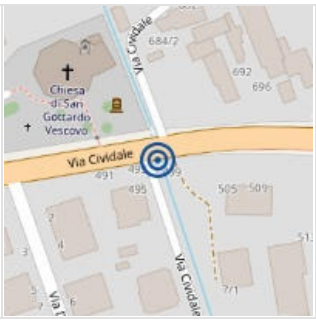

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è parallelo alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02316	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato **6427 €**
E 00FF5-02319	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02318	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02316.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 499, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02318**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02316	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato **6427 €**
E 00FF5-02319	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02317	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02316.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 499, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02319**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02316	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato **6427 €**
E 00FF5-02318	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 499, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02317	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 495, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02316.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 509, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02320**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

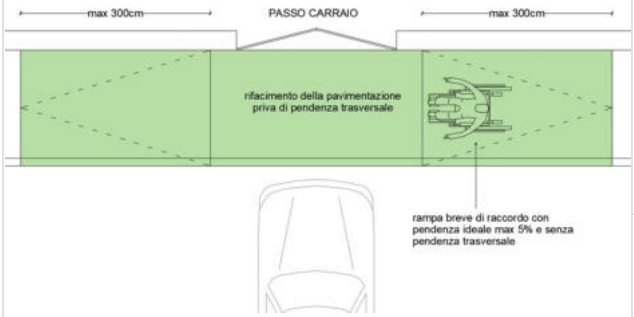

PS1843
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

6.233 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 513, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02321**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02322	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato **5786 €**
E 00FF5-02323	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

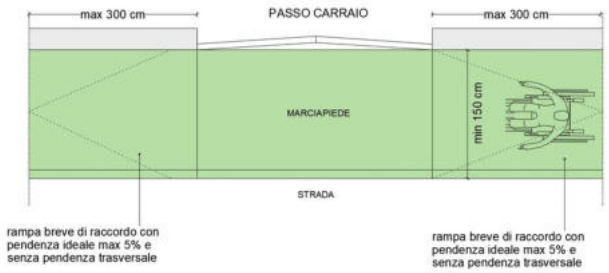

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 0FF5-02322.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 513, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02322**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02321	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02323	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

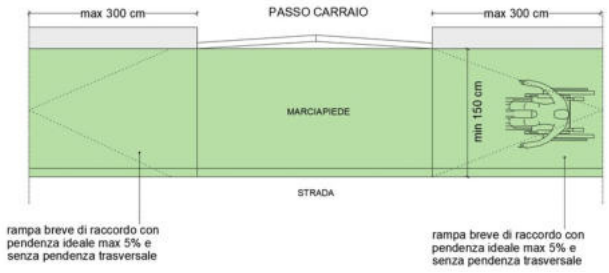

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.786 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 513, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02323**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02322	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato **5786 €**
E 00FF5-02321	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 513, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

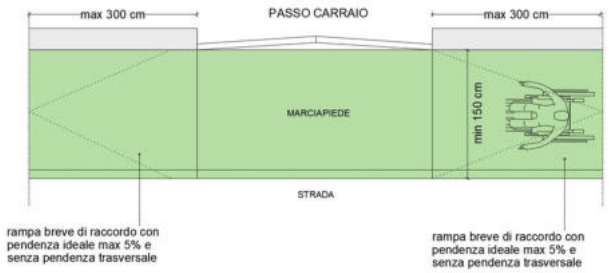

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 0FF5-02322.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 515, Udine	1	E 00FF5-02324

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il punto di sbarco dell'attraversamento ha una lunghezza di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02325	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	--
E 00FF5-02326	1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	--
E 00FF5-02327	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 515, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con lo spostamento dell'attraversamento in posizione frontale rispetto al lato opposto della sede stradale, realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Il nuovo posizionamento dell'attraversamento riduce la lunghezza dello stesso. Conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

8.003 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 515, Udine	1	E 00FF5-02325

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02324	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato **8003 €**
E 00FF5-02327	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02326	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02324.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 515, Udine	1	E 00FF5-02326

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02324	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato 8003 €
E 00FF5-02327	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02325	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02324.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 515, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02327**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02324	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato **8003 €**
E 00FF5-02326	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02325	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Cividale 515, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02324.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 515, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02328**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **IMPIANTO SEMAFORICO**

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

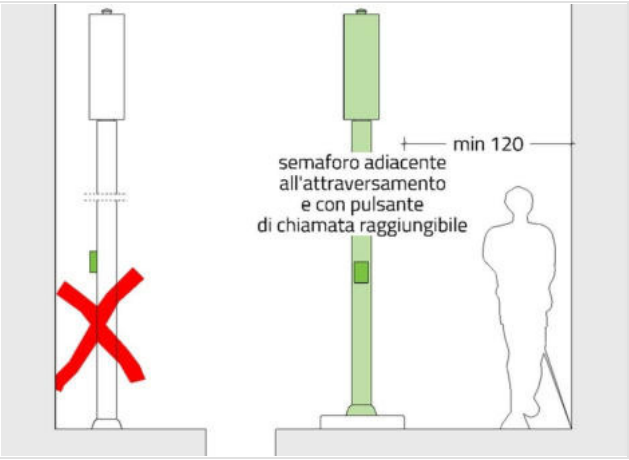

PS1980 (modificato)
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Spostamento del palo in prossimità della nuova posizione dell'attraversamento pedonale e sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

2.531 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 515, Udine	3	E 00FF5-02329

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 68 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 155 cm. Larghezza totale del marciapiede di 235 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

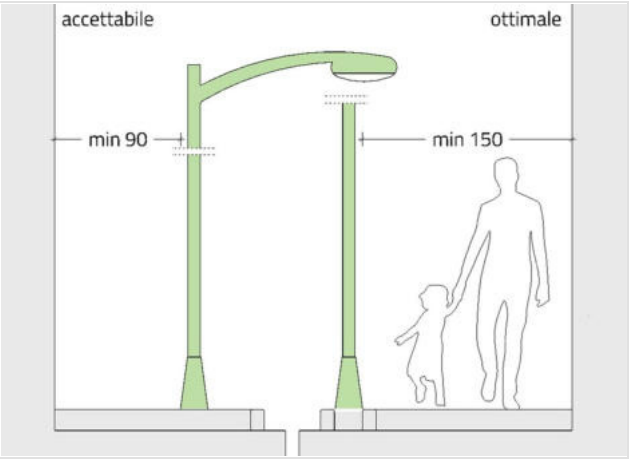

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 515, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02330**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il marciapiede ha un andamento a L di cui una porzione di larghezza 235 e l'altra di 167 cm. Lunghezza totale di 1050 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02331	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 515, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

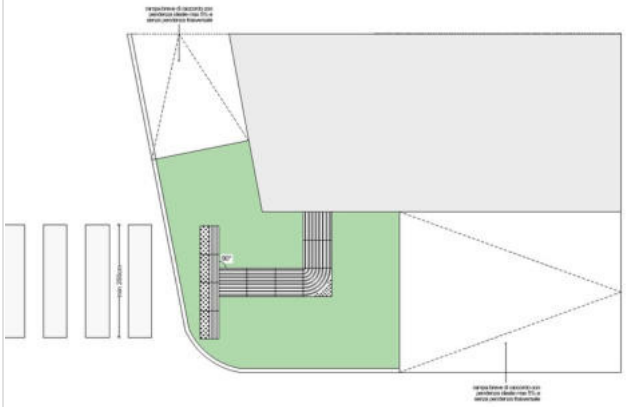

(modificato)
Rifacimento in piano della porzione di marciapiede, spostamento e rifacimento della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento in piano della porzione di marciapiede antistante l'attraversamento pedonale priva di pendenza trasversale. Spostamento e rifacimento della segnaletica tattilo-plantare in posizione ortogonale all'attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano della porzione di marciapiede, spostamento e rifacimento della segnaletica tattilo-plantare

5.113 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 515, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02331**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è ortogonale alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02330	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 515, Udine	**5113 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

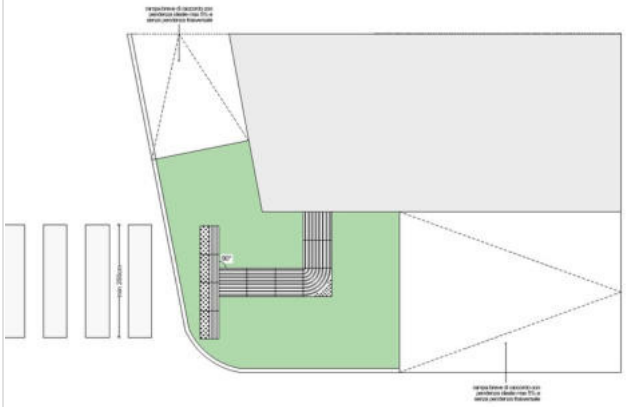

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02330.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 515, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02332

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	34	≤ 8 m
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3400,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Le singole aiuole spartitraffico presenti hanno una distanza fra di loro inferiore agli 800 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

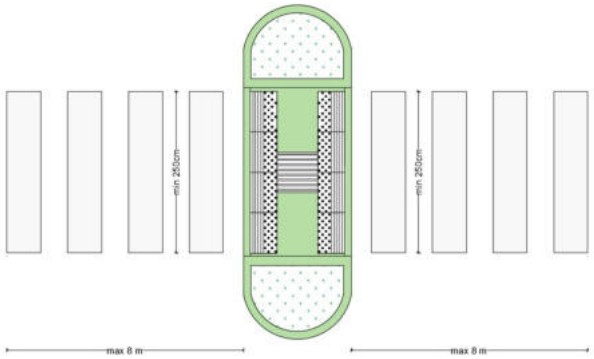

P0770 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isole pedonali nelle posizioni già predisposte lungo l'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini nelle modalità adeguate rispetto alla predisposizione geometrica delle aiuole (future isole pedonali) già presenti.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale
3.296 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 543, Udine	1	E 00FF5-02333

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Il codice di pericolo valicabile non è ortogonale alle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02335	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 543, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

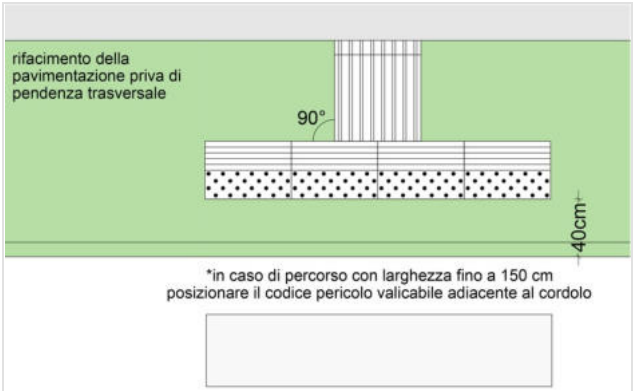

PS1897 (modificato)
Rifacimento della pavimentazione a livello stradale e sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede a livello stradale in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sostituzione dei moduli tattilo-plantari e riposizionamento ortogonalmente all'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione a livello stradale e sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

6.708 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 543, Udine	3	E 00FF5-02334

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 32 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 152 cm. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

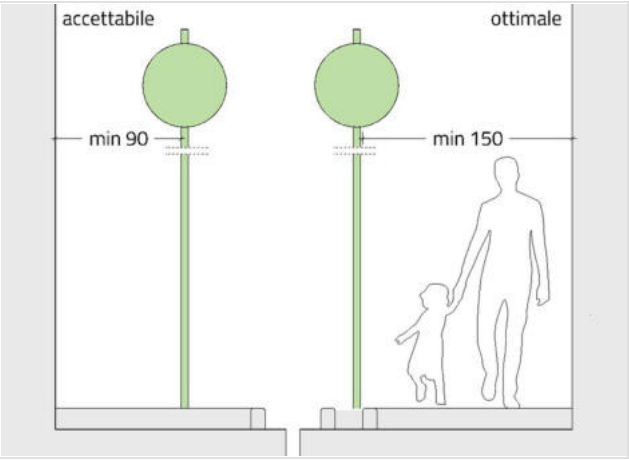

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 543, Udine	1	E 00FF5-02335

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1650,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02333	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 543, Udine	6708 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

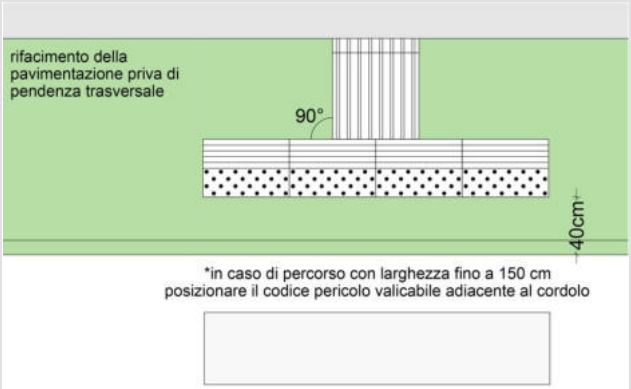

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02333.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 543, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02336**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

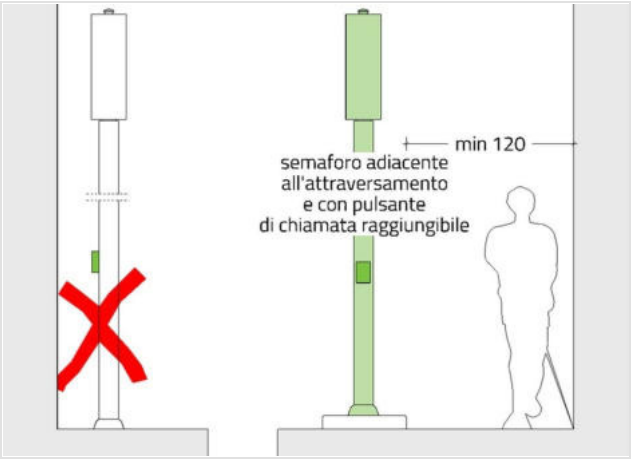

PS1980
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 543, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02337**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 543, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02338**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1070,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

2.966 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 712, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02339**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 286,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02340	**1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 712, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

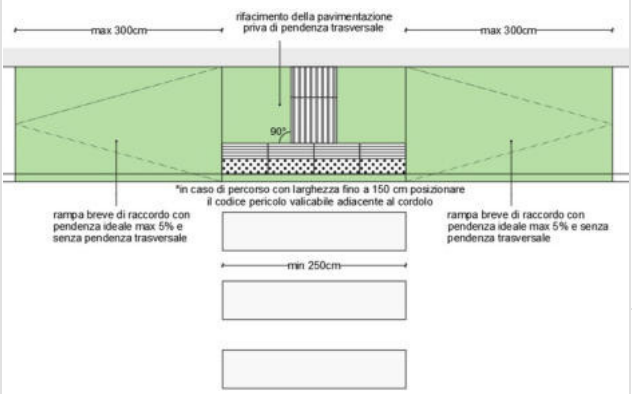

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.617 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 712, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02340

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y --
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare non coerente con la larghezza delle strisce pedonali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02339	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 712, Udine	Costo stimato **3617 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

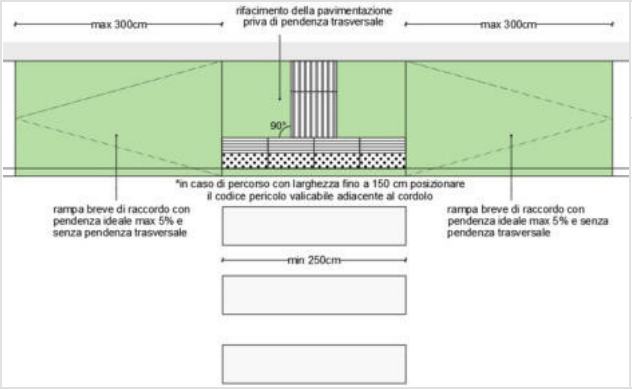

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02339.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 712, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02341**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

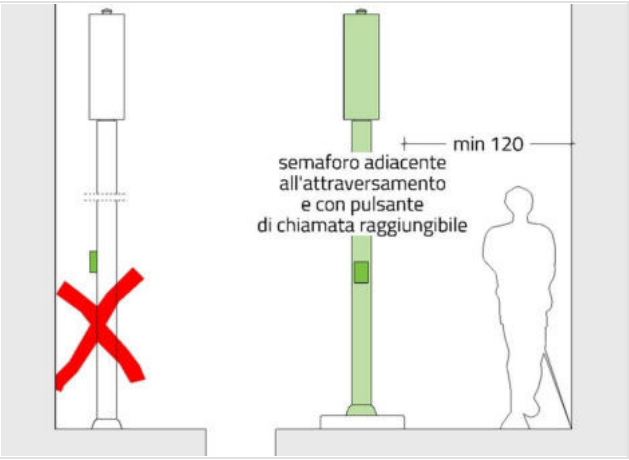

PS1980
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione del dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 712, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02342

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02343	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 712, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

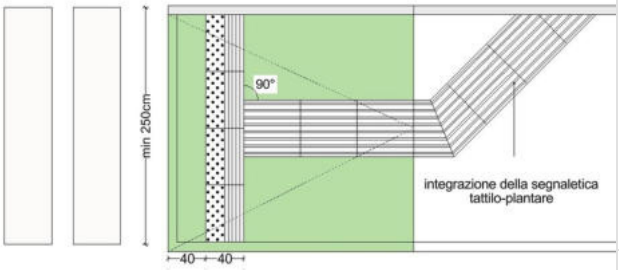

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

2.619 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 712, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02343

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02342	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 712, Udine	Costo stimato **2619 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

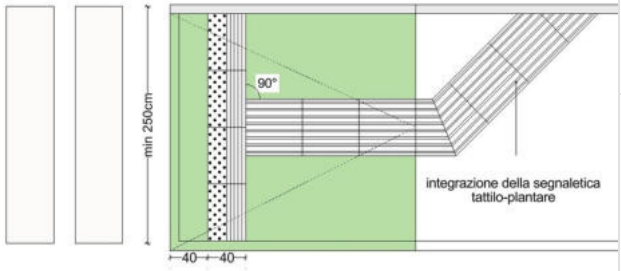

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02342.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 712, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02344**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

571 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Cividale 712, Udine	1	E 00FF5-02345

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 712, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02346**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
La vegetazione ostacola la vista del semaforo pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

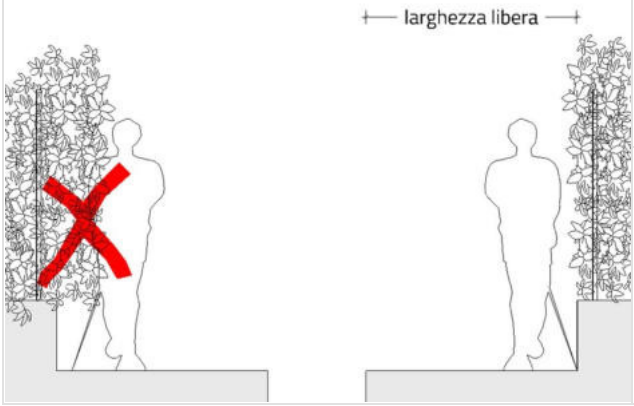

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **247 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 712, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02347**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 710, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02348**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 335,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02349	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 710, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

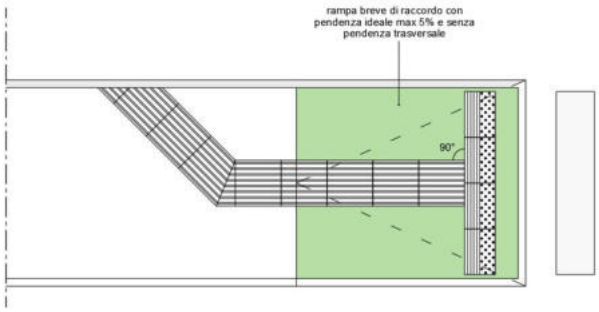

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

2.689 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 710, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02349**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02348	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 710, Udine	**2689 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

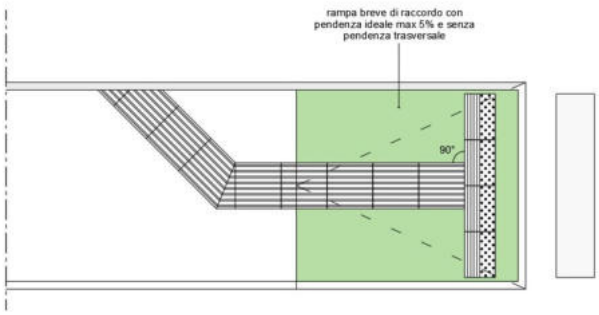

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02348.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 710, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02350**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

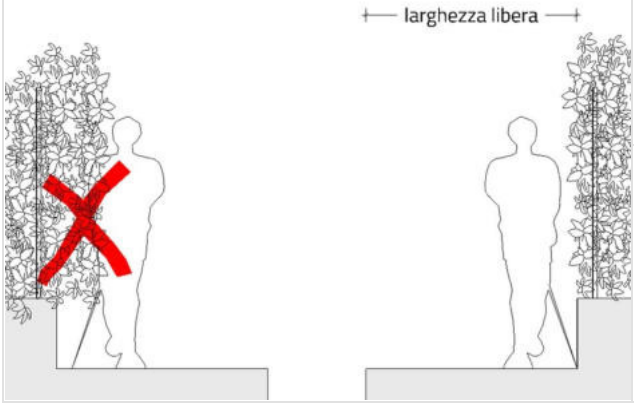

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

148 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 710, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02351**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 215 cm. Larghezza totale del marciapiede di 231 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

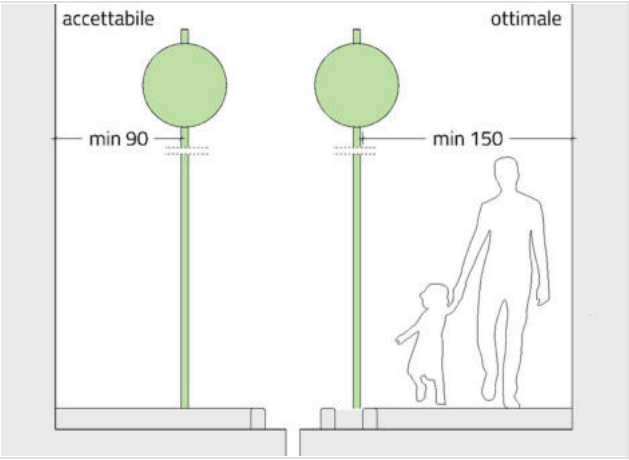

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 710, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02352**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02353	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 710, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

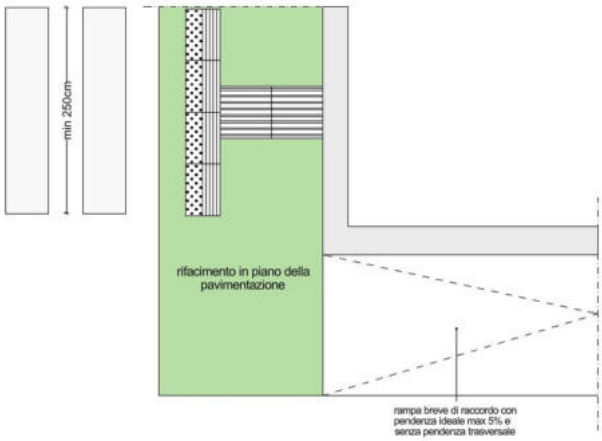

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione in piano, posa di moduli tattilo-plantari

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della pavimentazione in piano, posa di moduli tattilo-plantari

2.548 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 710, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02353

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02352	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 710, Udine	Costo stimato **2548 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

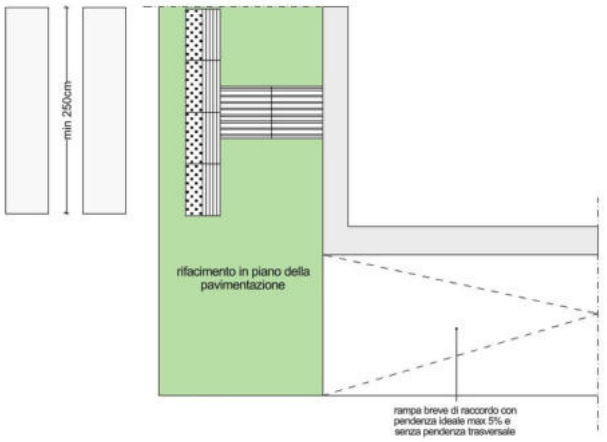

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02352.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02354**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Terra compattata	

Note relative al rilievo
Sul tratto si trova un palo di segnaletica a distanza di 70 cm dal muro (interasse).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

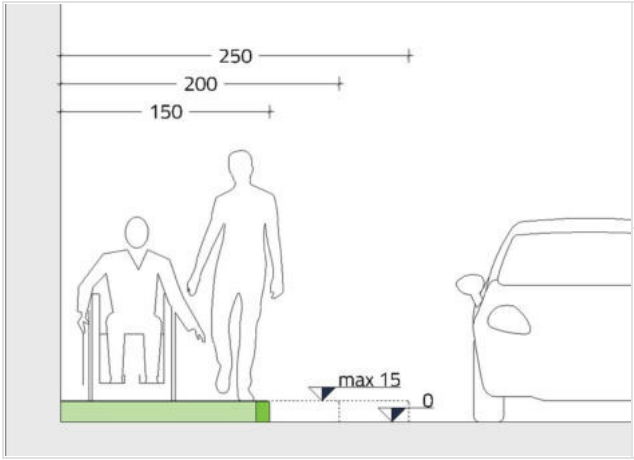

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **1.247 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Antonio Carneo 3, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02355

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

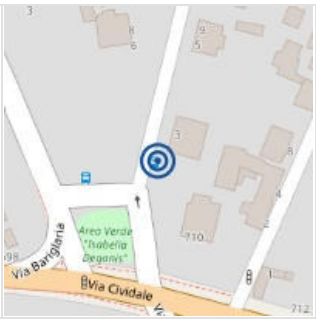

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

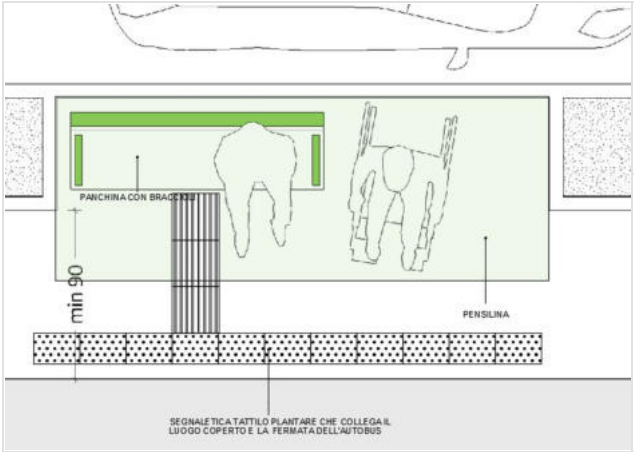

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02356**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 600 cm. Lunghezza da muro ma muro di 1220 cm. Assenza di marciapiede su entrambi i lati della strada.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02357)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

3.295 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Antonio Carneo 8, Udine	1	E 00FF5-02357

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Lunghezza della sede stradale di 600 cm. Lunghezza da muro ma muro di 1220 cm. Assenza di marciapiede su entrambi i lati della strada.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di marciapiede, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02356)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di marciapiede, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare
4.141 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02358**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
Sul tratto di percorso si trova un palo segnaletica con distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02359	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Antonio Carneo 8, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

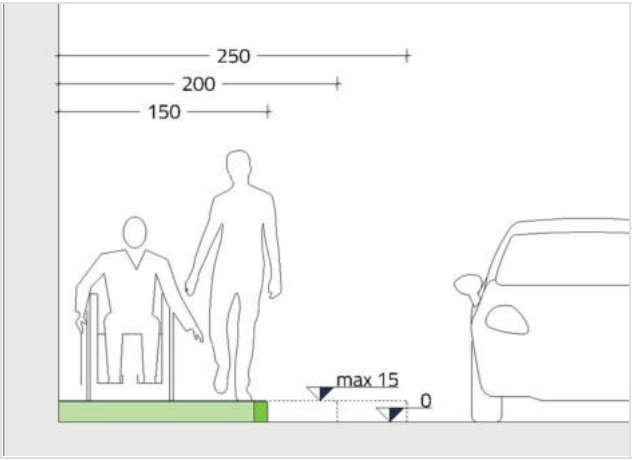

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **4.448 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 8, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02359**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

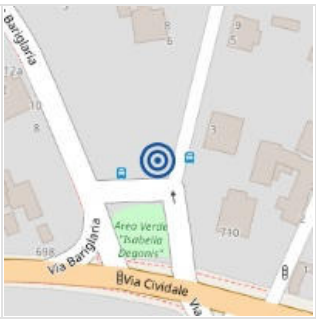

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 192,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02358	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Antonio Carneo 8, Udine	**4448 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

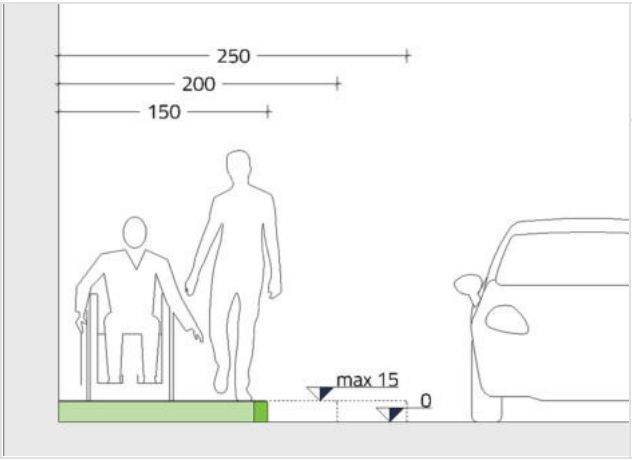

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02358.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02360**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 32 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 290 cm. Larghezza totale del marciapiede di 325 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

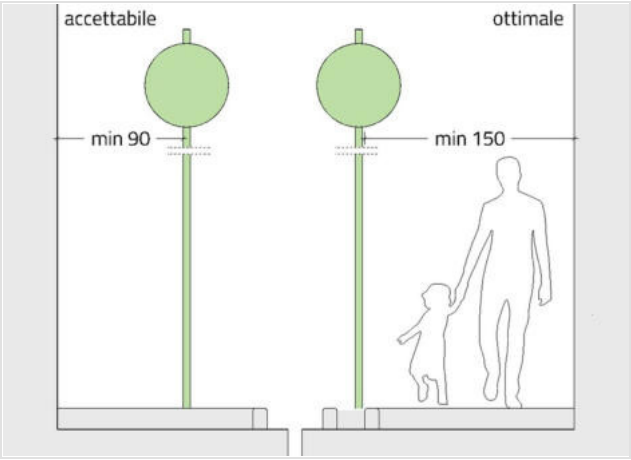

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02361**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 175,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 70 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 250 cm. Larghezza totale del marciapiede di 322 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02362	LIV. **3**	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Antonio Carneo 8, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità. Spostamento dell'insegna pubblicitaria in area esterna al percorso pedonale, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'insegna pubblicitaria in area esterna la percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02362**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 175,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 70 cm tra palo (interasse) e cordolo. Larghezza minima di passaggio di 250 cm. Larghezza totale del marciapiede di 322 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02361	LIV. **3**	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Antonio Carneo 8, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0656 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02361.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Antonio Carneo 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02388**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 630 cm. Distanza tra marciapiede e sede stradale di 130 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02389)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.317 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Antonio Carneo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Antonio Carneo 39, Udine	1	E 00FF5-02389

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 630 cm. Distanza tra cordolo esistente (area verde) e sede stradale di 166 cm. Dislivello tra sede stradale e area verde di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di nuovo marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02388)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

3.960 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02371**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

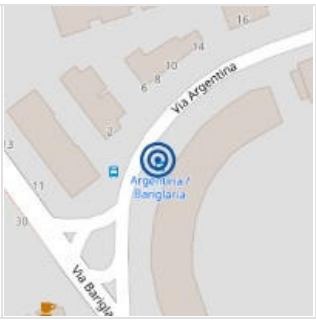

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo

Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli. Larghezza totale del marciapiede di 190 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

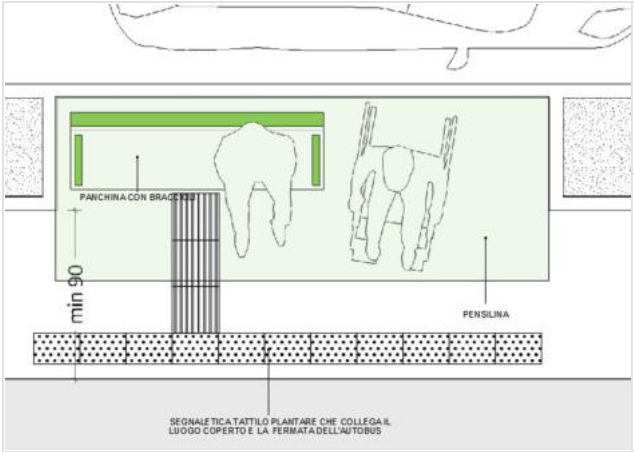

PS1751

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02372**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

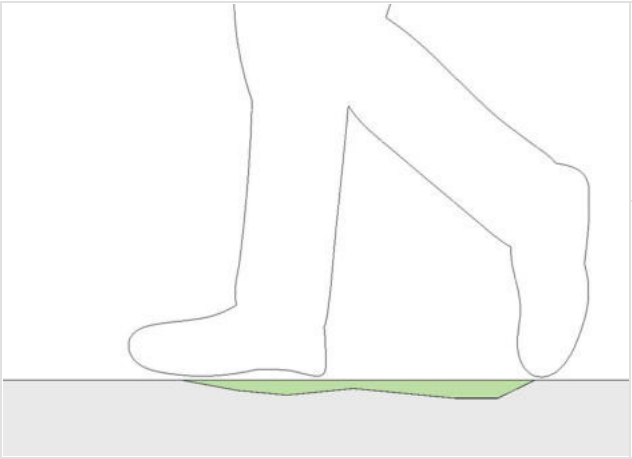

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.118 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 9, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02373**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

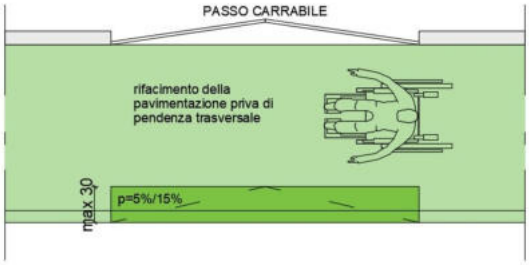

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

5.461 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 9, Udine**	1	E **00FF5-02374**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

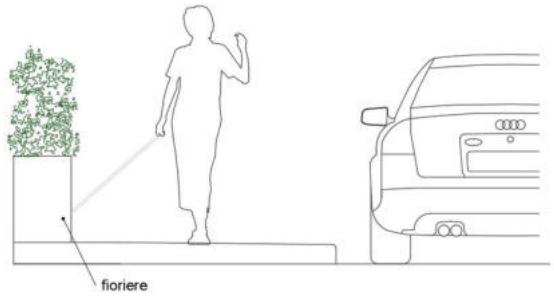

PS1792 (modificato)
Realizzazione di guida naturale

Posa di fioriere o elementi di arredo urbano con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Posa di fioriere o elementi di arredo urbano **1.500 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02375**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 440,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

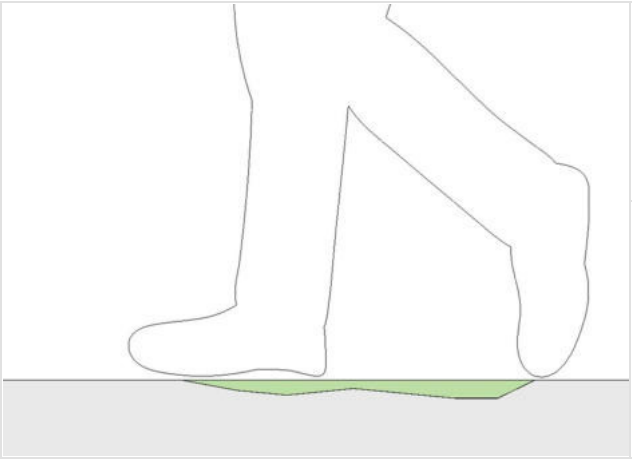

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.942 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02376**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Porzione di discesa con andamento non regolare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02377	LIV. **1**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Argentina 25, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

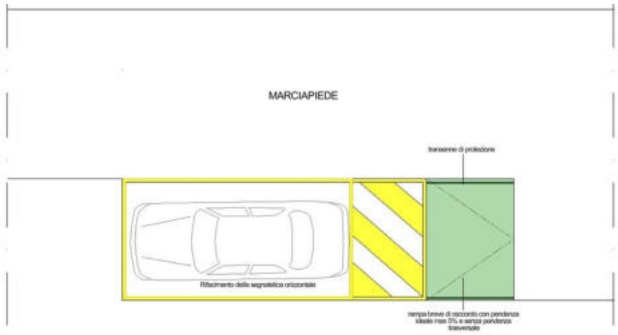

(modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale, realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Realizzazione di rampa con cordolo laterale di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale, realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

964 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02377**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02376	**1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Argentina 25, Udine	**964 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

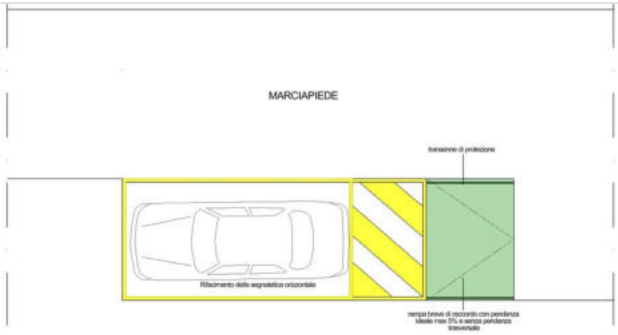

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02376.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 25, Udine	3	E 00FF5-02378

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Fioriera	Si	
Dimensioni	X 42,00 cm	Y 42,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 32 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0629 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità, si suggerisce lo spostamento degli elementi a contatto con il muro, per non creare interruzioni con la guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento degli elementi a contatto con il muro **182 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 25, Udine	3	E 00FF5-02379

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Fioriera	Si	
Dimensioni	X 42,00 cm	Y 42,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 32 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0629 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità, si suggerisce lo spostamento degli elementi a contatto con il muro, per non creare interruzioni con la guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento degli elementi a contatto con il muro **182 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02380**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza minima di passaggio di 72 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

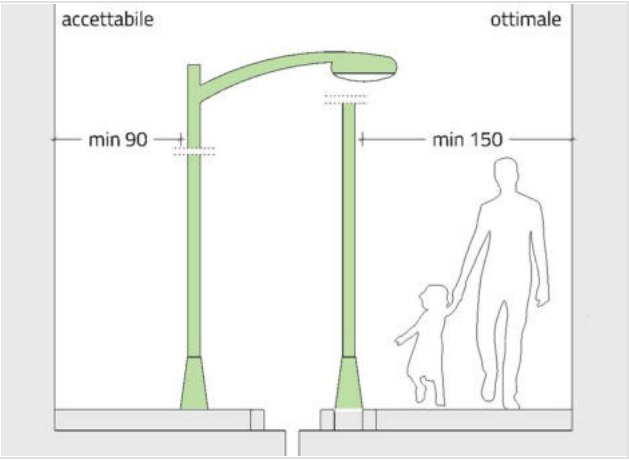

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 24, Udine	1	E 00FF5-02381

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

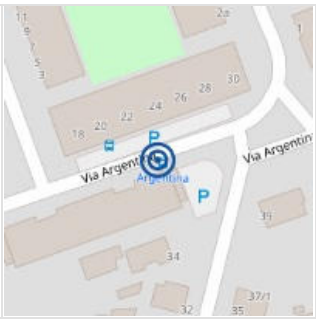

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza minima di passaggio di 75 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

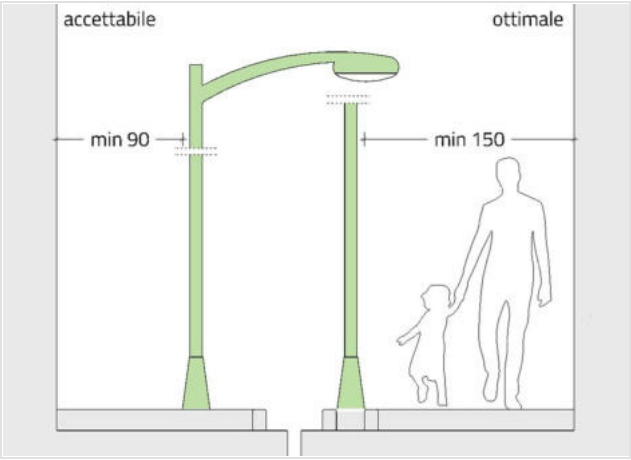

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02382**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.
(Marciapiede di dimensioni ridotte)

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 24, Udine	1	E 00FF5-02385

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza minima di passaggio a 82 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

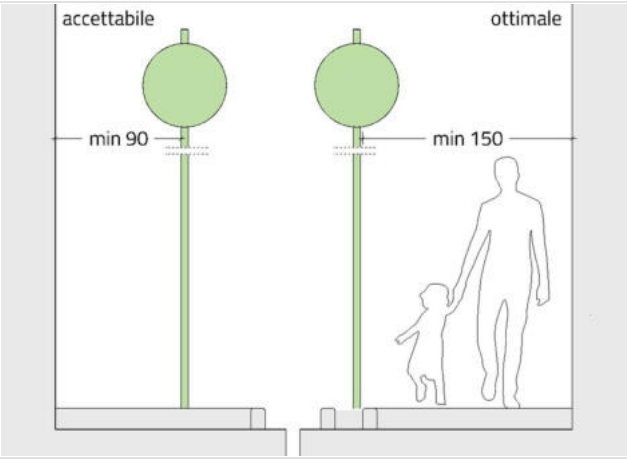

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02386**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
I tubi riducono la larghezza minima di passaggio a 75 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

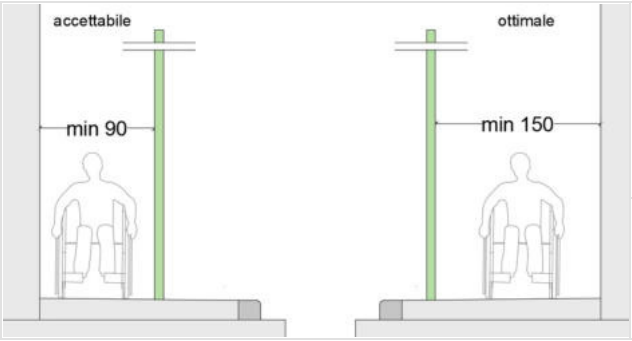

PS1750 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 26, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02387**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

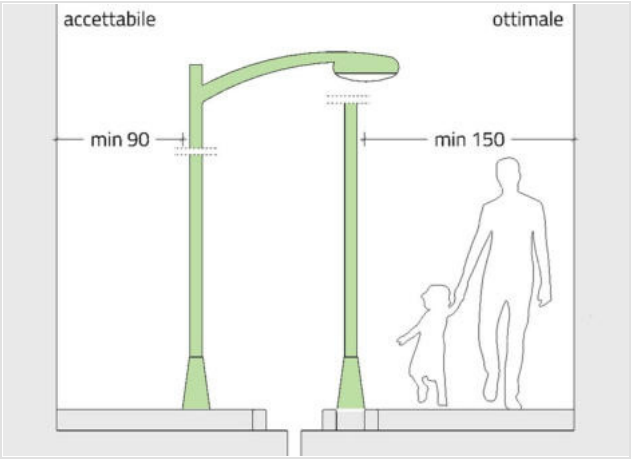

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02390**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

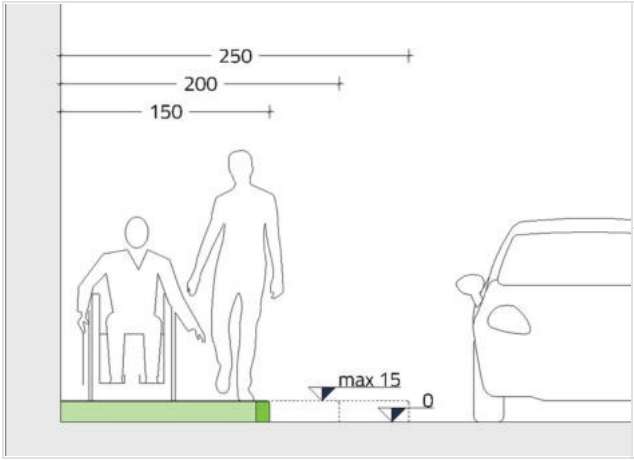

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **16.257 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 43, Udine	1	E 00FF5-02391

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza minima di passaggio a 80 cm.
Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

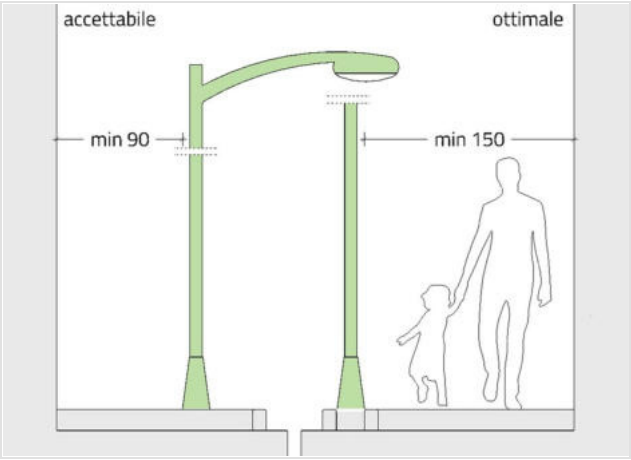

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 43, Udine	1	E 00FF5-02392

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02393	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Argentina 43, Udine	5124 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02393.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 43, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02393**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 890 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02392	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Argentina 43, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02394)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **5.124 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Argentina 40, Udine	1	E 00FF5-02394

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

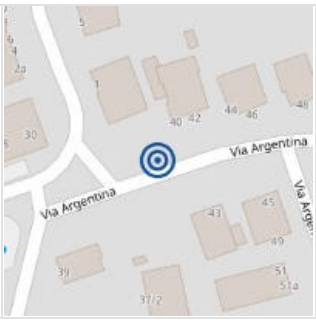

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 890 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02393)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

4.510 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 06 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Argentina 40, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02395**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

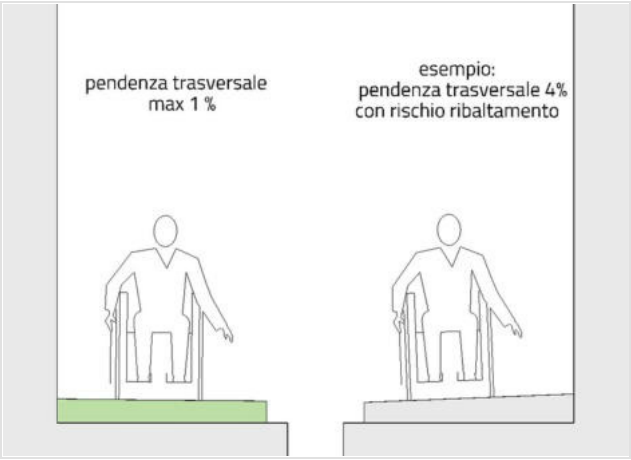

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

7.839 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02411**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

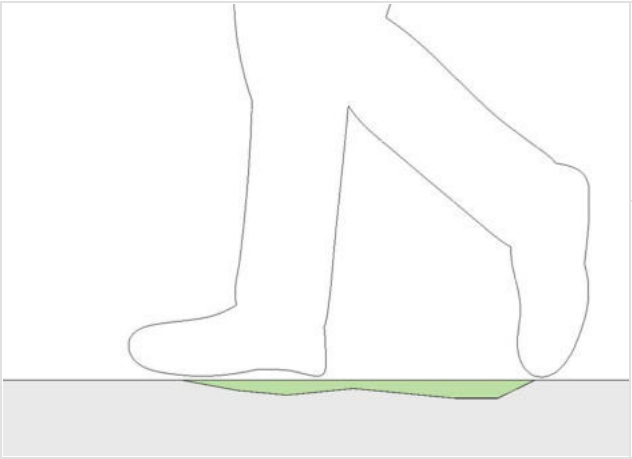

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **6.376 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 16, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02412**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

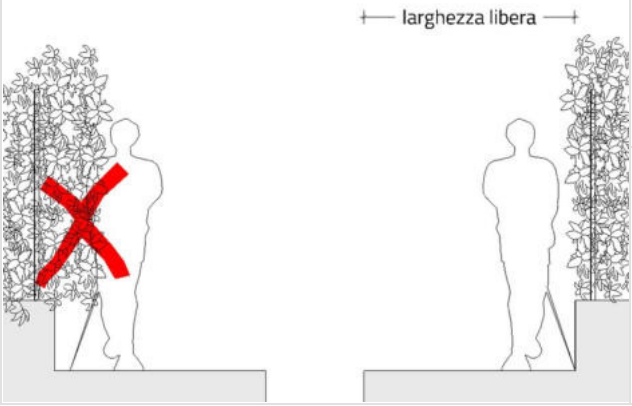

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

444 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 8-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02413**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 2900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

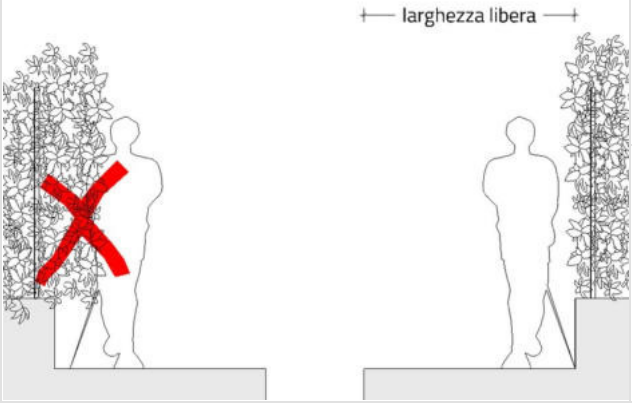

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

477 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Argentina 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02414**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

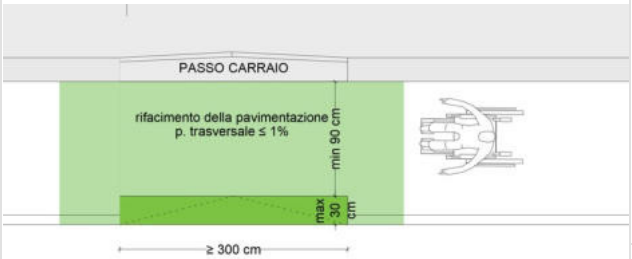

PS1783
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.660 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Argentina

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **17 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Argentina 2, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02415

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

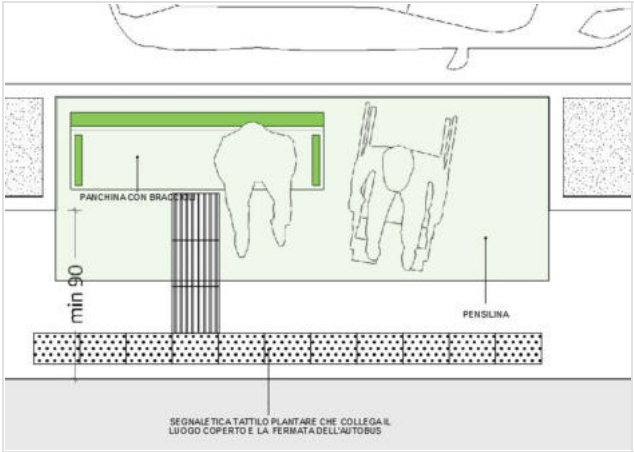

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02397**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 110 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

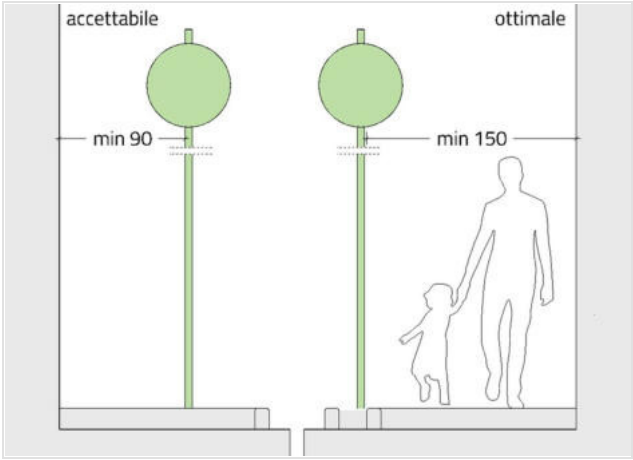

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02398**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 44 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 105 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

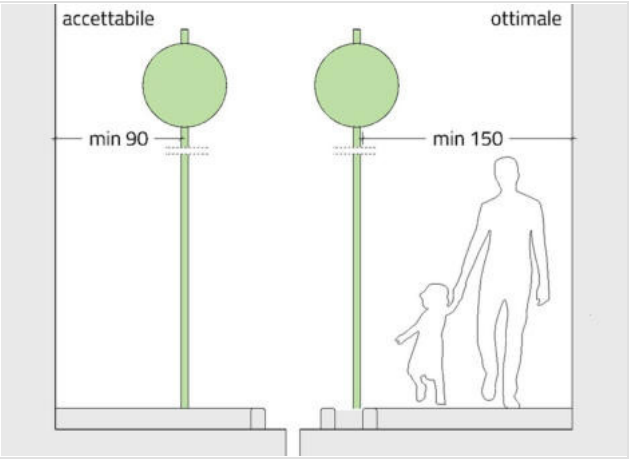

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO **182 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02399**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 880 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02400)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.213 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02400**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 880 cm. Larghezza del marciapiede di 161 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02399)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.116 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02401**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

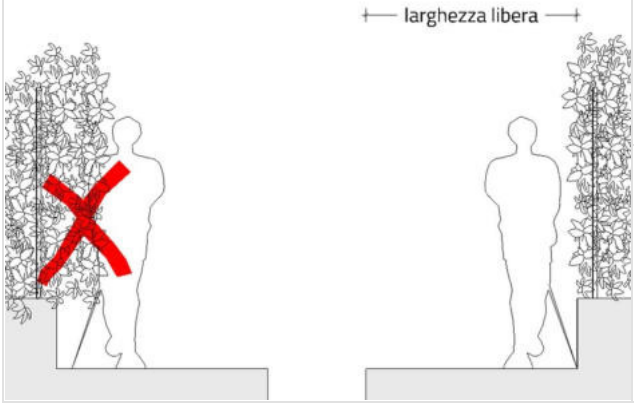

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

66 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02402**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 2370,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

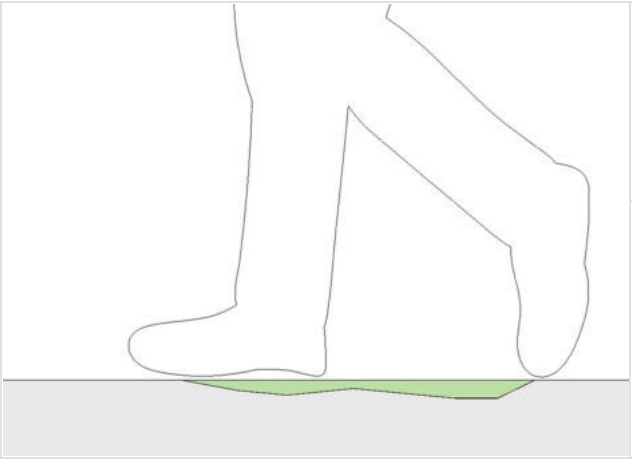

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **6.092 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Brasile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Brasile 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02403**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

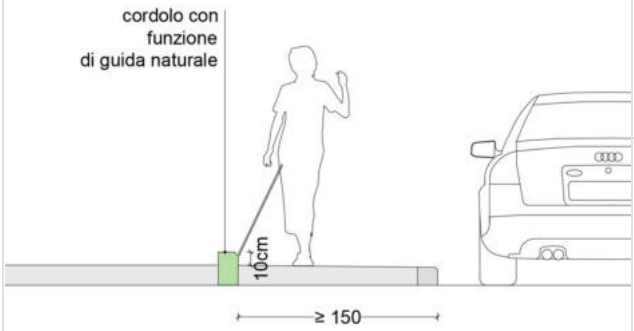

PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.845 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02404**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

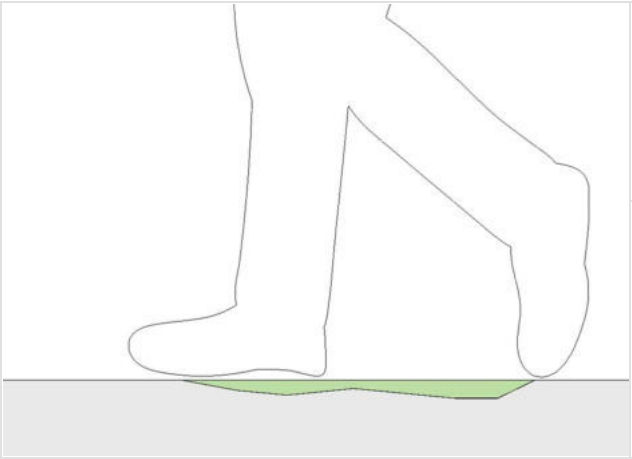

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **4.256 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02405**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

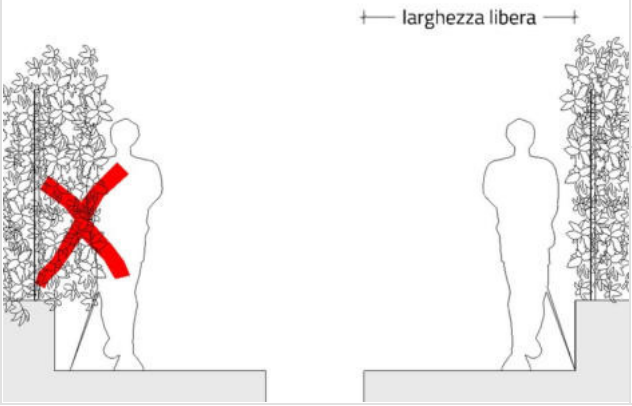

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

164 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Venezuela 1, Udine	1	E 00FF5-02406

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo luce	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Il palo riduce la larghezza di passaggio a 80 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

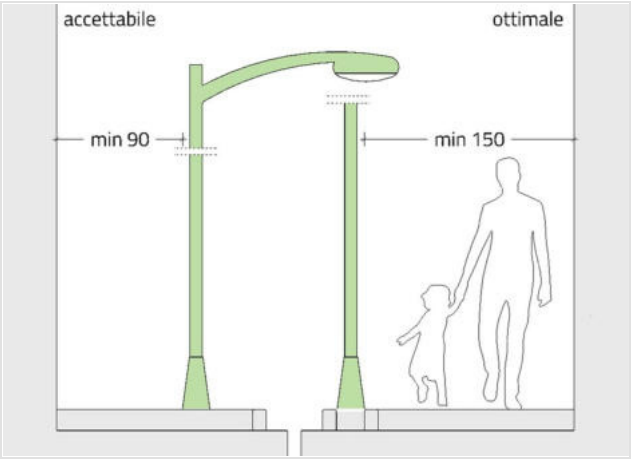

PS1753
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Verificare con l'ente proprietario e/o con il gestore la possibilità di procedere all'eliminazione o allo spostamento dell'elemento impiantistico in posizione esterna al percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo verticale della luce in area esterna al percorso pedonale

573 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02407**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

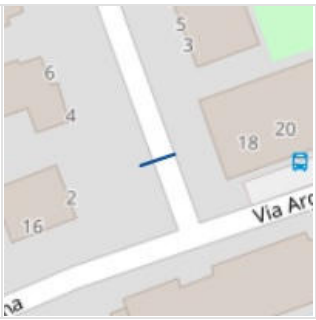

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 890 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02408)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.346 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02408**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

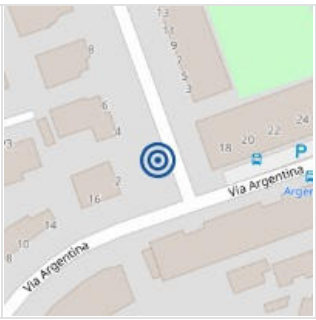

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 890,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 890 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02407)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.379 €

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02409**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 152,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

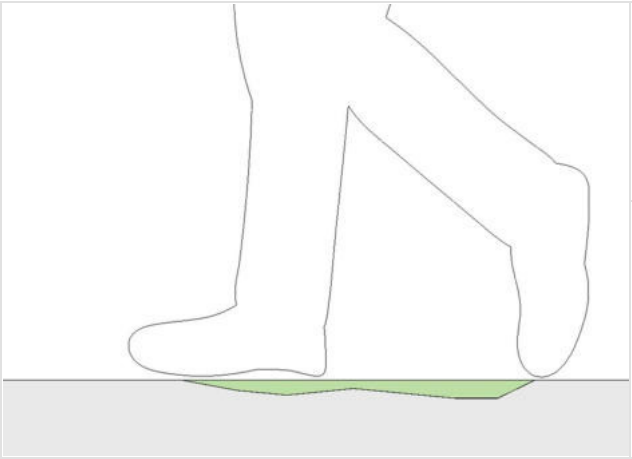

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.846 €**

PEBA comune di udine > SAN GOTTARDO > Via Venezuela

Rilevatore **0130** Data Rilievo **17 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Venezuela 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02410**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

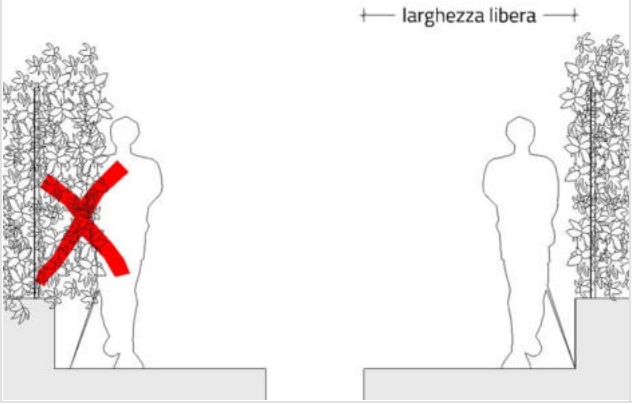

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

263 €

12

QUARTIERE AURORA

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Giacinto Calligaris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Giacinto Calligaris, 12 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02419**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

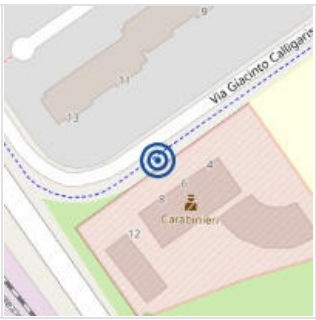

Transenna	Si	
Dimensioni	X 95,00 cm	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza di 100 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0661 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della transenna.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **82 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Giacinto Calligaris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Giacinto Calligaris, 12 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02420**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

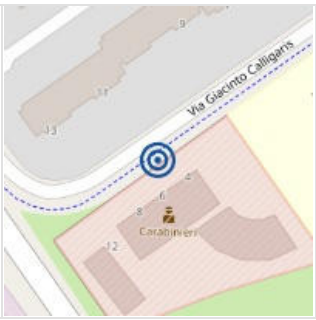

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

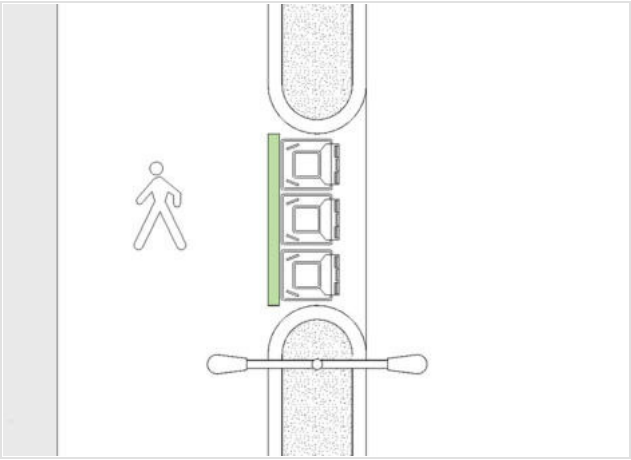

P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

27 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Giacinto Calligaris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Giacinto Calligaris, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02661**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 15000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

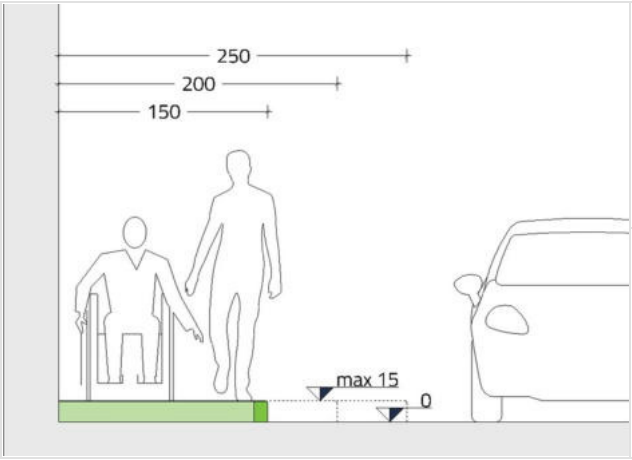

PS1749
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **38.970 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02422**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02423	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

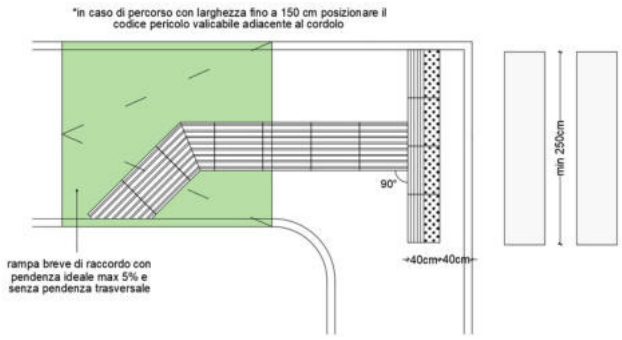

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.359 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130**	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Data Rilievo **18 Giugno 2025**	Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	1	E 00FF5-02423
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025			

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02422	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	2359 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

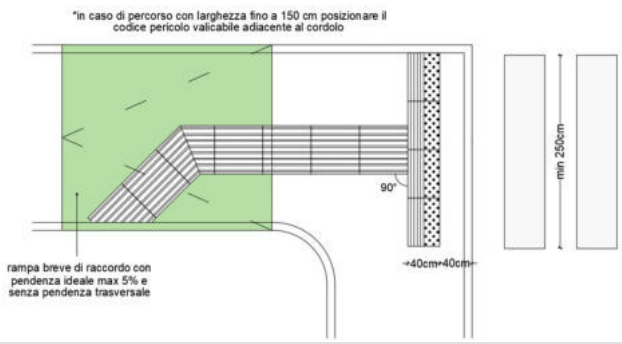

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02422.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02424**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **51 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	1	E 00FF5-02425

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02431	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Riccardo Di Giusto 82, Udine	Costo stimato **5467 €**
E 00FF5-02427	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

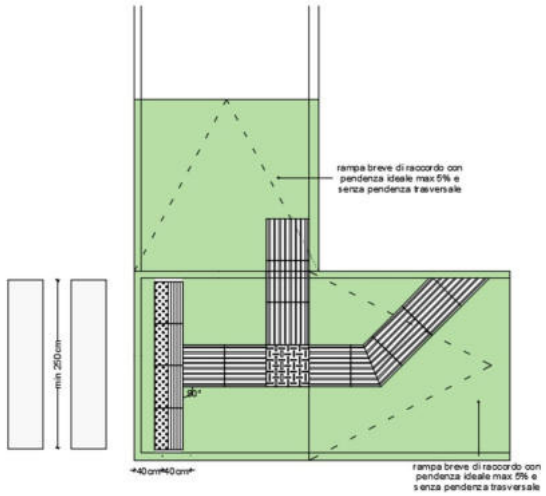

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02431.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02426**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 770,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

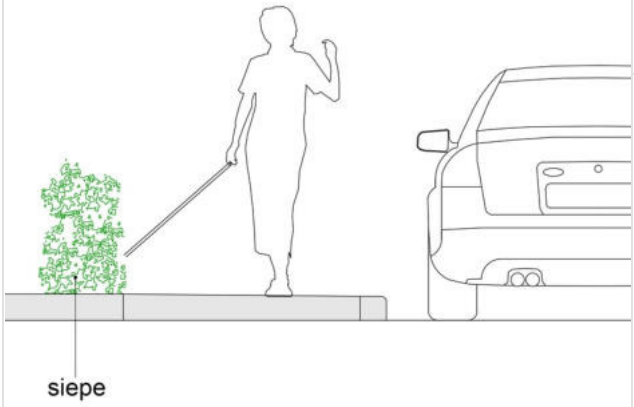

Sostituzione dell'elemento

Sostituzione del cordolo di guida naturale esistente con altro di altezza minima di 10 cm, piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dell'elemento **1.120 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02427**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 190,00 cm Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02431	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Riccardo Di Giusto 82, Udine	Costo stimato **5467 €**
E 00FF5-02425	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

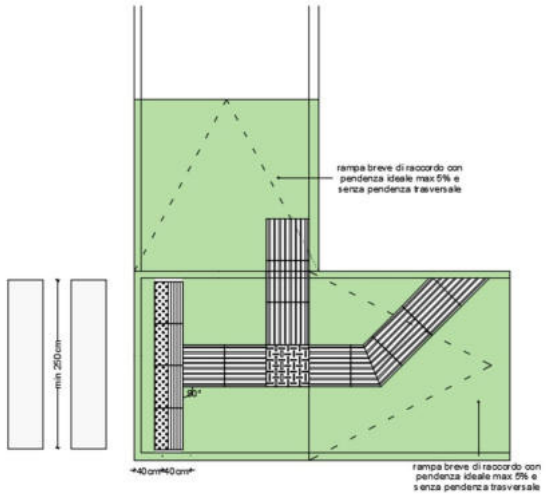

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02431.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02428**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 5450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02430	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

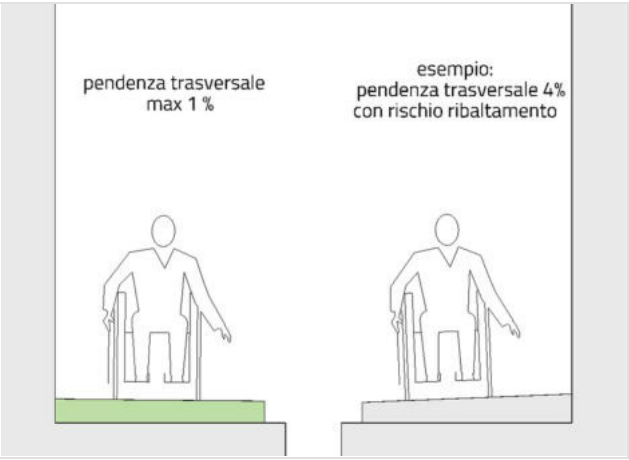

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

14.648 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02430**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 5450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02428	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	**14648 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

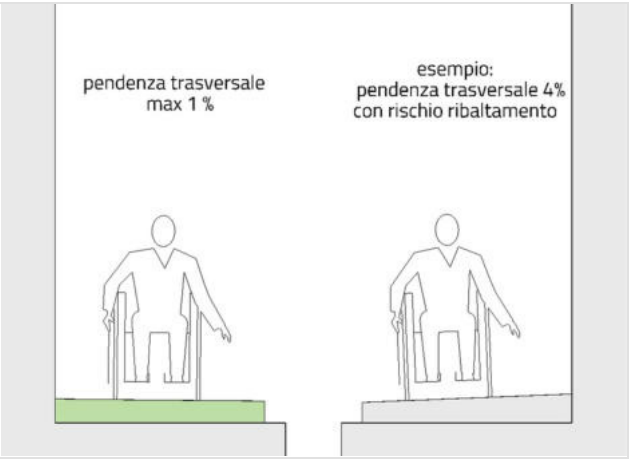

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02429.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02431**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02425	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02427	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

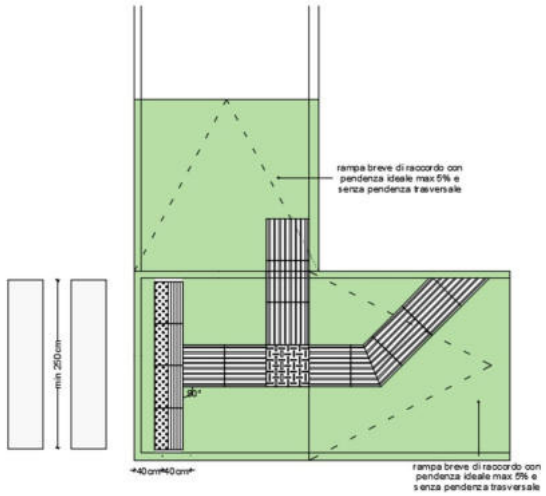

P0764 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale per ognuna delle direzioni del marciapiede in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02432)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **5.467 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02432**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa longitudinale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02431)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

3.679 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02433**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

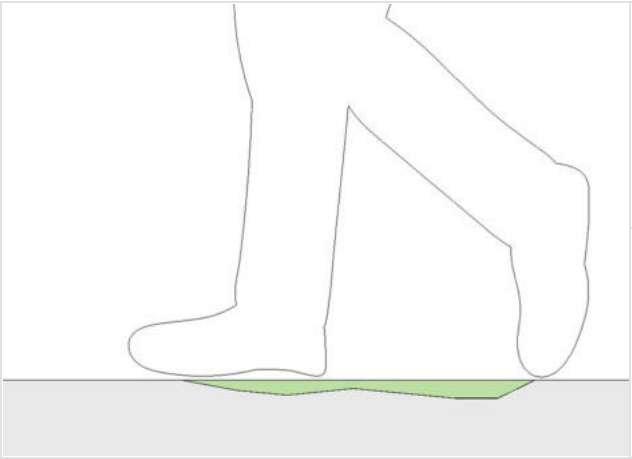

P0688 (modificato)
Riparazione del marciapiede

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Eliminazione dei risalti in metallo presenti su tutto il percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

20.905 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02435**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

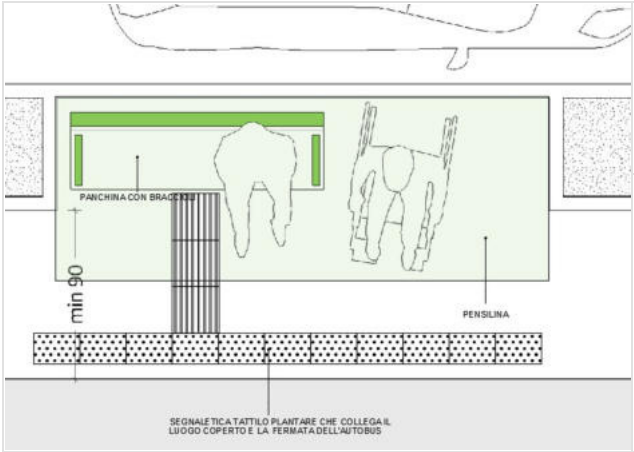

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, 33100 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02436**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

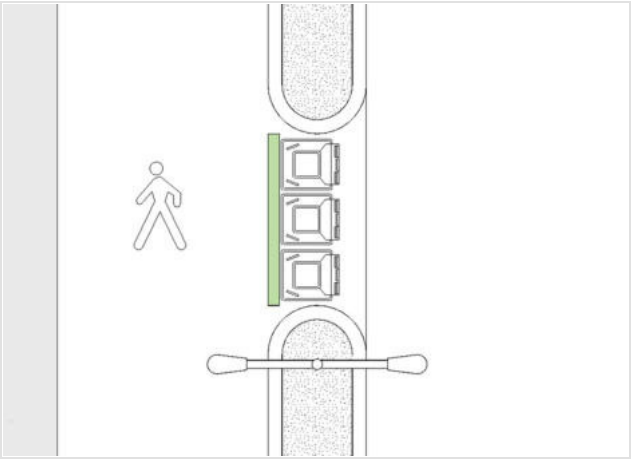

P0623 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

27 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02437**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

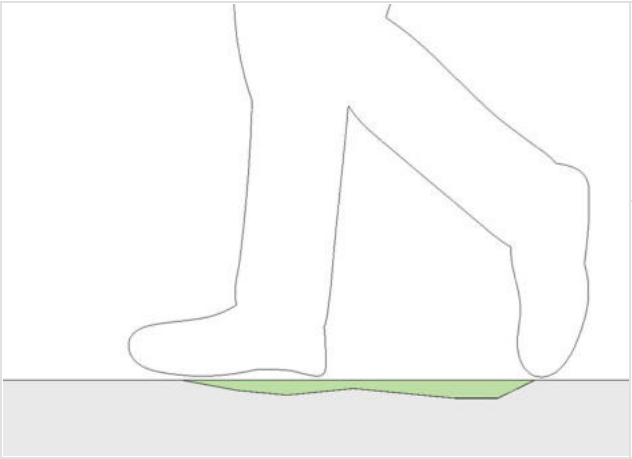

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.401 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02438**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

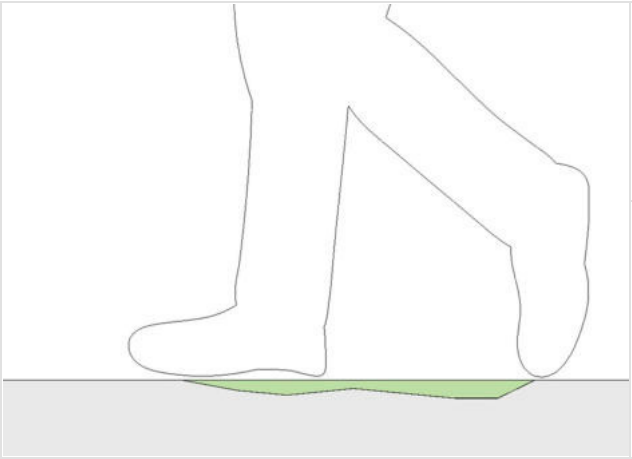

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.959 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02439**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

P0550 (modificato)
Realizzazione di raccordo per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, per superare il dislivello tra 2,5 cm e 5 cm. Lunghezza come intera fascia di contatto pari alla larghezza dell'attraversamento pedonale, profondità min 40 cm, privo di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo **149 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02440**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02441	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02442	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

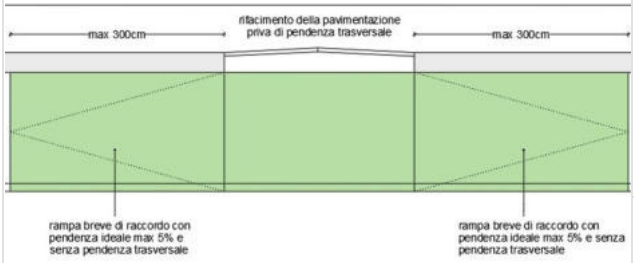

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

4.040 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02441**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02440	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **4040 €**
E 00FF5-02442	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

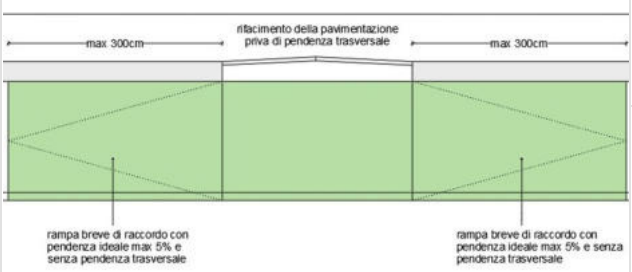

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02440.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02442**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02440	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	**4040 €**
E 00FF5-02441	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	**--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

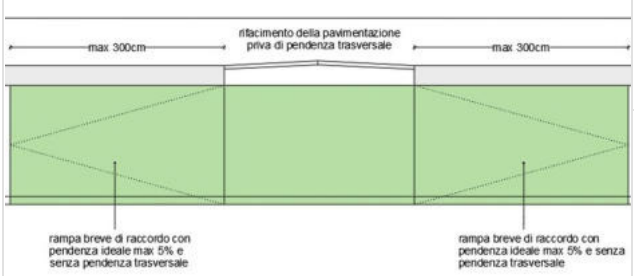

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02440.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	2	E 00FF5-02444

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 7900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

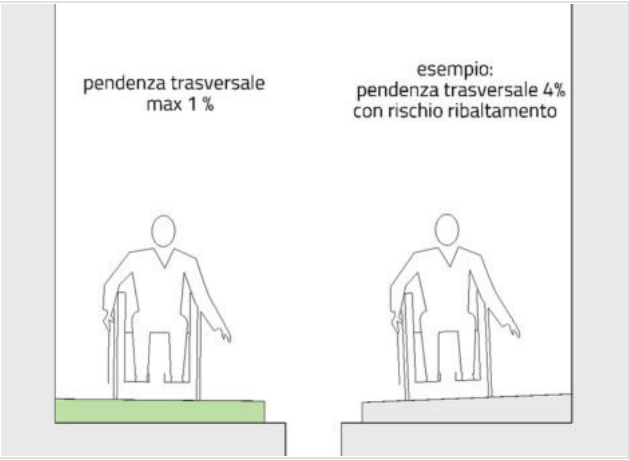

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Si suggerisce di eliminazione la pendenza per ingresso presumibilmente carraio in prossimità della chiesa, in quanto non è consentito l'accesso alle auto.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

20.054 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02445**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 7900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

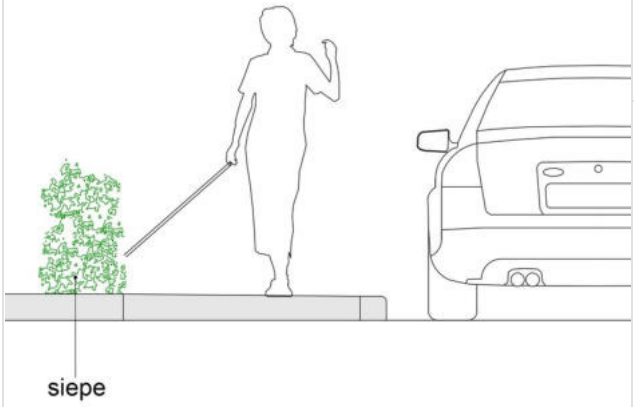

PS1805
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale **8.848 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02446**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Altezza del cordolo esistente di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

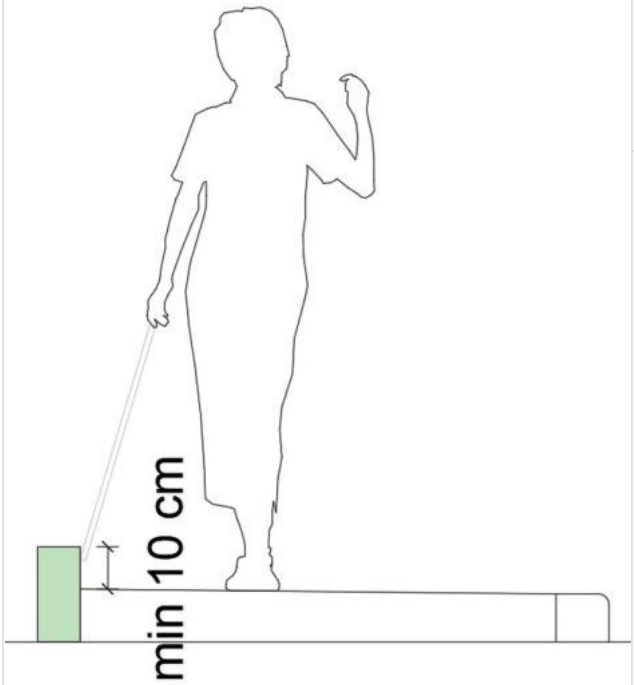

(modificato)
Innalzamento del cordolo di guida naturale

Innalzamento del cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Innalzamento del cordolo di guida naturale **814 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02447**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

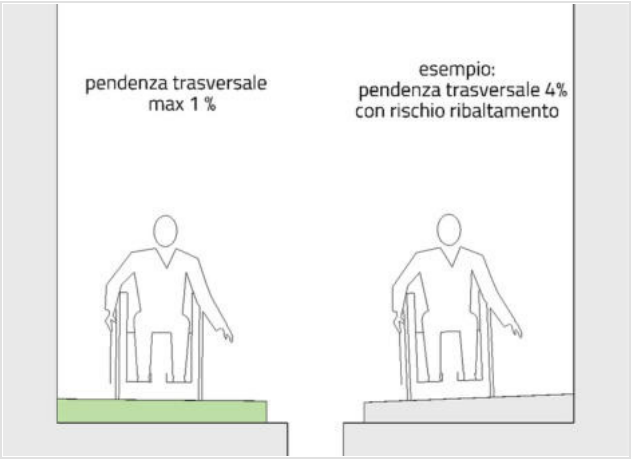

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.754 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	2	E 00FF5-02448

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02450	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

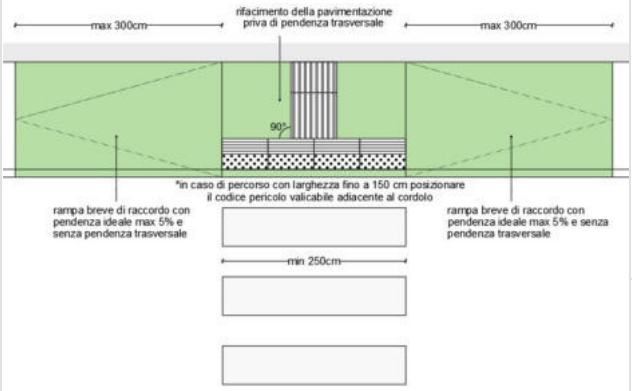

(modificato)
Realizzazione di rampe e posa segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale e pendenza trasversale max di 1% in prossimità dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.187 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, 33100 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02449**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo

271 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02450**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 185,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02448	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **4187 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

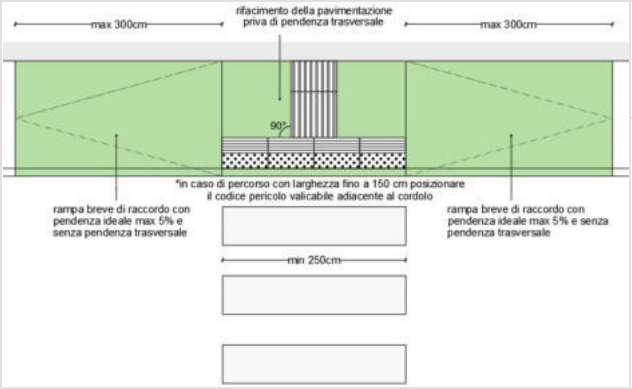

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02448.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02451**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

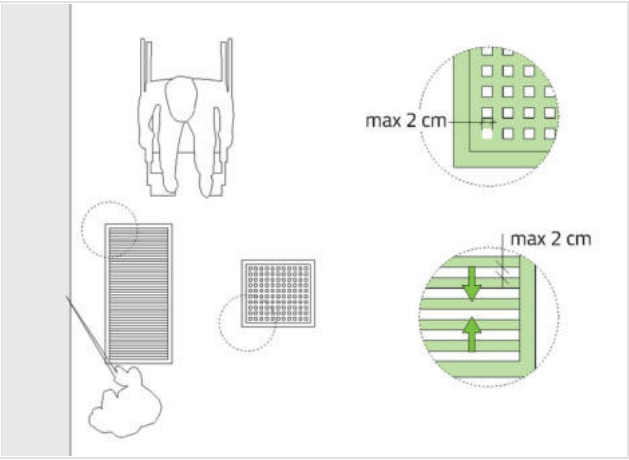

P0618 (modificato)
Sostituzione con grigliato ortogonale al verso di marcia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **253 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02452**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **38 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02453**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02454	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

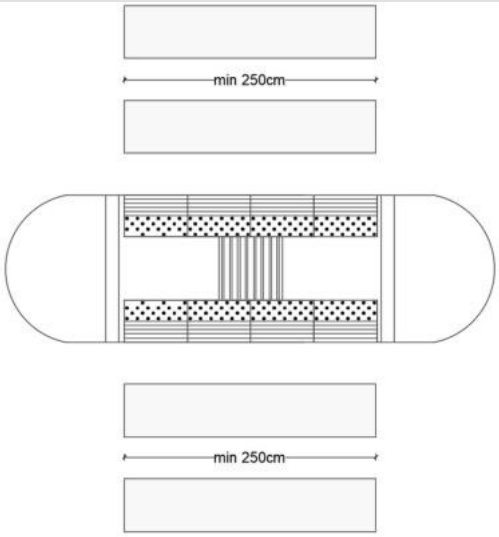

P0882 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02454**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02453	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	**561 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

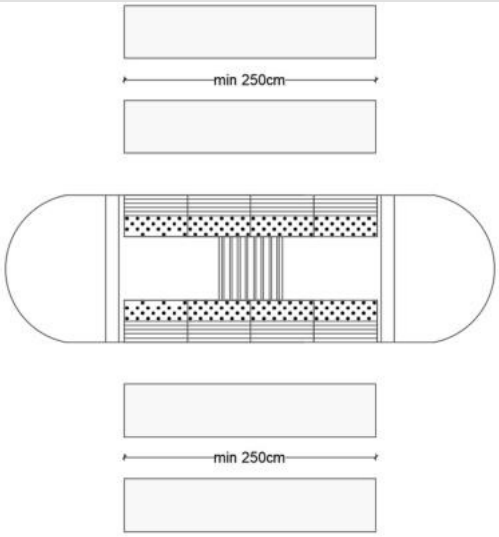

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02453.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02455**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **47 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02456**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **OSTACOLO ORIZZONTALE**

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 35,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

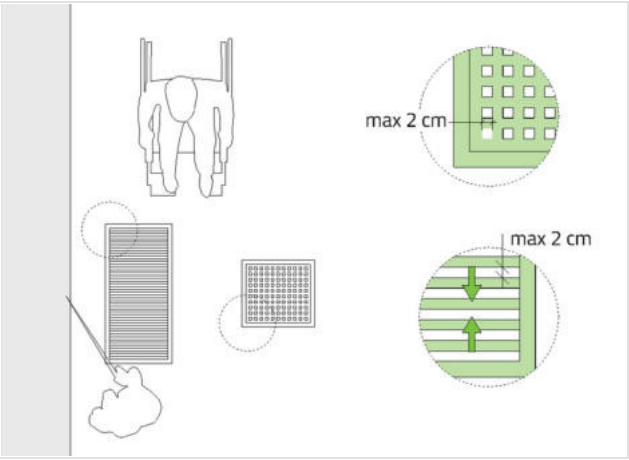

P0618 (modificato)
Sostituzione con grigliato ortogonale al verso di marcia

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02457**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 970,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02490	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02491	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

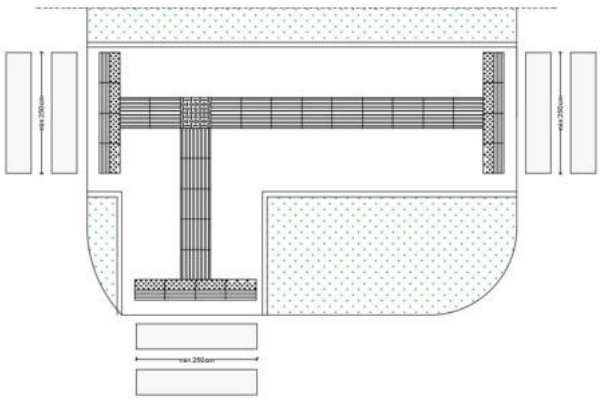

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Costruzione di un sistema di segnaletica tattilo-plantare funzionale al raggiungimento degli attraversamenti pedonali in sicurezza.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **12.962 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02458**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 215,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02459	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

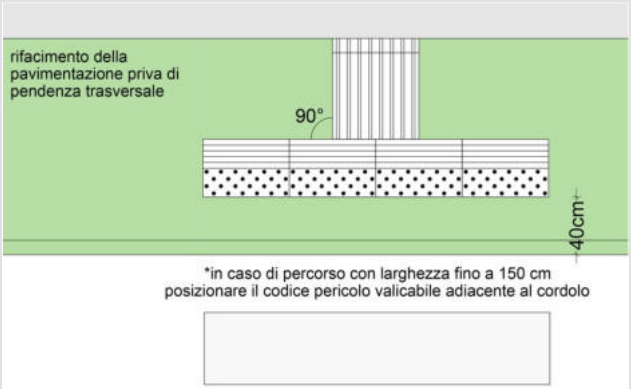

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

2.439 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02459**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 215,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02458	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **2439 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

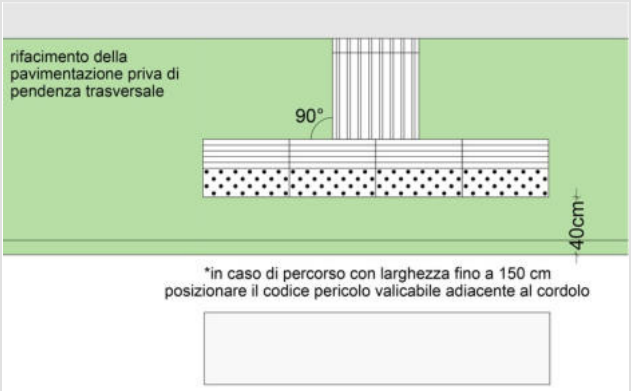

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02458.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02461**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02462	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

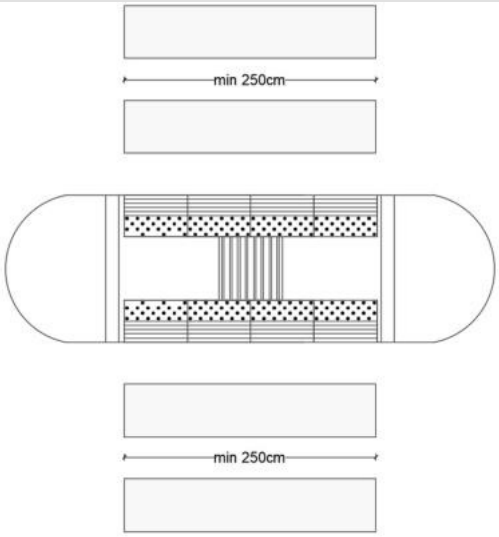

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **935 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **18 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Via Riccardo Di Giusto 80, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02462

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02461	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **935 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

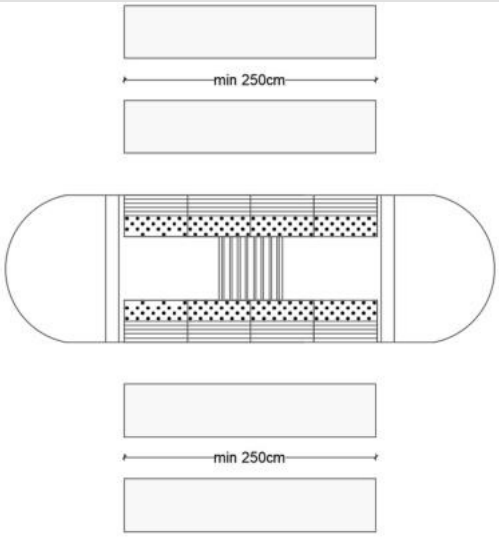

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02461.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02463**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **62 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02464**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA ORIZZONTALE**

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02465	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

298 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02465**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02464	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **298 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02464.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 80, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02466**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

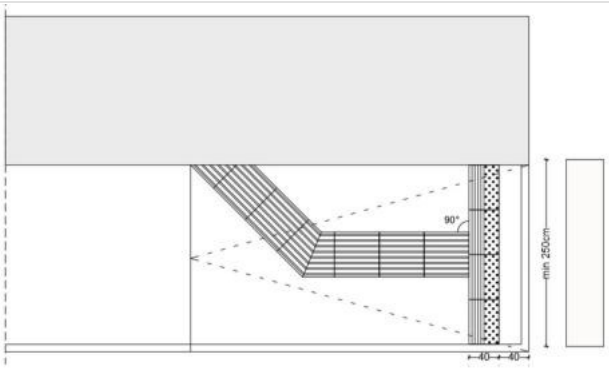

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.437 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02468**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo

406 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 34, Udine	1	E 00FF5-02469

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	13	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02470	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 34, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

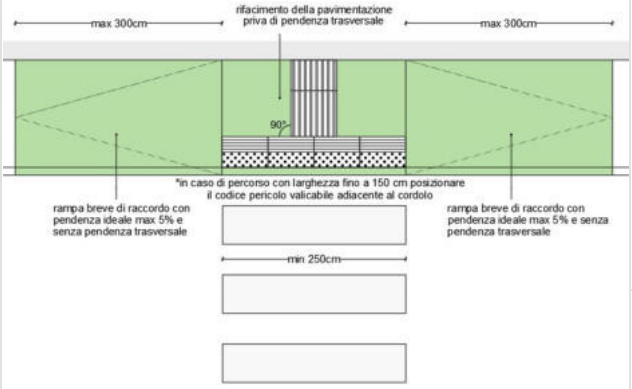

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.257 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02470**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02469	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 34, Udine	Costo stimato **4257 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

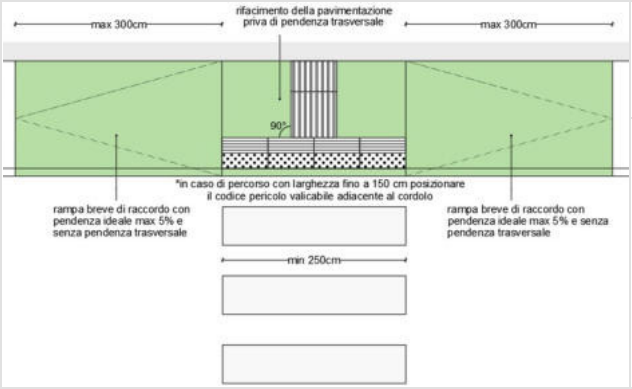

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02469.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02471**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **26 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02473**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02474	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 34, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

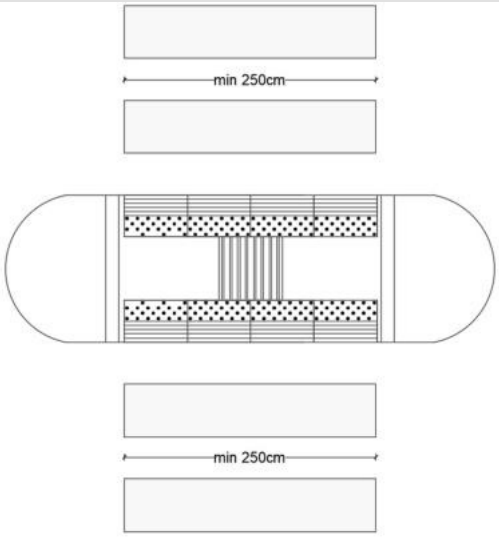

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02474**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02473	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 34, Udine	Costo stimato **561 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

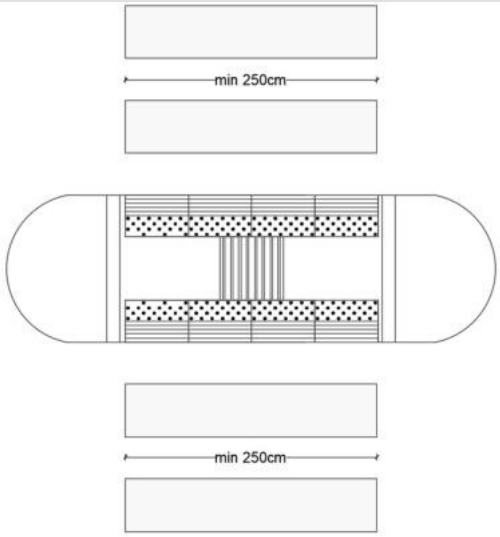

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02473.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02475**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **29 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02602**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02604	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo di Giusto 29, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

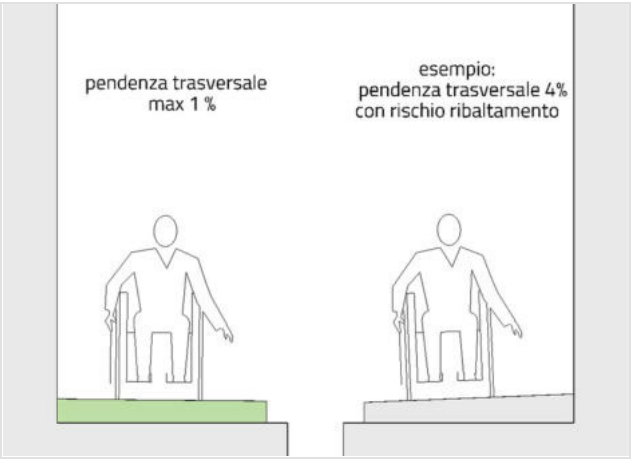

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

11.050 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02603**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 5500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

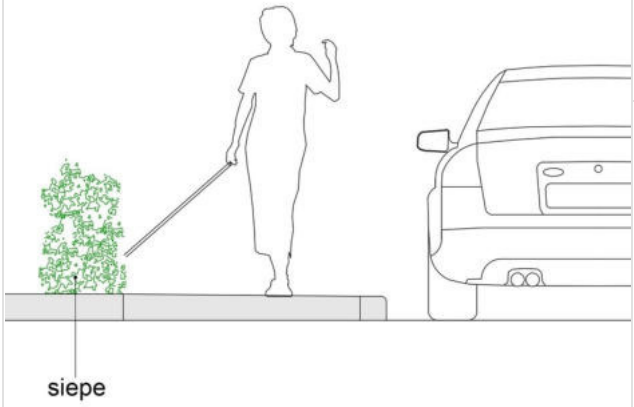

PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di guida naturale

6.160 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02604**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02602	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo di Giusto 29, Udine	**11050 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

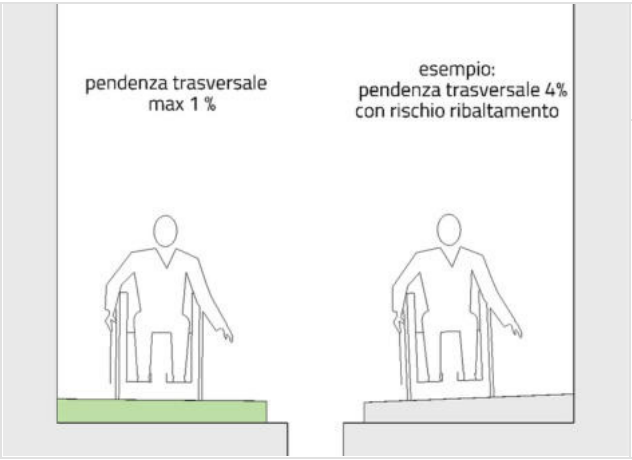

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02602.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **23 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Via Riccardo Di Giusto 29, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02605

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02606	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

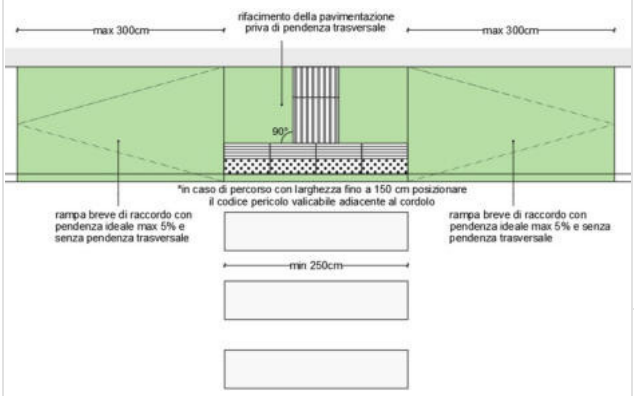

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.595 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02606**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02605	**1**	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	**4595 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

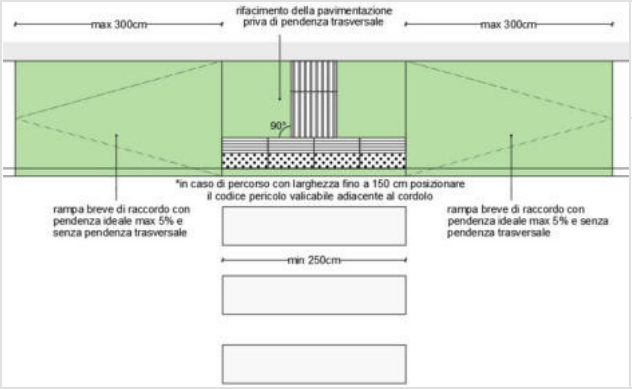

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02605.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02607**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 595,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **53 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02608**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione su isola di traffico riguardante l'attraversamento pedonale. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02609	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02610	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

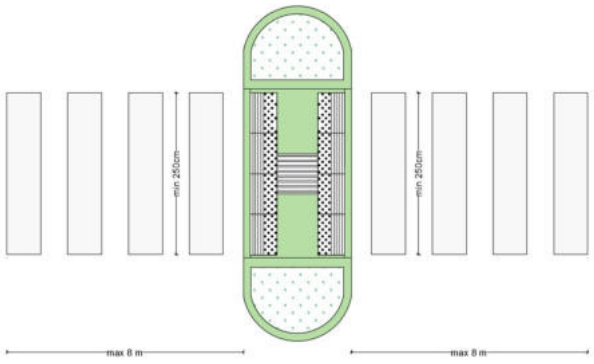

(modificato)
Abbassamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Demolizione di marciapiede e realizzazione pavimentazione a raso che colleghi i due attraversamenti su isola pedonale, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare e raccordo

5.283 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02609**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02608	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato **5283 €**
E 00FF5-02610	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

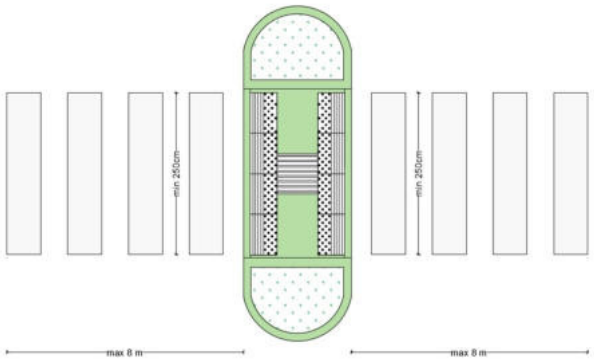

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02608.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	1	E 00FF5-02610

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		
E 00FF5-02608	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato 5283 €
E 00FF5-02609	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 29, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

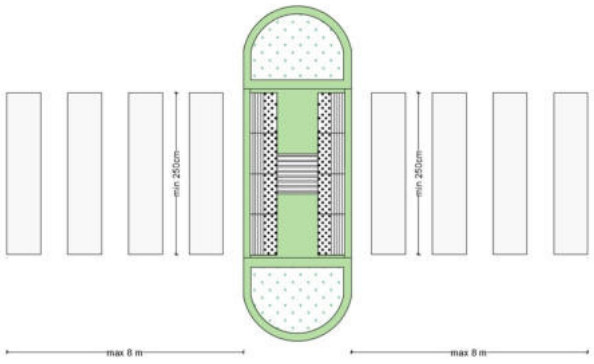

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02609.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02611**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **53 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 29, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02612**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione su percorso esistente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

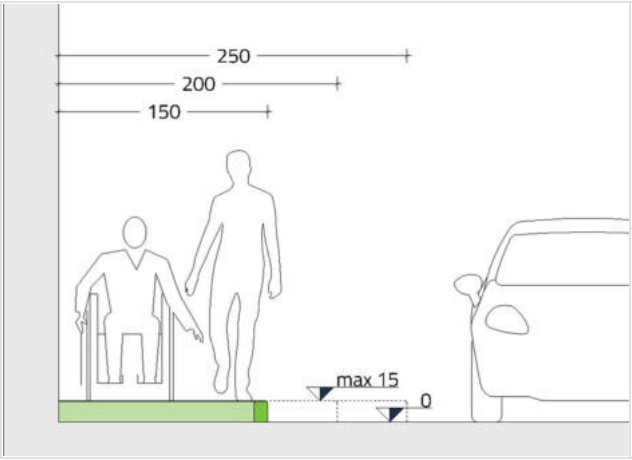

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 200 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **9.649 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02620**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 163,00 cm	Y 5500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02621	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo di Giusto 31, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

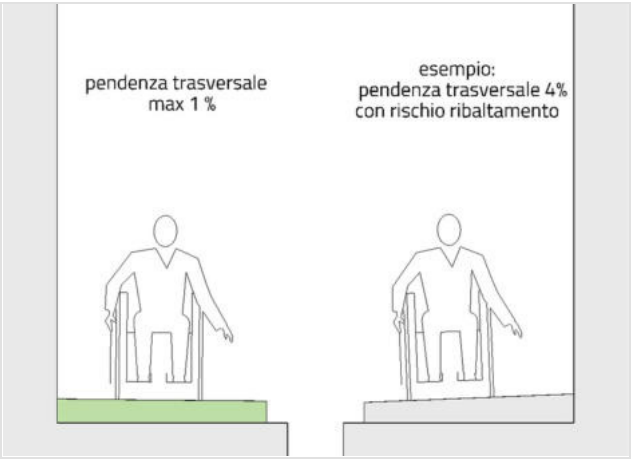

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.314 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02621**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 163,00 cm	Y 5500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02620	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo di Giusto 31, Udine	**1314 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

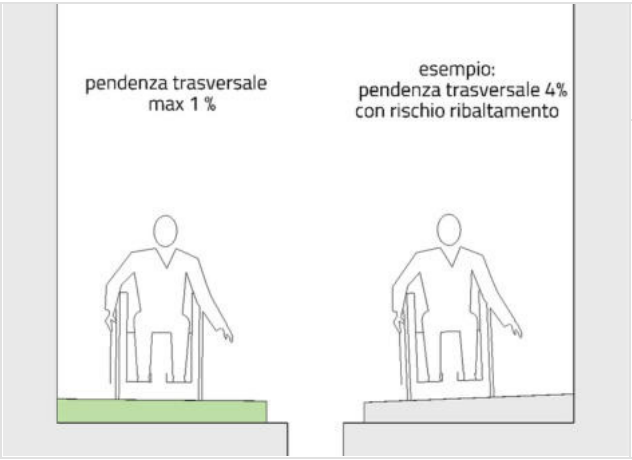

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02620.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo di Giusto 31, Udine	2	E 00FF5-02622

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Demolizione della pavimentazione con pendenza trasversale

Demolizione della pavimentazione con pendenza trasversale e realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'esistente.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

4.257 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02623**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

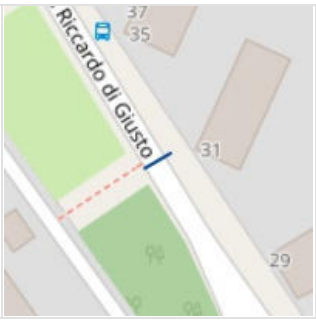

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **79 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02624**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

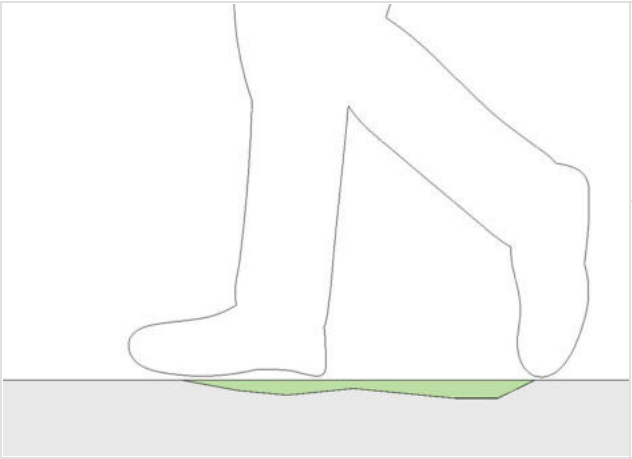

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

281 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02625**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del palo in quanto privo di funzione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo **182 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 35, 33100 Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02626**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

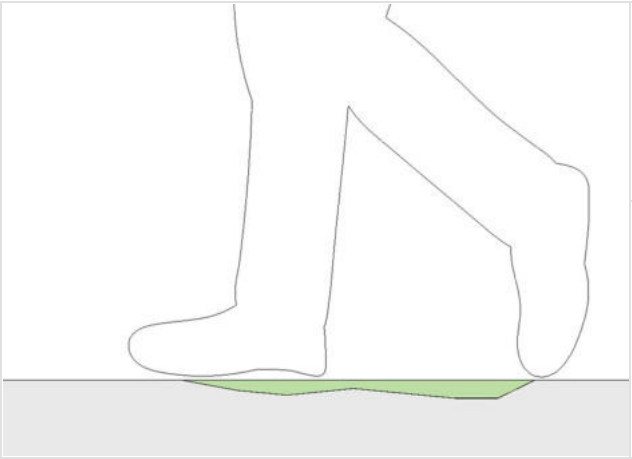

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **687 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02627**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

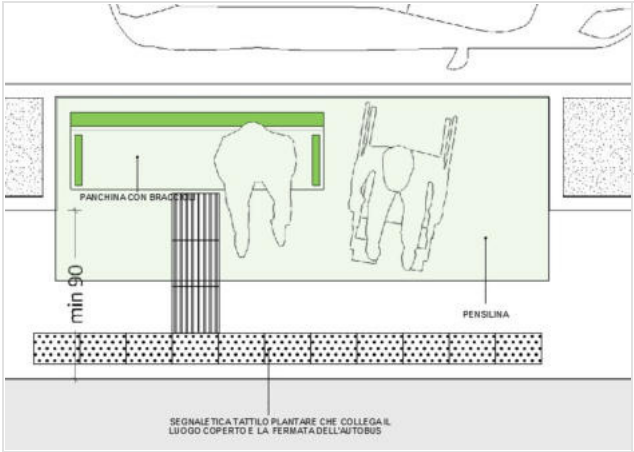

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02628**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 186 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02629	3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Riccardo Di Giusto 35, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

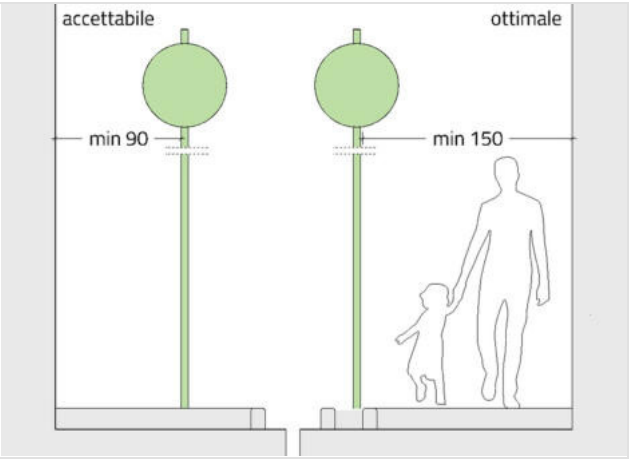

(modificato)
Spostamento del palo

Rimozione del palo di segnaletica verticale con cestino e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 35, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02629**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 48 cm. Altezza del cestino di 47 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02628	LIV. **3**	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Riccardo Di Giusto 35, Udine	Costo stimato **182 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

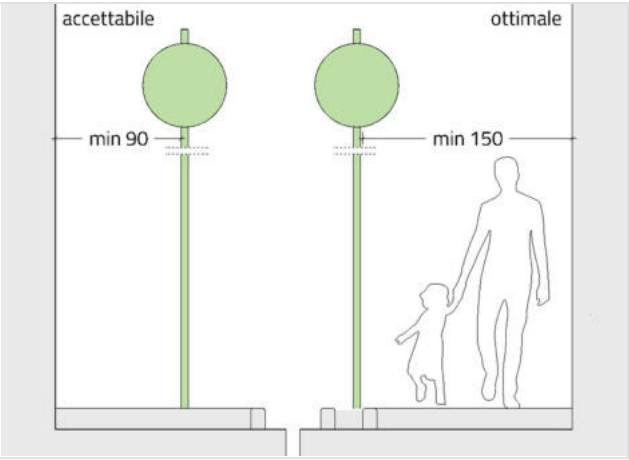

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02628.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02630**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

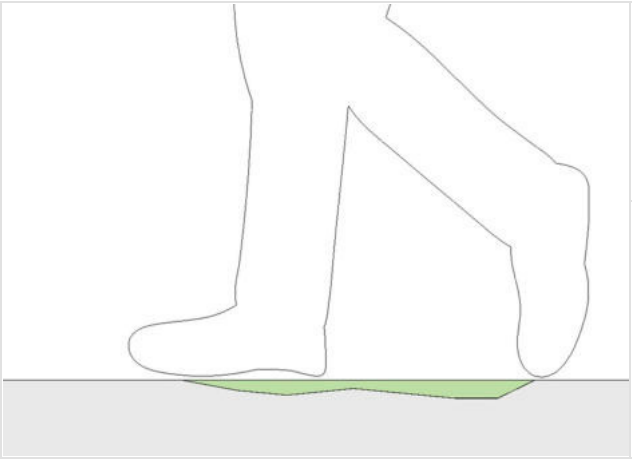

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **866 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02631**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

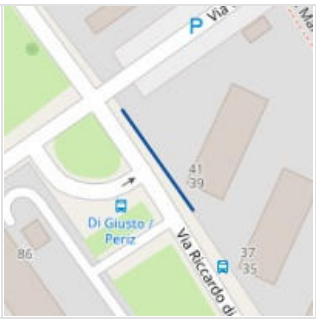

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

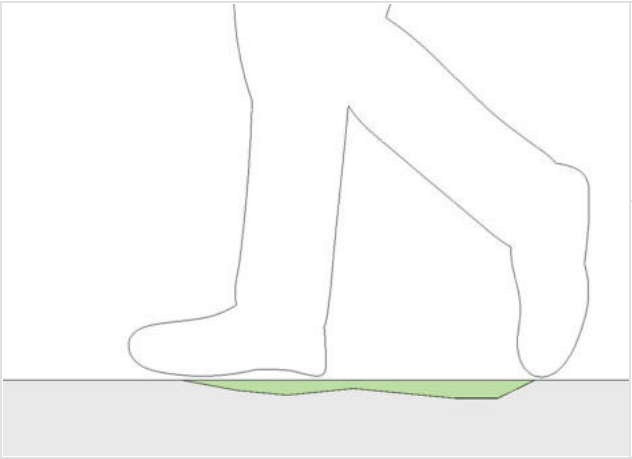

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

16.273 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02632**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

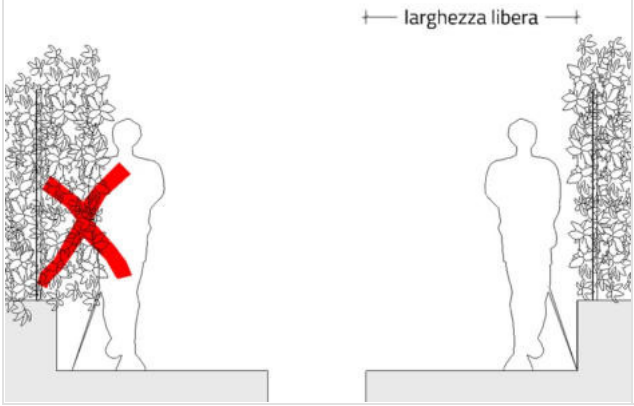

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

230 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02633**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 590 cm. Larghezza del marciapiede di 620 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

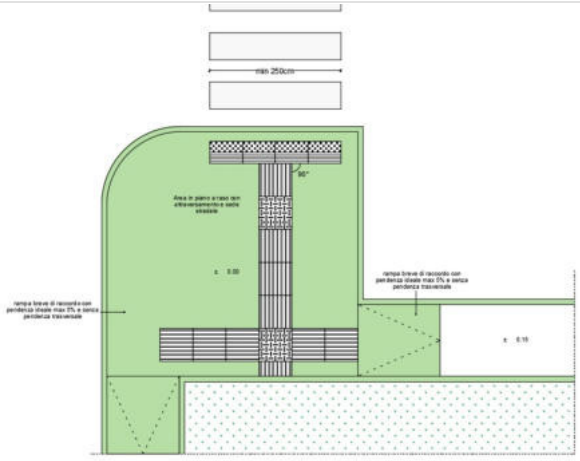

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe longitudinali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02634).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

10.332 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **23 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Via Riccardo di Giusto 39, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02634

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 590 cm. Larghezza del marciapiede di 350 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

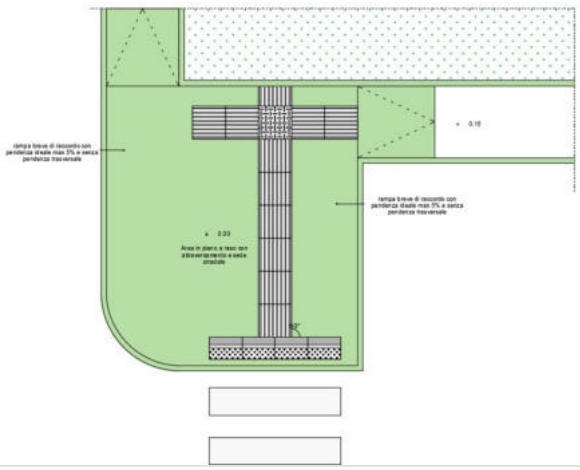

(modificato)
Realizzazione di rampe longitudinali per attraversamento pedonale

Eliminazione dell'aiuola esistente che crea ostacolo lungo il percorso pedonale per le persone con disabilità visiva. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe longitudinale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02633).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

9.091 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02638**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di panchina con braccioli. Pensilina danneggiata. Segnaletica tattilo plantare non idonea (non conduce né alla seduta, né alla palina).

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

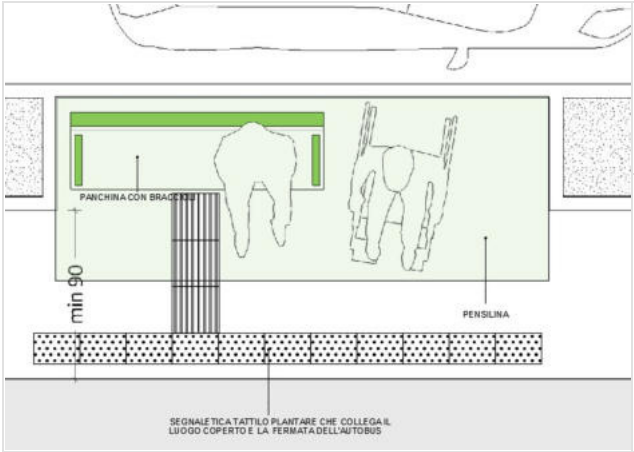

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, rifacimento della pensilina danneggiata e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.236 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02639**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

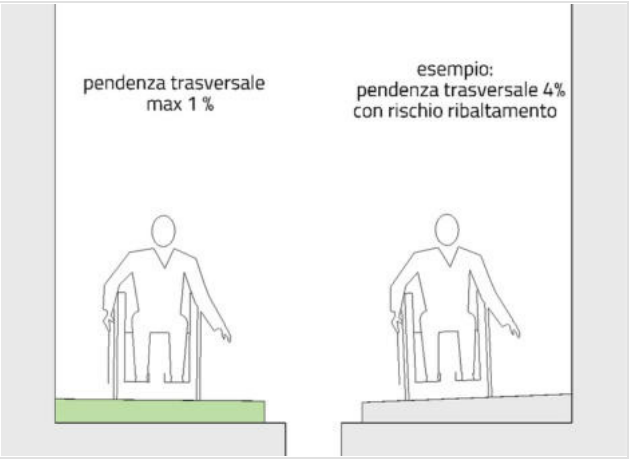

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso — **3.398 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 41, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02640**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

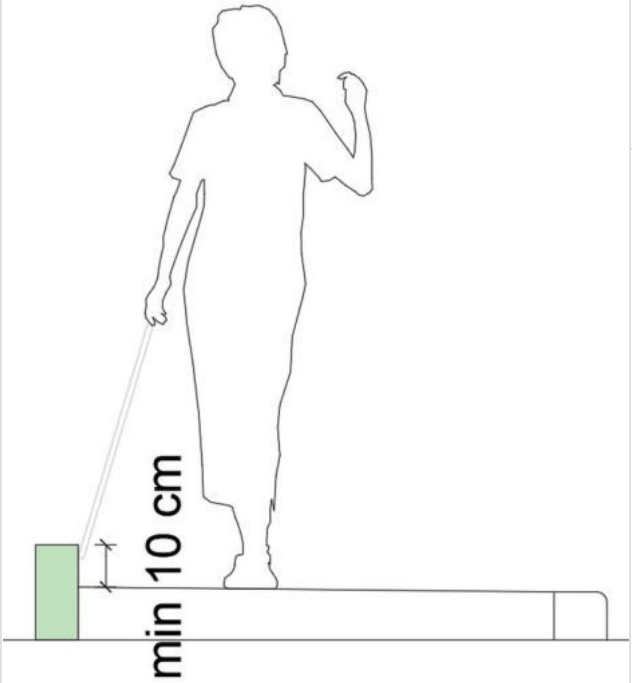

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.456 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02641**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 180,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02642	LIV. 2	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato **4929 €**
E 00FF5-02643	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02642.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02642**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02641	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02643	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Realizzazione di pavimentazione in piano

Realizzazione di pavimentazione in piano in continuità con pavimentazione esistente (porfido a cubetti) in quanto accesso carraio con passaggio pedonale su strada. Realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max 5% (8% ove non è possibile) per eliminare i dislivelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con rampe longitudinali **4.929 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02643**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02642	LIV. 2	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato **4929 €**
E 00FF5-02641	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02642.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02644**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02645	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

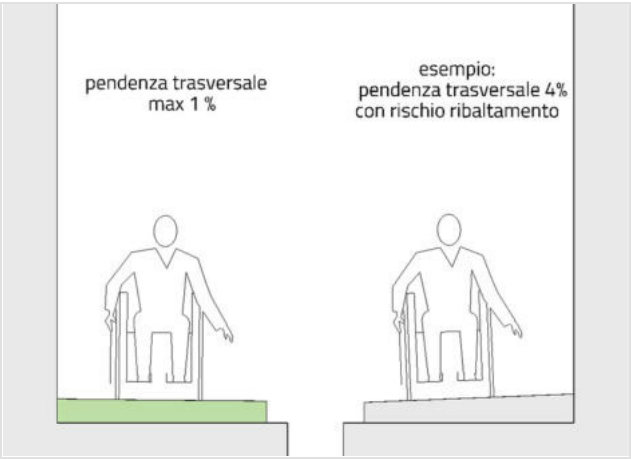

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.104 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02645**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02644	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 39, Udine	Costo stimato **13104 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

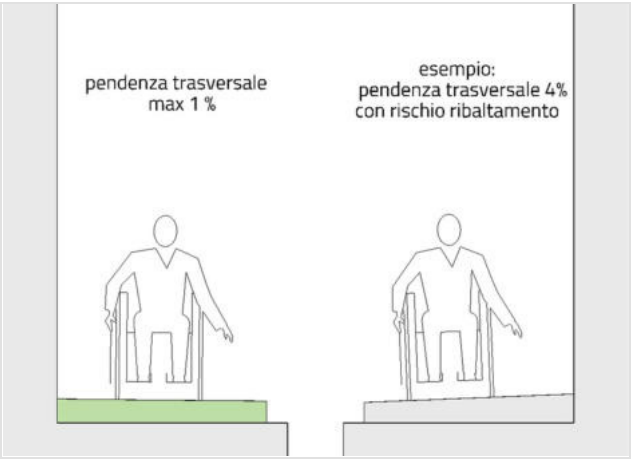

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02644.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 39, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02646**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

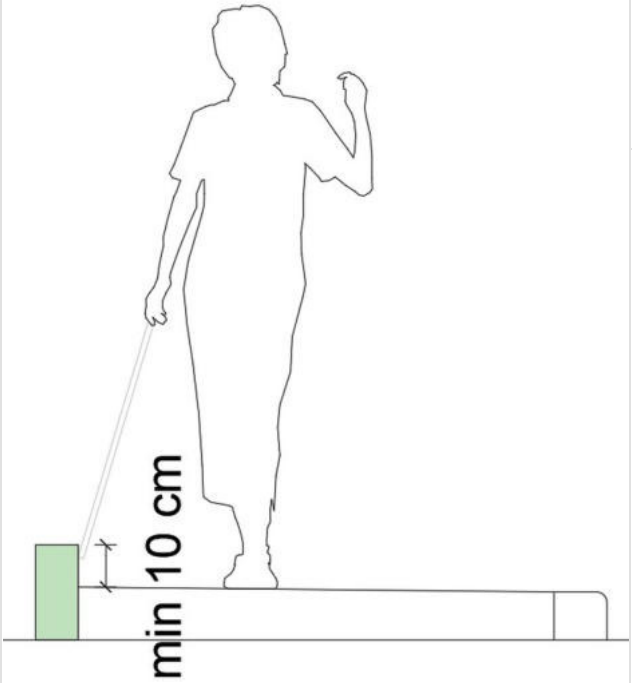

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.842 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02647**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

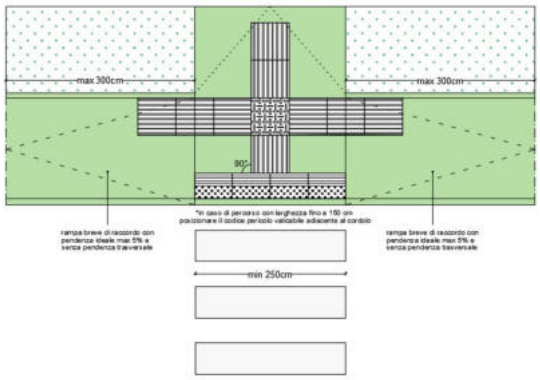

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare già esistente e conforme all'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.425 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	2	E 00FF5-02648

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 9700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02651	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

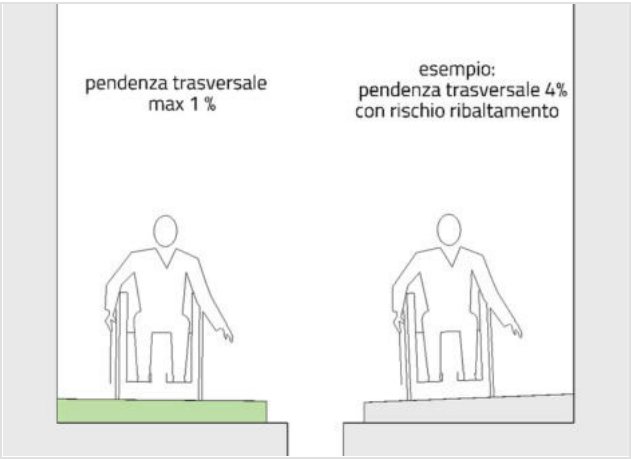

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

27.782 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02649**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02650	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02653	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02654	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

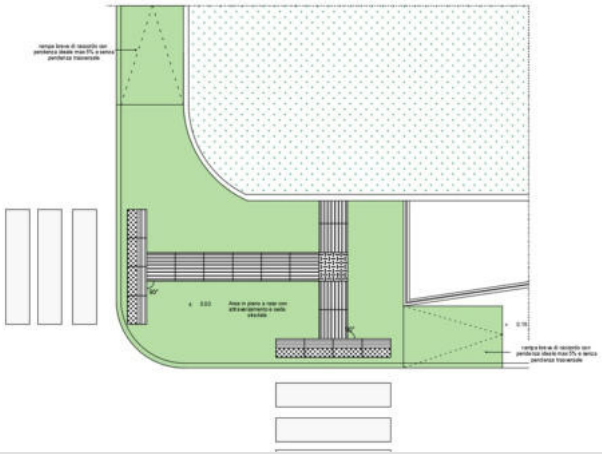

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

17.653 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02650**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02649	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato **17653 €**
E 00FF5-02654	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02653	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

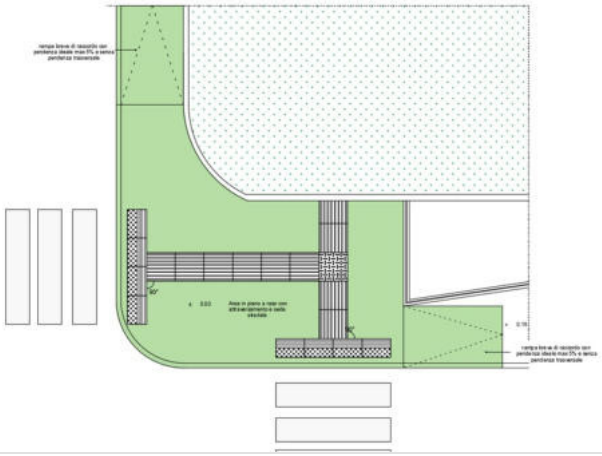

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02649.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02651**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 9700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02648	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato **27782 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

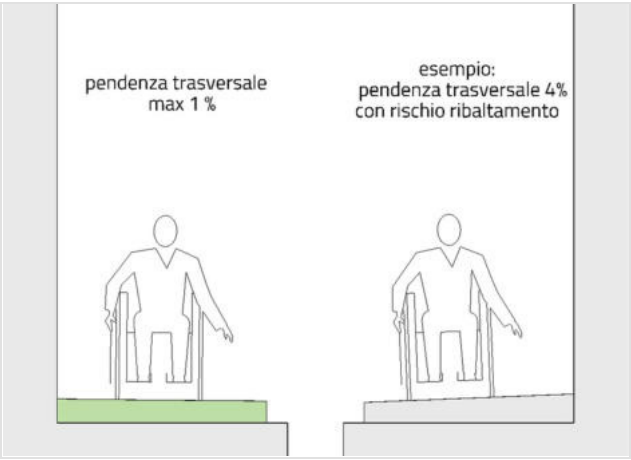

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02648.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02652**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 9700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

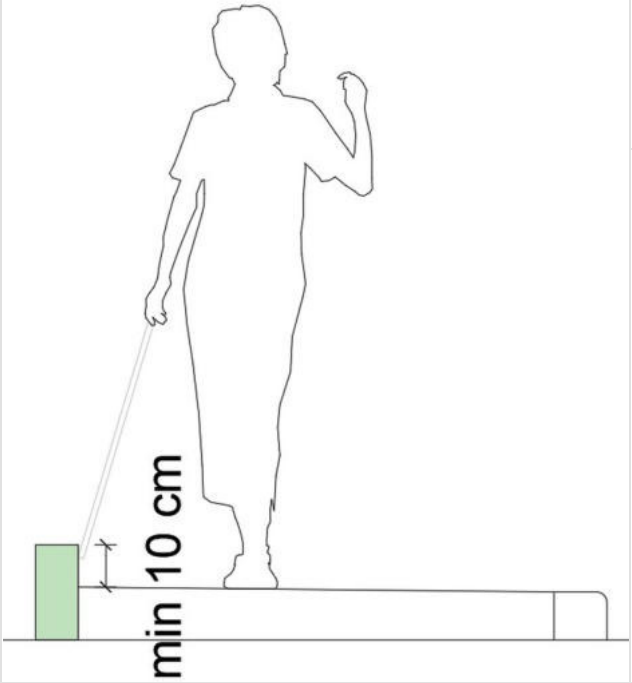

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

4.155 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **23 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Via Riccardo Di Giusto 31, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02653

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02649	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato **17653 €**
E 00FF5-02654	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02650	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

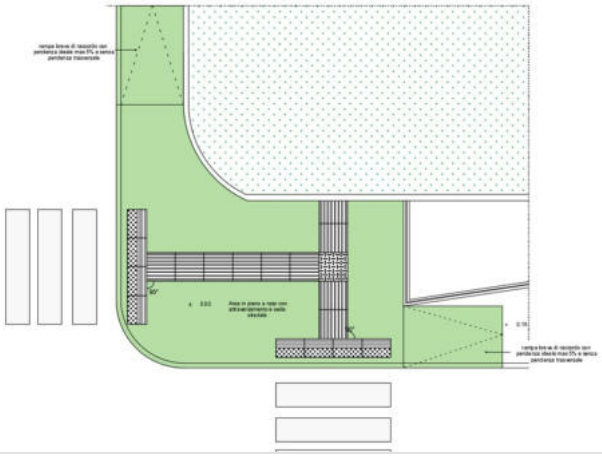

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02649.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02654**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02649	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato **17653 €**
E 00FF5-02653	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 31, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02650	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

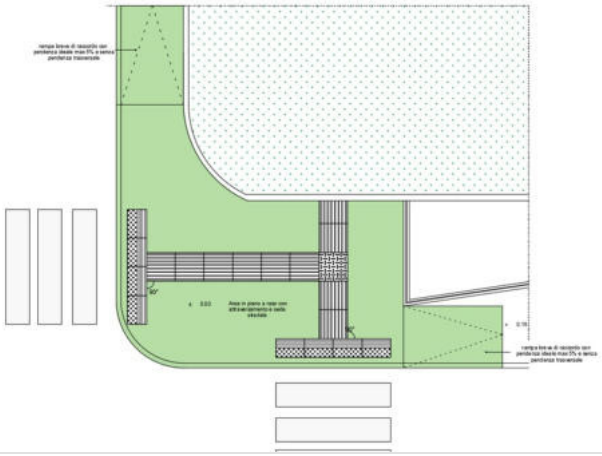

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02649.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 31, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02655**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **49 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02656**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 210,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02657	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

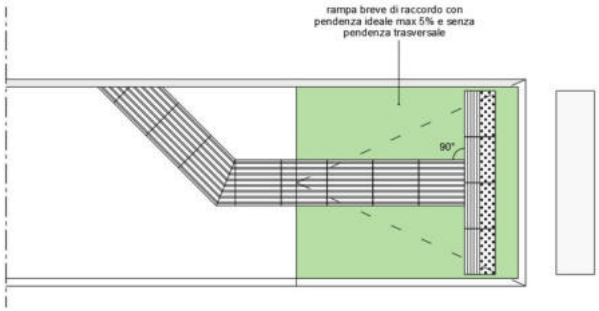

(modificato)
Realizzazione di rampa di raccordo e posa di segnaletica tattilo-plantare

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.
Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.772 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02657**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02656	**1**	**Altezza Dislivello** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	**2772 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

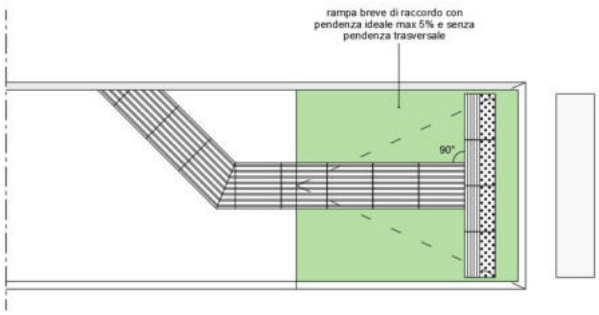

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02656.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02658**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02659	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

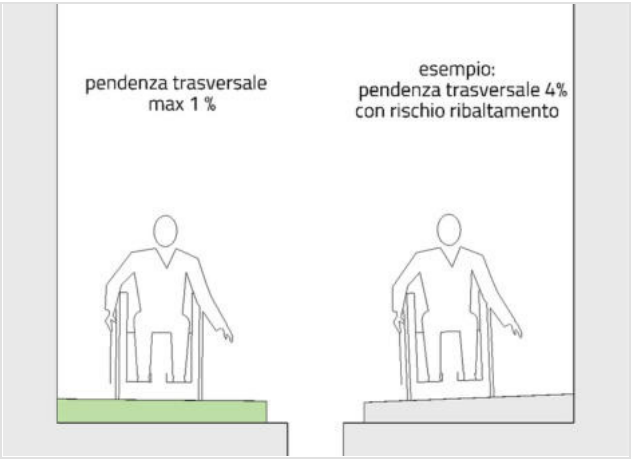

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

14.896 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02659**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02658	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Riccardo Di Giusto 90, Udine	Costo stimato **14896 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

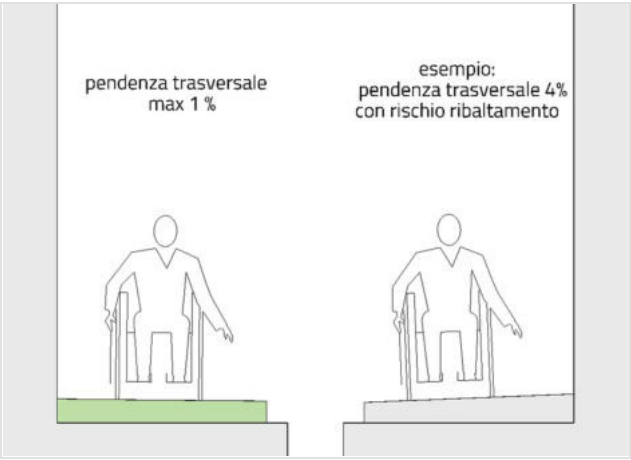

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02658.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo Di Giusto 90, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02660**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4900,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

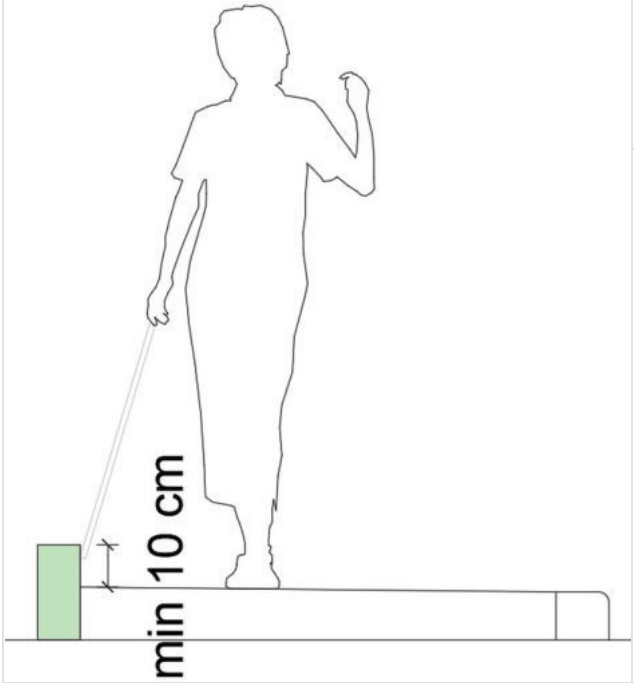

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

2.099 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Riccardo di Giusto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **15 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Via Riccardo di Giusto 82, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03433**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Altro	Si	
Dimensioni	X --	Y 3800,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Tabelloni pubblicitari che ostacolano il passaggio.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0675 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione degli elementi.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento — **886 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02476**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 185 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

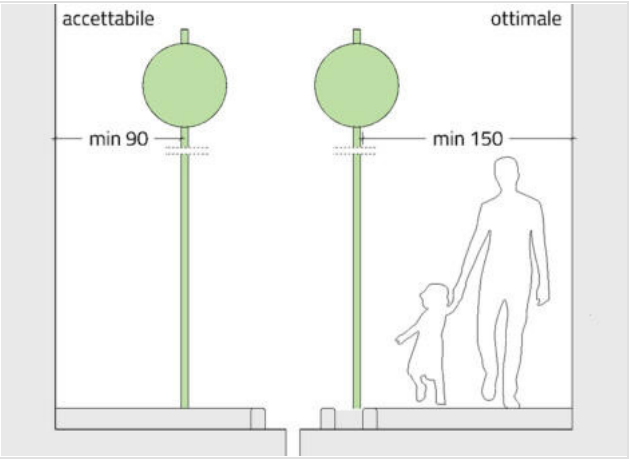

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02477**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 207 cm

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

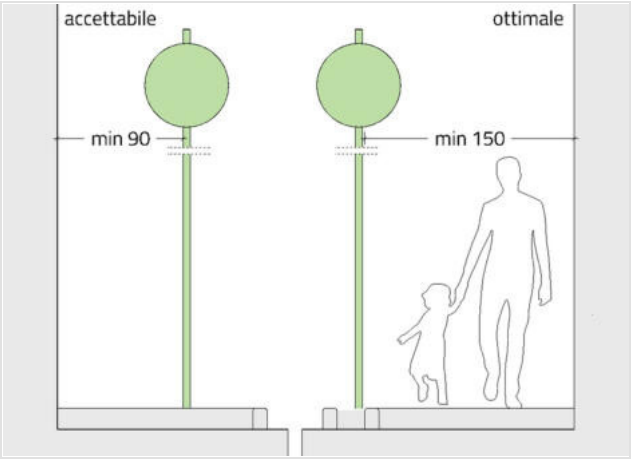

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02478**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione dell'elemento **928 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02479**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

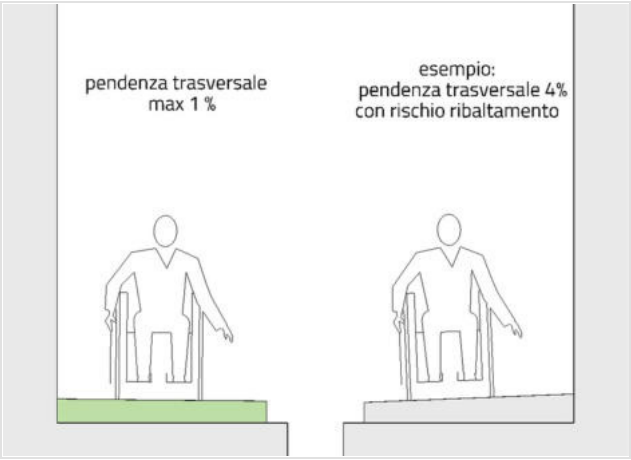

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.881 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02480**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

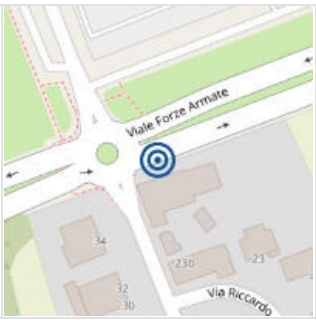

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 95,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

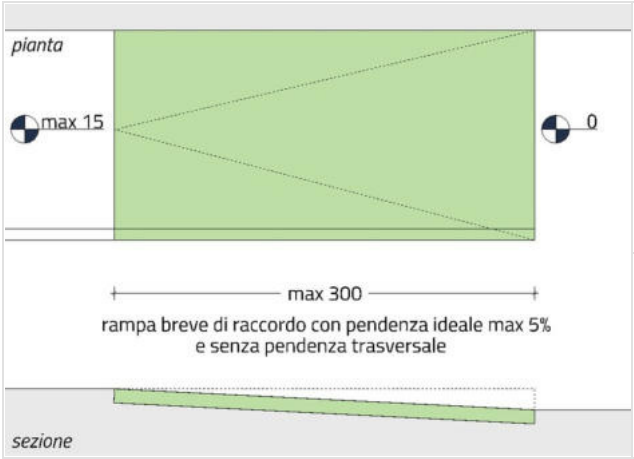

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.302 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02481**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

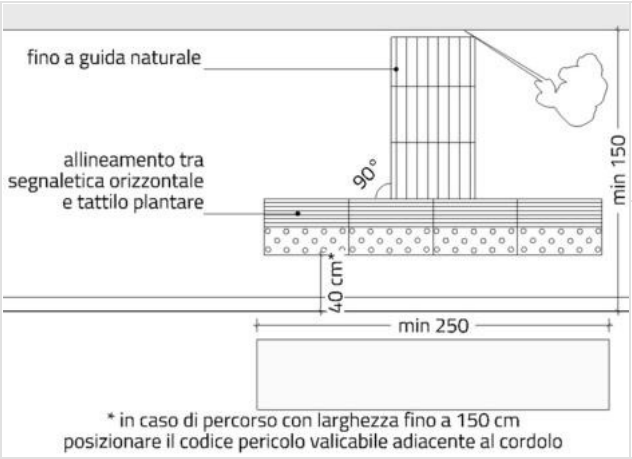

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.654 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02482**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

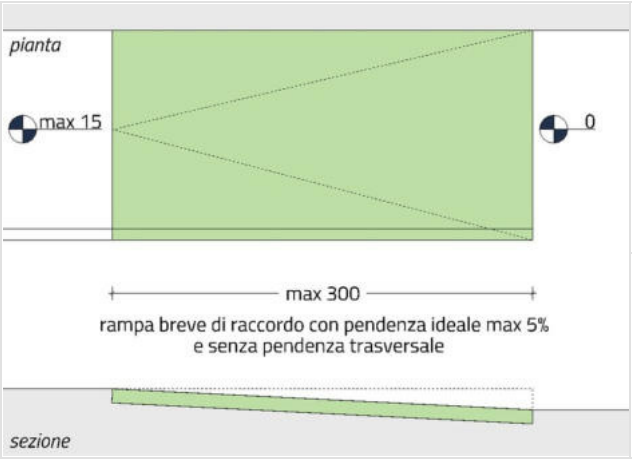

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.302 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02483**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

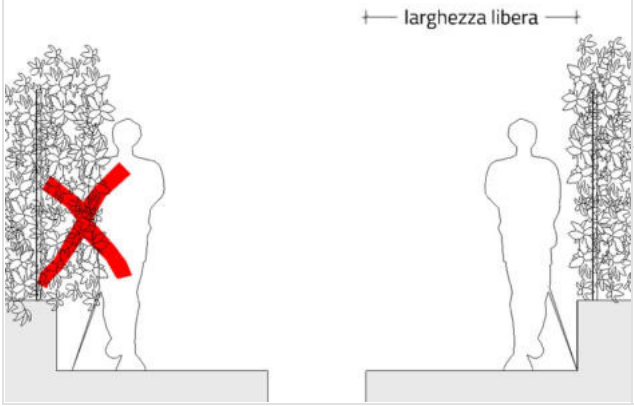

P0647 (modificato)
Sollecito al privato/ente terzo per la potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **94 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02484**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02485	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

594 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02485**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02484	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **594 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02484.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02486**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02487	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

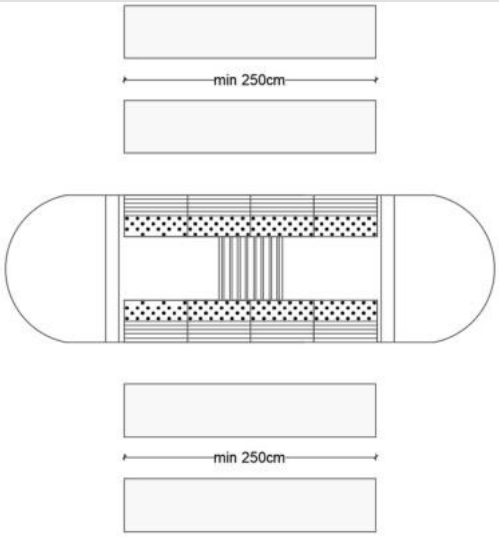

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.029 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02487**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02486	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	**1029 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

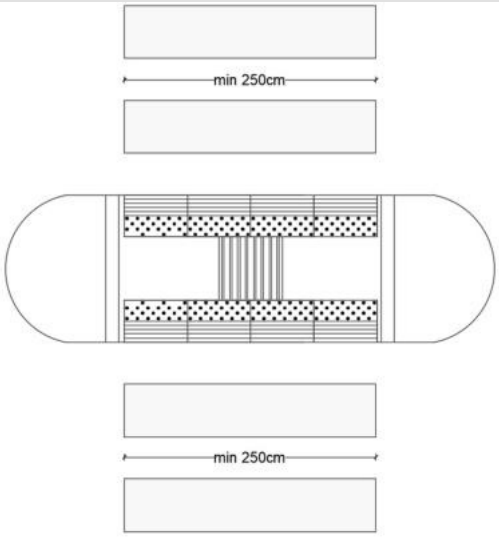

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02486.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02488**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA ORIZZONTALE**

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02489	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

404 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02489**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02488	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **404 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02489.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02490**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02457	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	Costo stimato **12962 €**
E 00FF5-02491	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

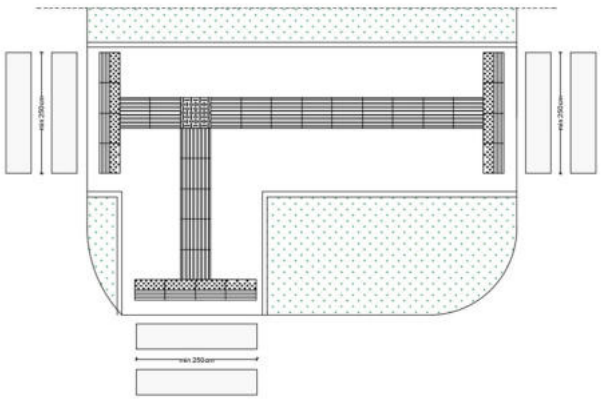

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02457.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Viale Forze Armate, Udine	1	E 00FF5-02491

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02457	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Riccardo Di Giusto 80, Udine	12962 €
E 00FF5-02490	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

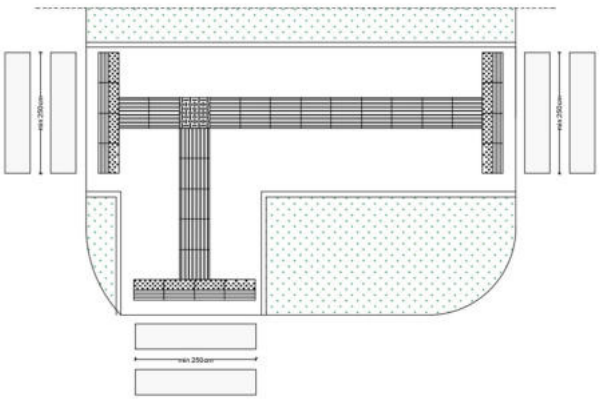

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02457.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02492**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **62 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02493**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

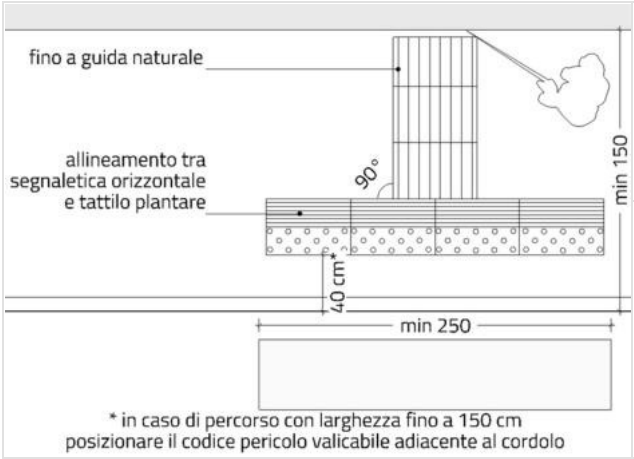

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **748 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02494**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 40000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione su area predisposta a marciapiede di larghezza attuale di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

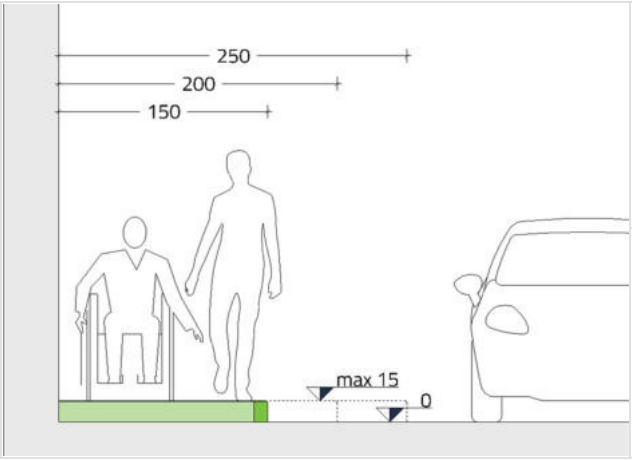

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 200 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **122.071 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02495**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

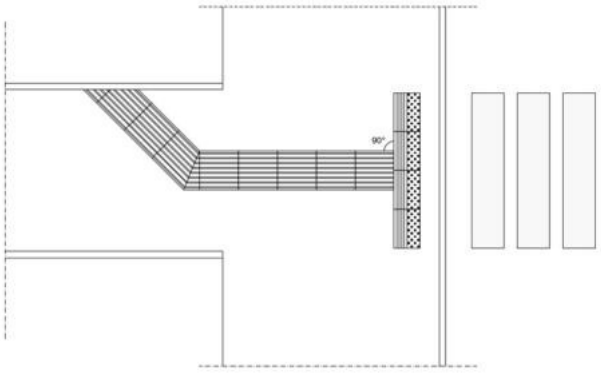

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **615 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02496**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **69 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02497**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02498	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

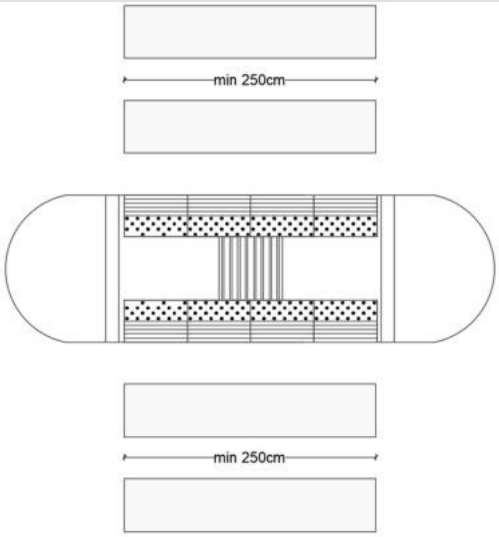

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.053 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02498**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02497	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	**1053 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

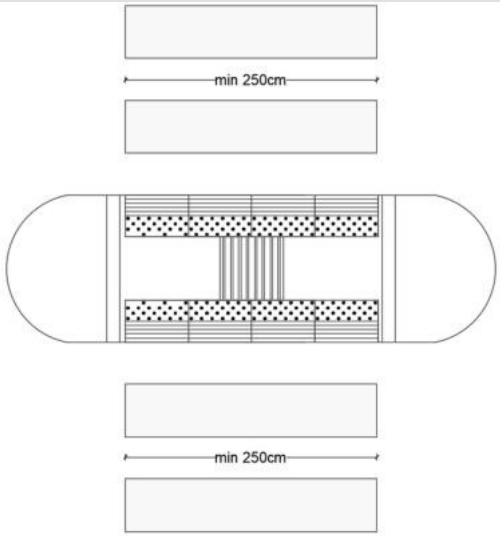

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02497.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02499**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

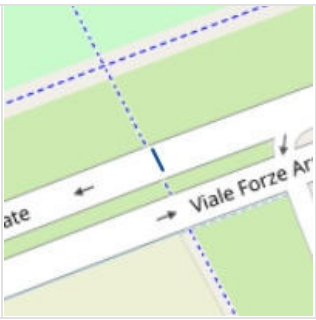

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02500	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'attraversamento pedonale compresa segnaletica

714 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02500**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

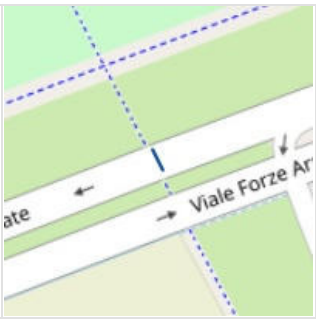

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02499	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **714 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02499.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02501**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione dell'elemento **351 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02502**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 2700,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

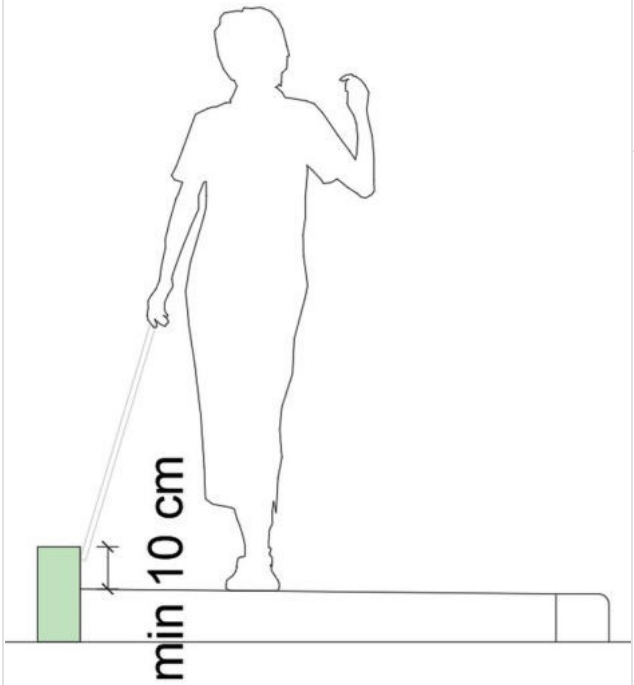

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.156 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02503**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02504	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

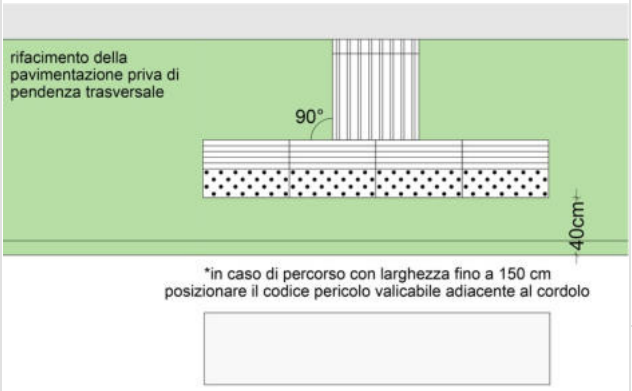

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione. Posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

2.839 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02504**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02503	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	**2839 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

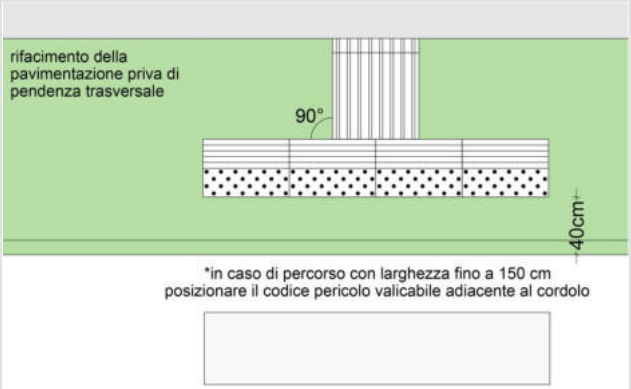

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02503.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 06 Ottobre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02505**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo	Si	
Dimensioni	X 6,00 cm	Y 6,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletto parapedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02506	**2**	**Palo Ostacolo verticale** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto parapedonale che si trova in posizione centrale all'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo **363 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02506**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo	Si	
Dimensioni	X 6,00 cm	Y 6,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletto parapedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02505	**2**	**Palo Ostacolo verticale** Viale Forze Armate, Udine	**363 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02505.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02507**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **66 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02508**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02509	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

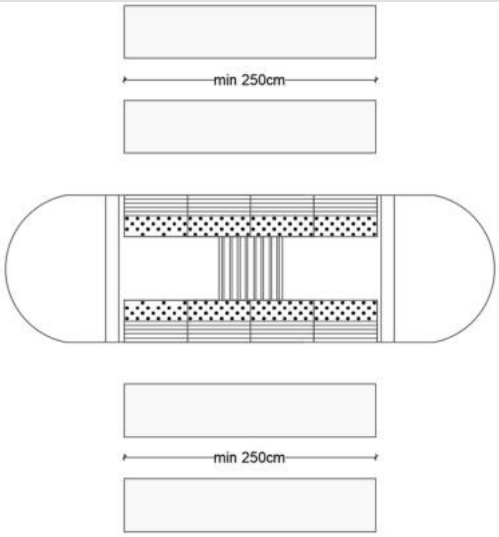

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" su isola pedonale realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **790 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **18 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Forze Armate, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02509

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02508	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato 790 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

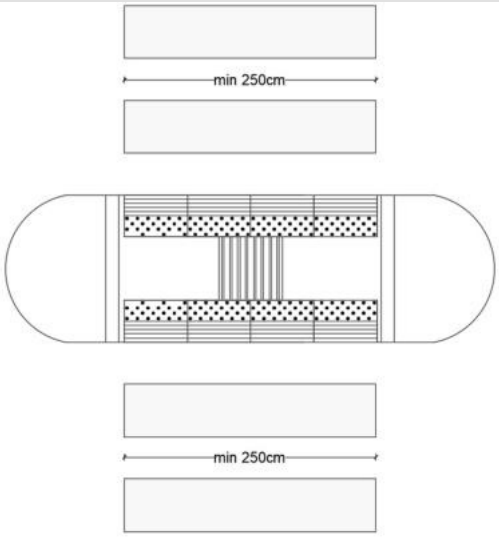

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02508.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02510**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **67 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02511**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

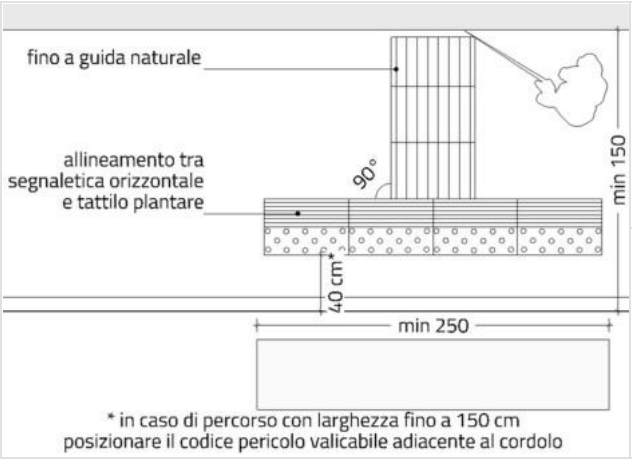

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Attualmente è assente la pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **439 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02512**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5600,00 cm
Materiale	Terra compattata	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione su porzione di marciapiede già presente di larghezza 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

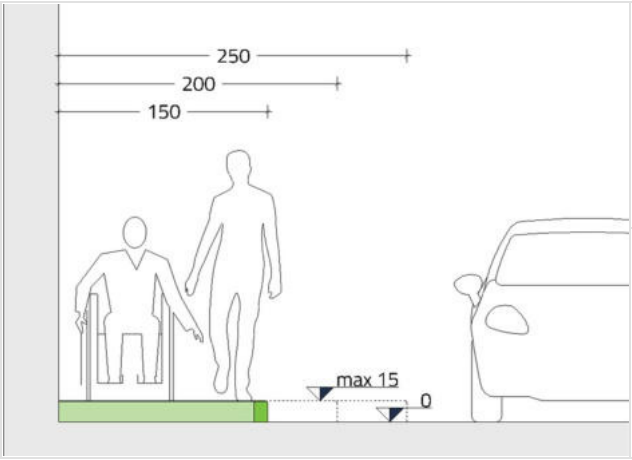

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 200 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **17.037 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Viale Forze Armate, Udine	1	E 00FF5-02513

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 920 cm. Larghezza della porzione di terra adibita a futuro marciapiede di 200 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

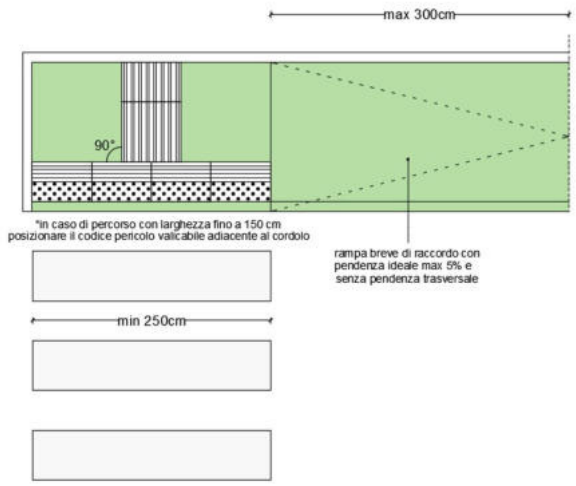

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02514)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.553 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Viale Forze Armate, Udine	1	E 00FF5-02514

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 920 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm e lunghezza (per segnaletica tattilo plantare) di 550 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

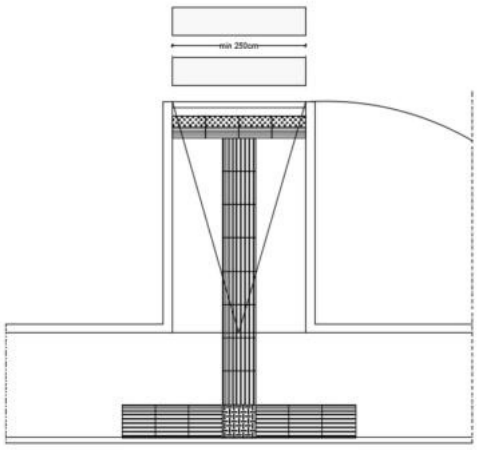

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare per nuovo attraversamento

Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02513)

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.048 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02515**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 20500,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

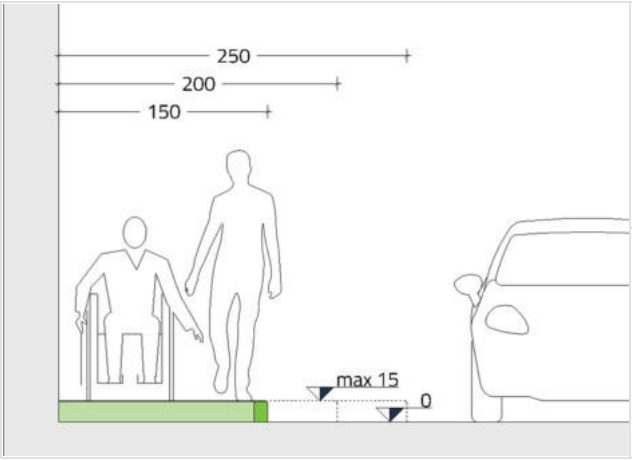

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 200 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

47.073 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02516**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

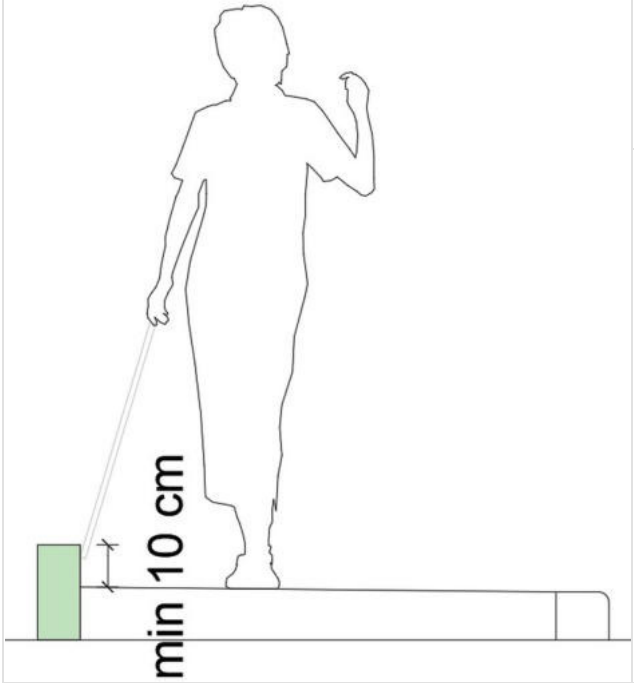

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

428 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02517**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02518	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area frontale alle strisce pedonali alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.719 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02518**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02517	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	3719 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02517.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02519**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **75 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **18 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Forze Armate, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02520

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si
Dimensioni	X 300,00 cm Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

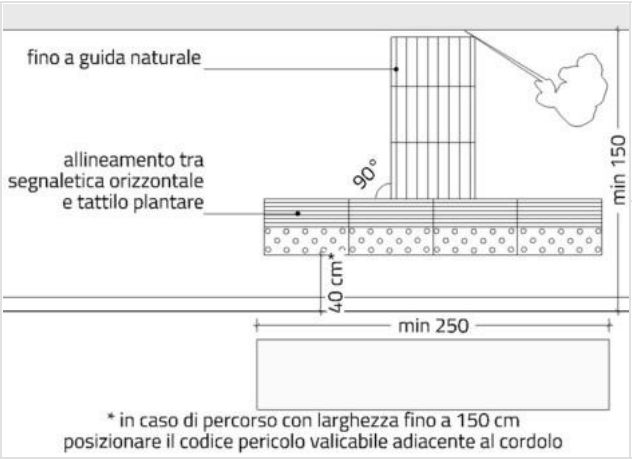

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02521**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

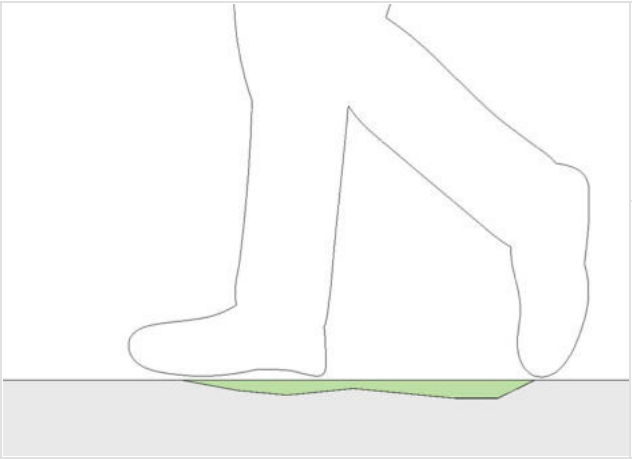

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.912 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02522**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

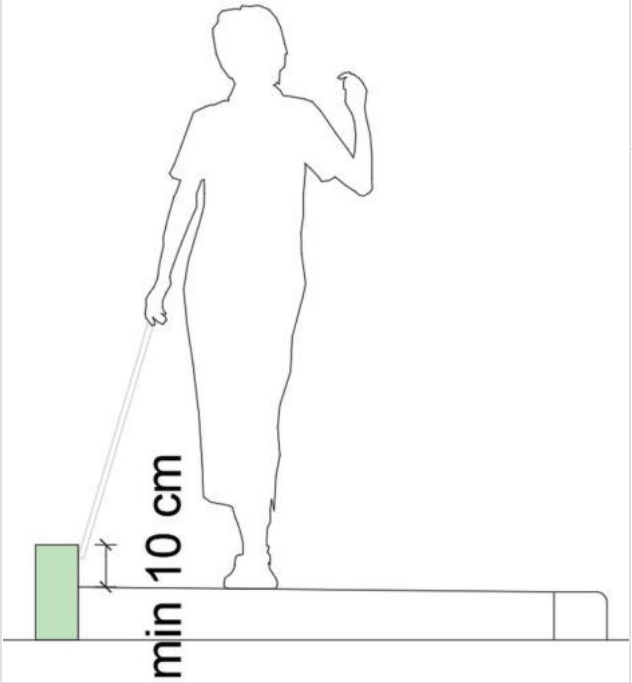

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

884 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02523**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

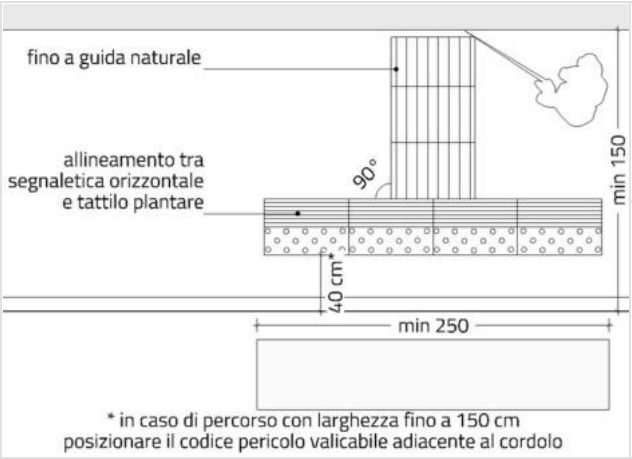

P0873 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **468 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02524**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02525	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02526	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02527	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02528	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02529	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

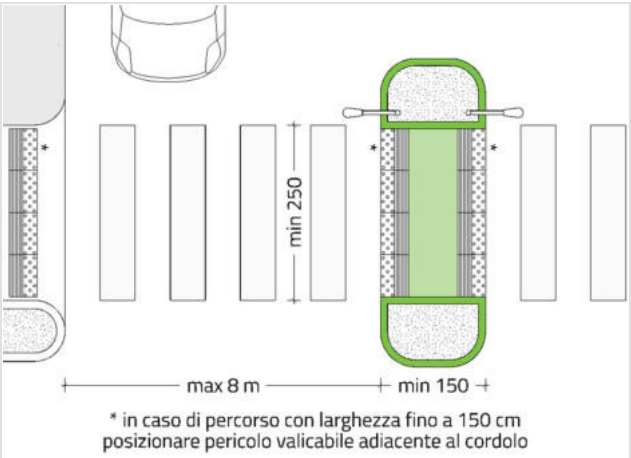

P0788 (modificato)
Ricostruzione dell'isola pedonale e riconfigurazione dell'attraversamento pedonale per mantenere la direzione ortogonale

Eliminazione di entrambi gli attraversamenti pedonali mediante cancellazione della segnaletica orizzontale non ortogonale. Spostamento dell'isola pedonale in posizione frontale rispetto al lato opposto della strada, realizzazione della pavimentazione e posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento dell'isola pedonale compresa segnaletica tattilo-plantare

5.778 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **18 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Forze Armate, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02525

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA ORIZZONTALE**

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02524	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **5778 €**
E 00FF5-02526	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02527	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02528	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02529	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

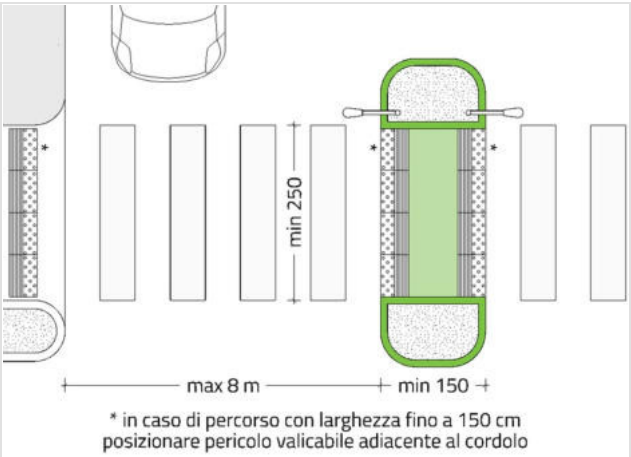

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02526**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02524	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **5778 €**
E 00FF5-02525	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02527	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02528	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02529	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

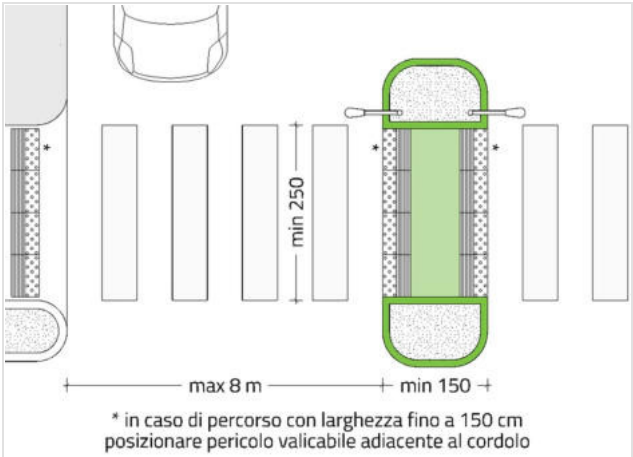

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02527**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02524	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **5778 €**
E 00FF5-02525	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02526	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02528	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02529	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

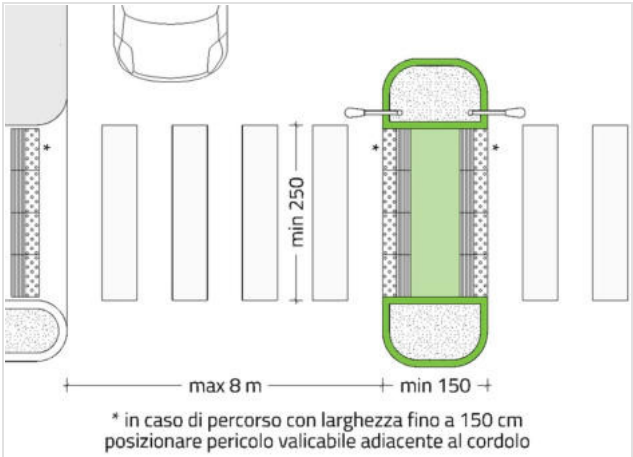

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02528**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02524	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **5778 €**
E 00FF5-02525	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02526	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02527	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02529	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

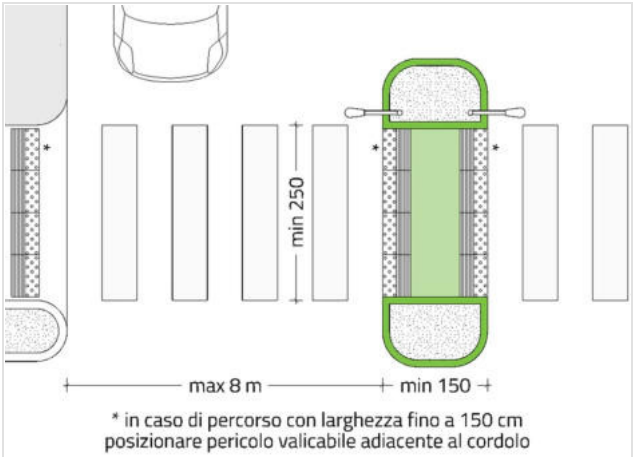

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 08 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02529**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02524	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **5778 €**
E 00FF5-02525	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02526	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02527	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02528	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

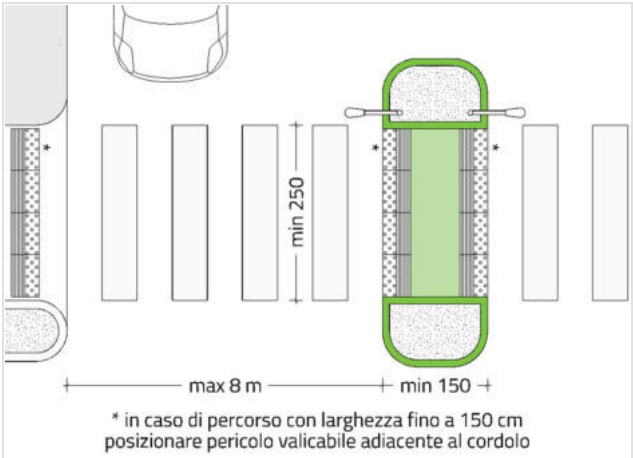

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02524.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02530**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina e di panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

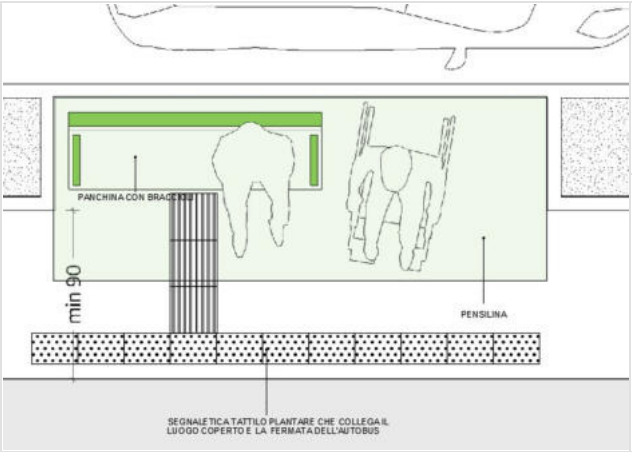

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate 8, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02531**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina e di panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

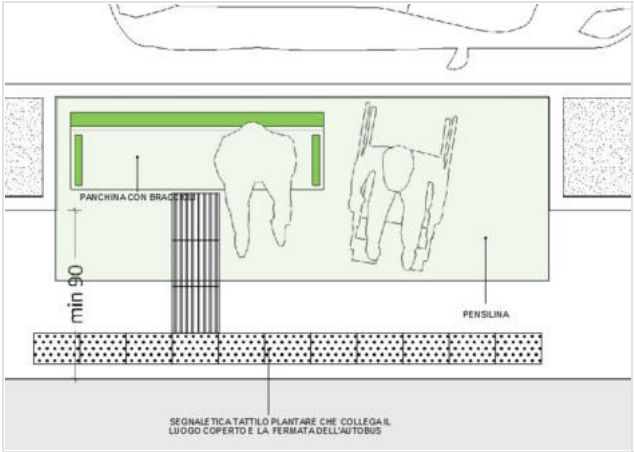

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02532**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02533	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	**13247 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02533.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Viale Forze Armate, Udine	1	E 00FF5-02533

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02532	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e pendenze dovute all'attraversamento pedonale

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 200 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la presenza di un' attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

13.247 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Viale Forze Armate, Udine	1	E 00FF5-02534

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 650 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02535).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.885 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02535**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 650 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02534).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.791 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02536**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 47000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

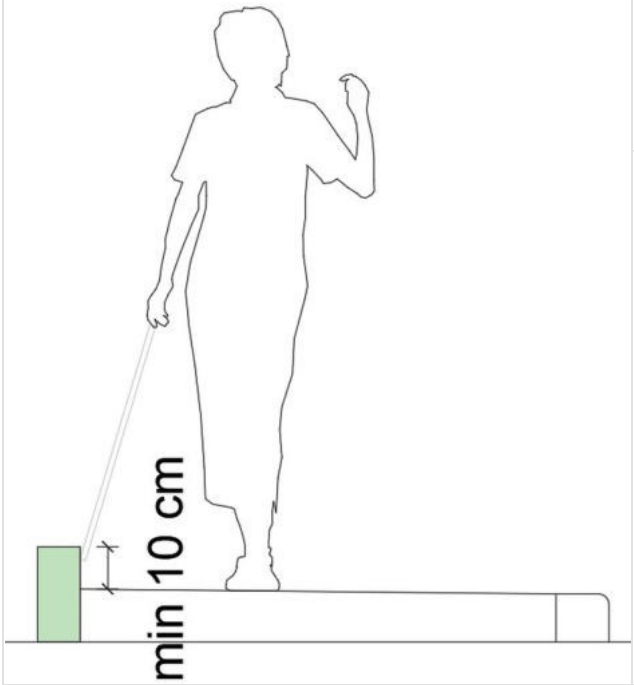

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

20.130 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02537**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

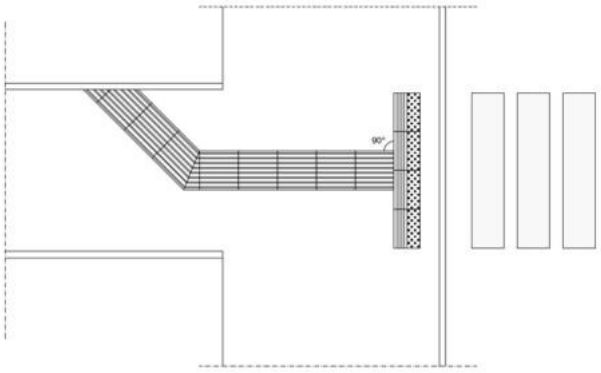

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **2.107 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02538**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

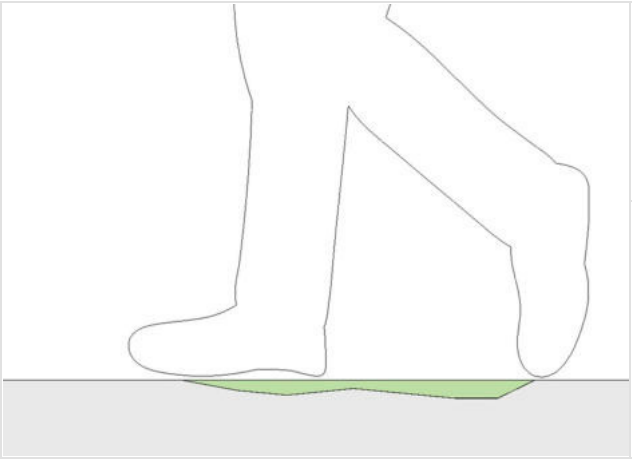

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

561 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02539**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletto parapedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Eliminazione del palo

Eliminazione del paletto parapedonale che si trova in posizione centrale all'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo

182 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02540**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 30000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

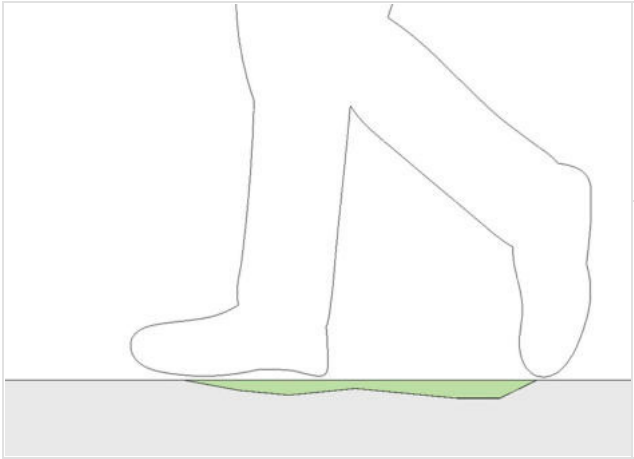

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

11.162 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02541**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 380,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02542	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Forze Armate, Udine	Costo stimato **1663 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

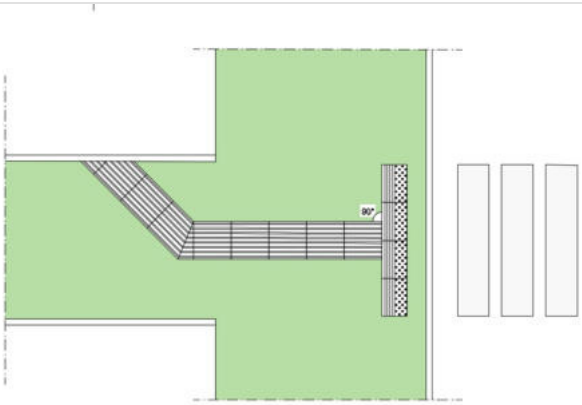

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02542.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02542**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02541	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Forze Armate, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

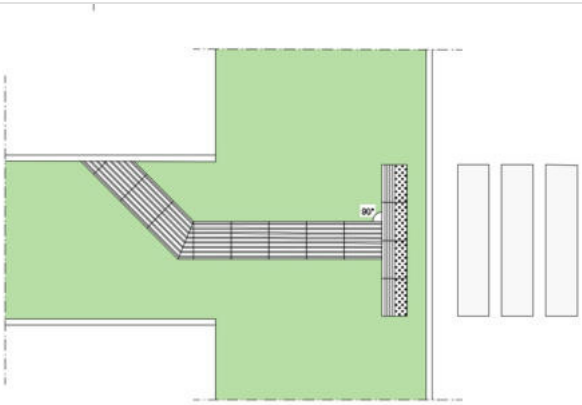

(modificato)
Riparazione della pavimentazione e posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

1.663 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale Forze Armate

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Forze Armate, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02543**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **79 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02544**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 10000,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

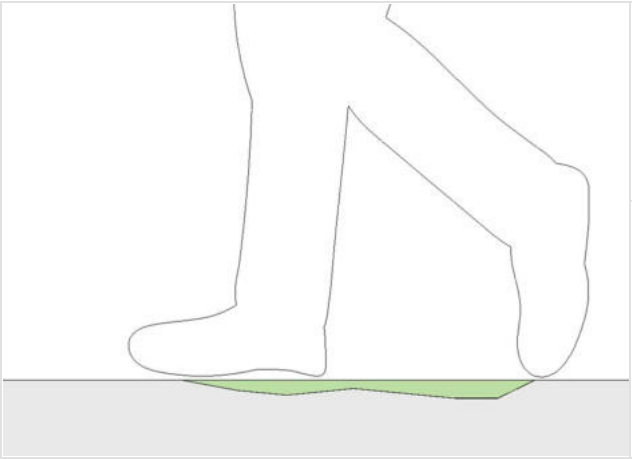

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **16.453 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02545**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

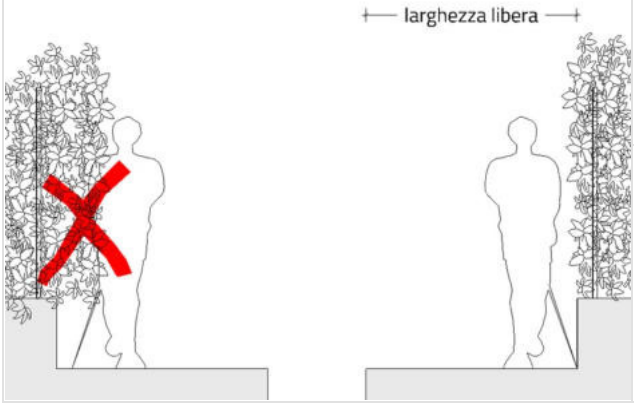

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

1.481 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02546**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02548	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

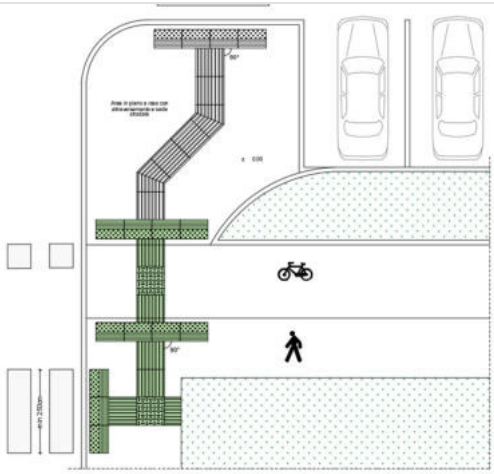

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della segnaletica orizzontale dell’attraversamento pedonale con integrazione di segnaletica per attraversamento ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.117 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02548**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02546	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato **1117 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

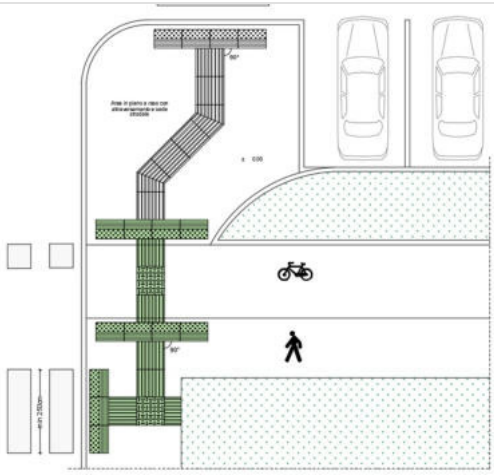

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02546.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02549**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Lunghezza	450	cm
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02550	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03434	LIV. 2	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato 826 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

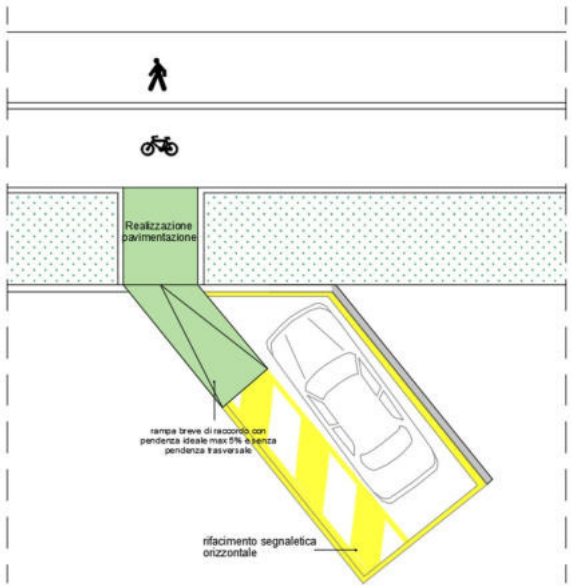

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03434.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02550**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02549	LIV. 2	**Lunghezza Stallo riservato** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03434	LIV. 2	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato 826 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

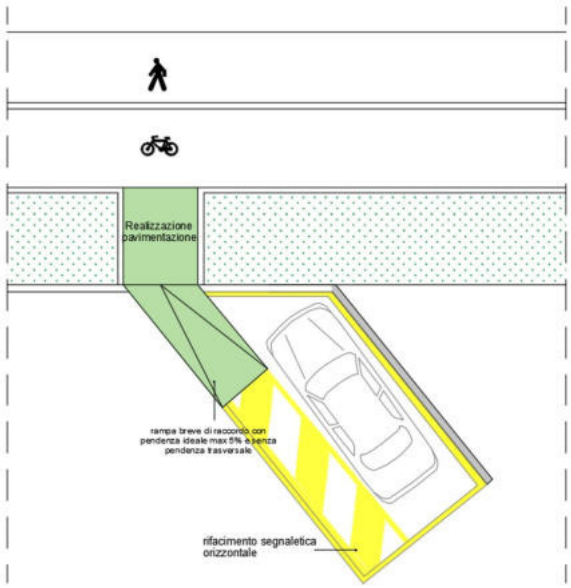

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03434.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02551**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE

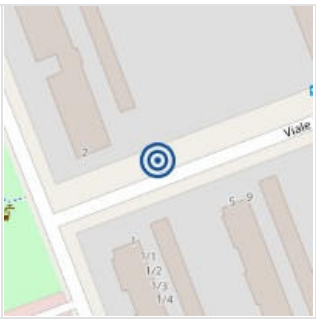

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

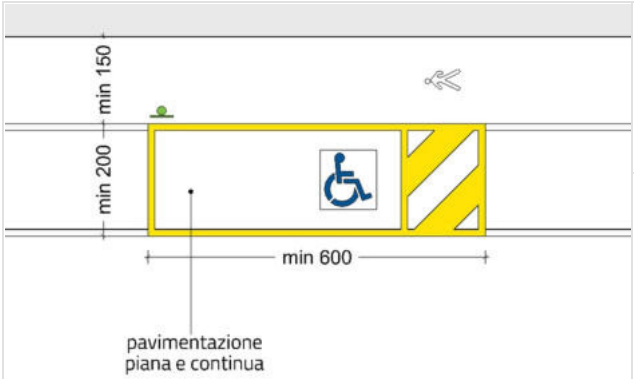

P1474 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **63 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02552**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 780 cm. Larghezza del marciapiede di 350 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

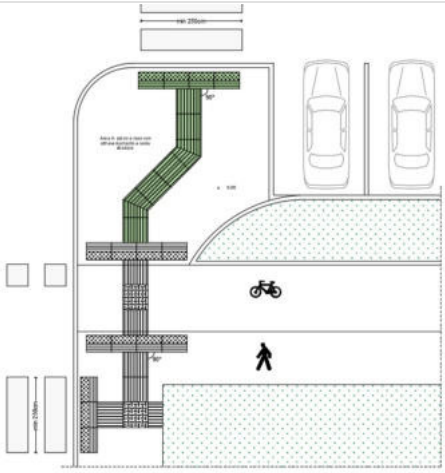

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02553)

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **966 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02553**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 789 cm. Larghezza del marciapiede di 340 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

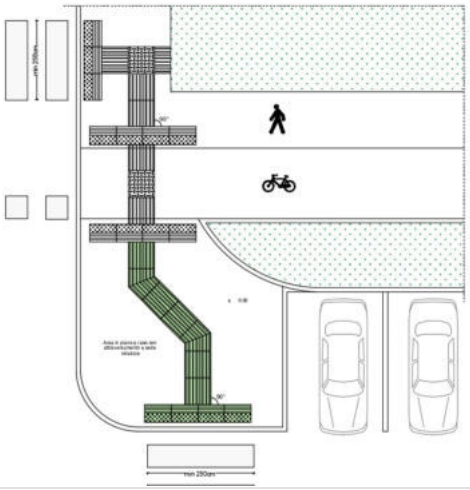

(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02552)

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **966 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02554**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02555	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Afro Basaldella 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

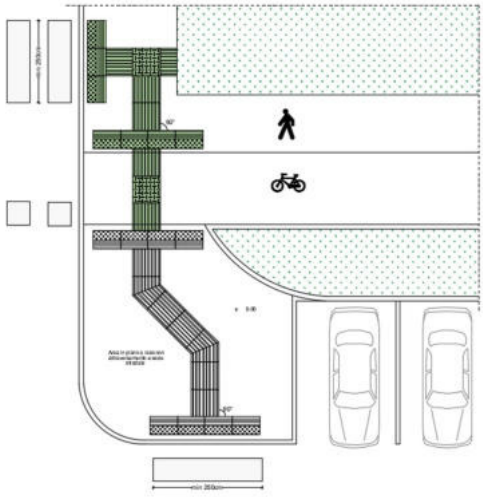

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della segnaletica orizzontale dell’attraversamento pedonale con integrazione di segnaletica per attraversamento ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **1.117 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **18 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02555**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 740,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02554	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Afro Basaldella 2, Udine	**1117 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

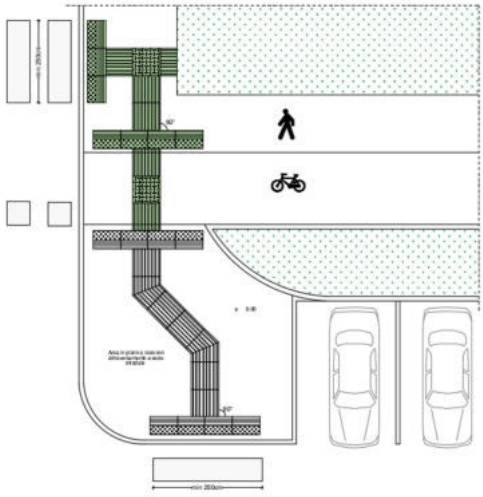

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02554.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02556**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 9800,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02557	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Afro Basaldella 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

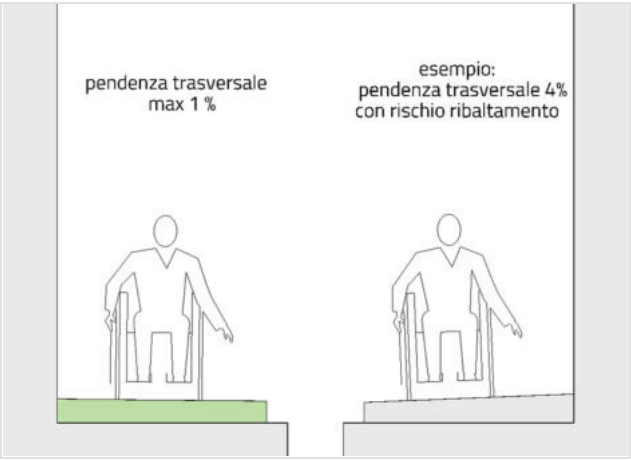

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **12.364 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Viale Afro Basaldella 2, Udine	2	E 00FF5-02557

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 9800,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02556	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Afro Basaldella 2, Udine	12364 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

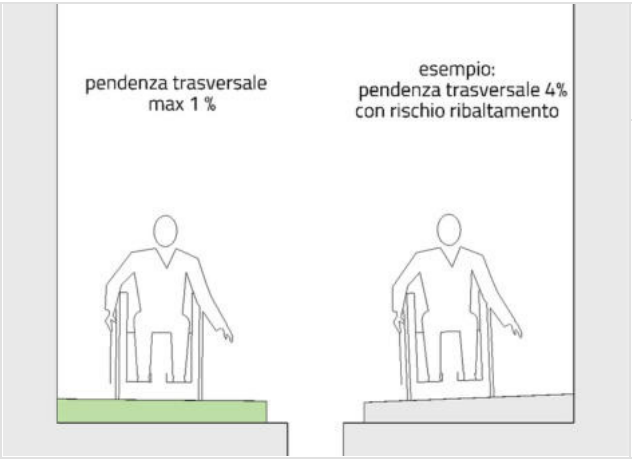

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02556.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02558**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 9800,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

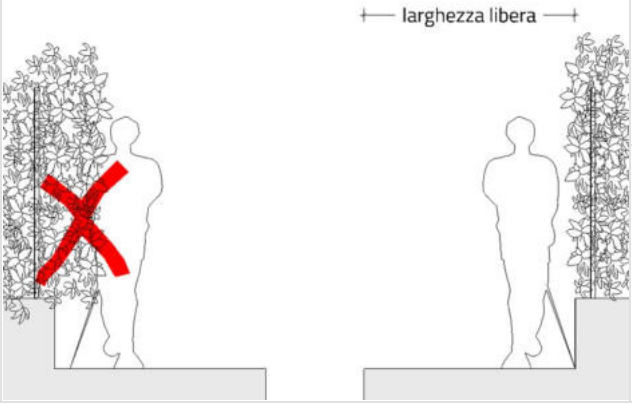

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

1.612 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02559**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 16 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 132 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

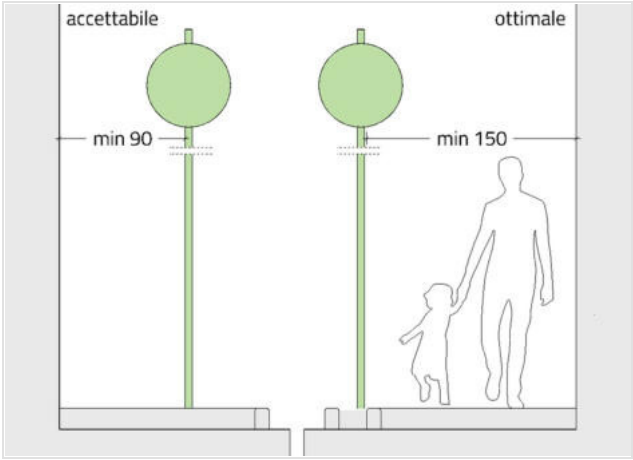

P1172 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02560**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

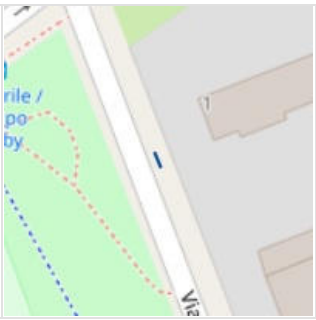

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

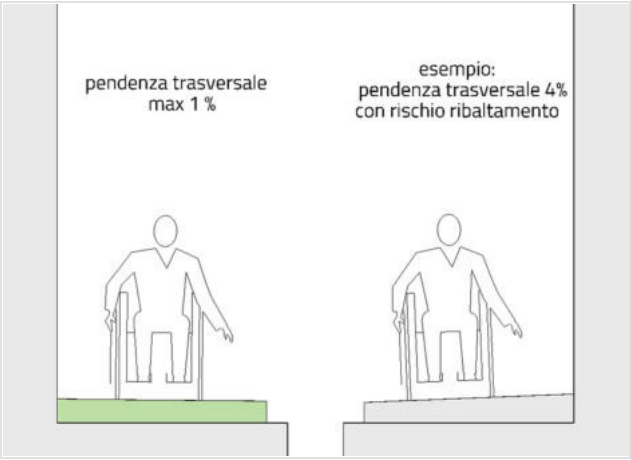

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento del tratto di percorso in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **501 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro 16, 33100 Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02561**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

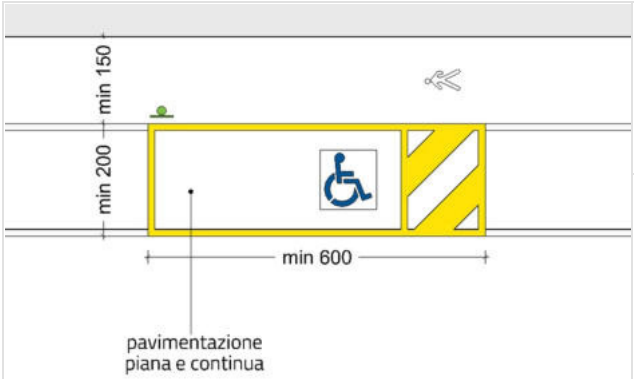

P1474 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **63 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02562**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

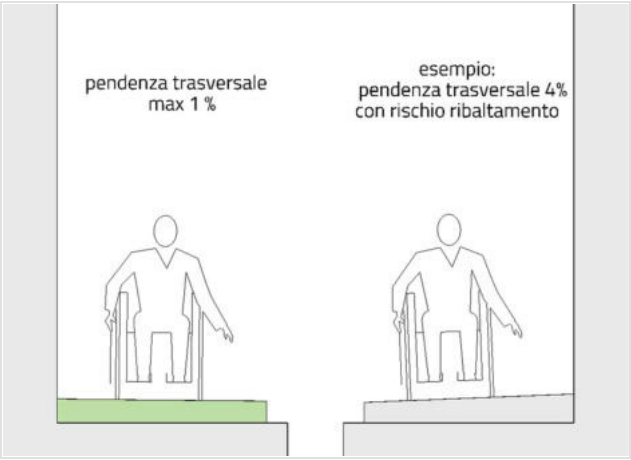

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.386 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02563**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione dell'elemento **309 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02564**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02565	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Afro Basaldella 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

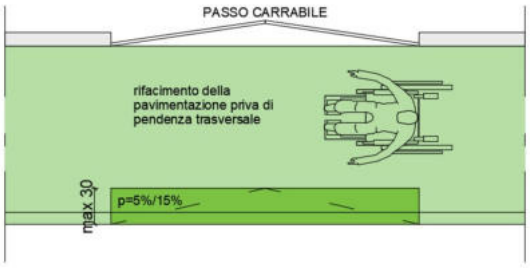

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Riduzione lungo la carreggiata della rampa carrabile esistente in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.187 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02565**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02564	LIV. **2**	**Larghezza Percorso pedonale** Viale Afro Basaldella 2, Udine	Costo stimato **1187 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

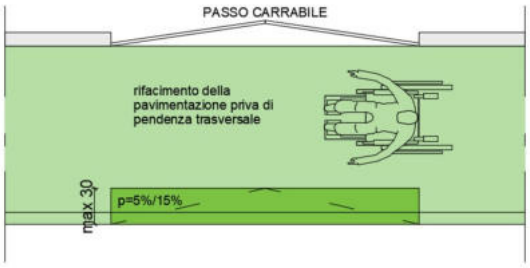

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02564.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02566**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2550,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

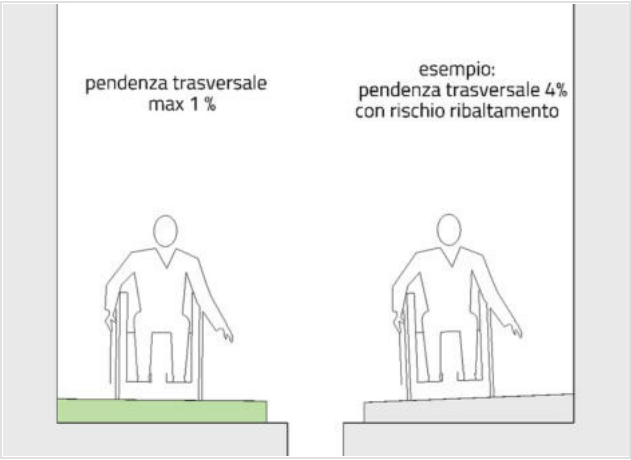

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **4.284 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02567**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

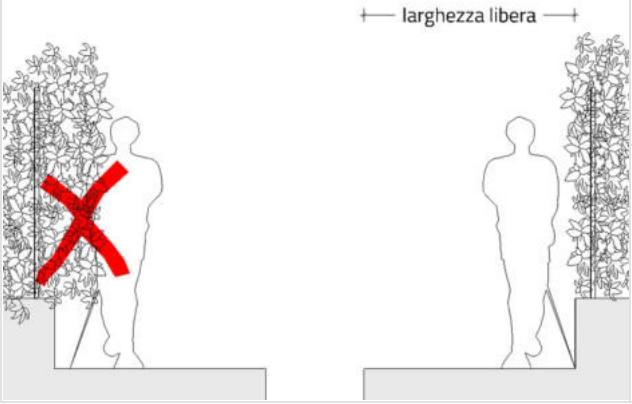

P0646 (modificato)
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

66 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02568**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Altezza del cordolo di 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

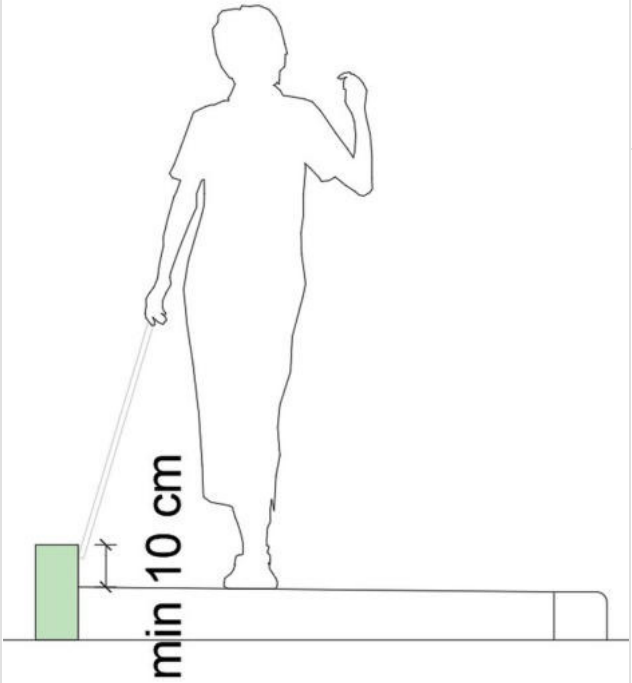

(modificato)
Posa di nuovi cordoli di guida naturale

Innalzamento del cordolo esistente in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Innalzamento del cordolo di guida naturale **921 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02569**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02570	**2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Afro Basaldella 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

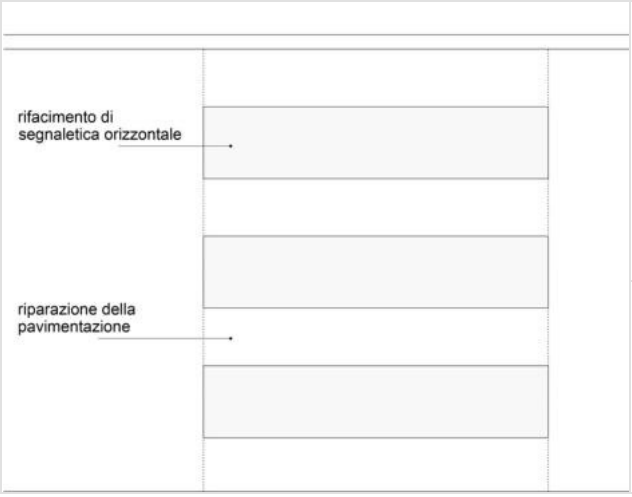

(modificato)
Rifacimento della segnaletica orizzontale

Eliminazione dell'attraversamento pedonale mediante cancellazione della segnaletica orizzontale non ortogonale, eliminazione della segnaletica tattile plantare posizionata non correttamente e chiusura degli eventuali varchi per il passaggio tra percorso e carreggiata. Realizzazione di attraversamento pedonale a raso, con pavimentazione in piano da collegare a raso e senza discontinuità ai percorsi pedonali o al marciapiede secondo le indicazioni di Abaco.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **2.206 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Afro Basaldella 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02570**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 710,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02569	LIV. **2**	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Viale Afro Basaldella 2, Udine	Costo stimato **2206 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

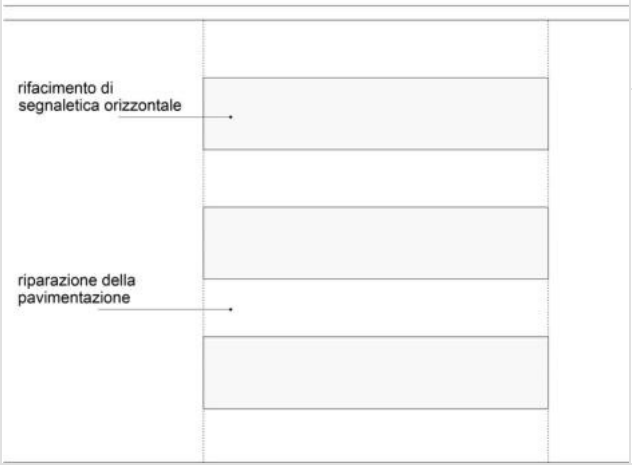

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02569.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Afro Basaldella

Rilevatore **0130** Data Rilievo **15 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Afro Basaldella 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03434**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **STALLO RISERVATO**

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02550	LIV. 2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02549	LIV. 2	**Lunghezza Stallo riservato** Via Afro Basaldella 1, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

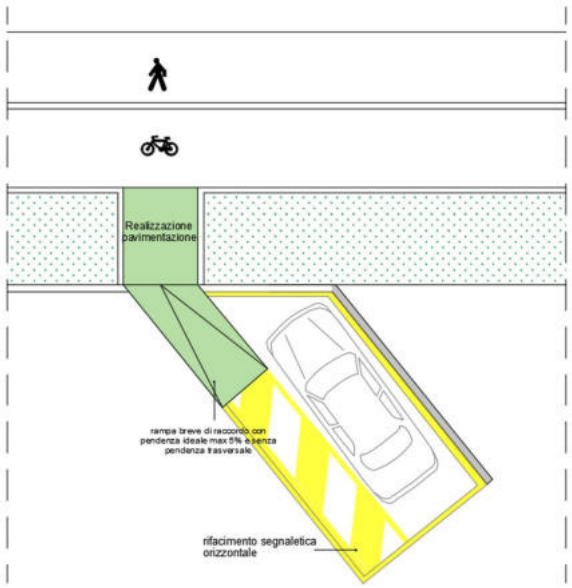

(modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale

Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di breve rampa di raccordo **826 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02572**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 85,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

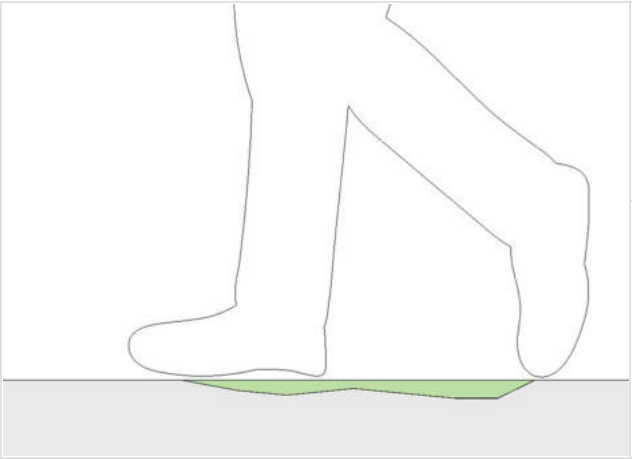

P0688 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

243 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02573**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Risalti/incasso	Si
Dimensioni	X 30,00 cm Y 35,00 cm
Materiale	Calcestruzzo e metallo
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1414 (modificato)
Eliminazione del risalto

Eliminazione del risalto e rifacimento della pavimentazione attorno ad esso.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto **112 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02574**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

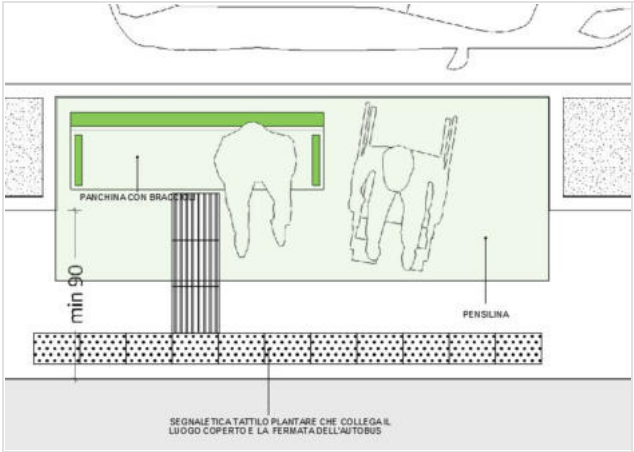

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02575**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 155,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02580	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **24412 €**
E 00FF5-02578	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02577	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02576	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02580.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02576**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02580	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **24412 €**
E 00FF5-02578	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02577	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02575	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02580.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02577**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02580	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **24412 €**
E 00FF5-02578	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02576	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02575	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02580.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02578**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02580	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **24412 €**
E 00FF5-02577	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02576	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02575	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02580.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02579**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 3100,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo alto 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

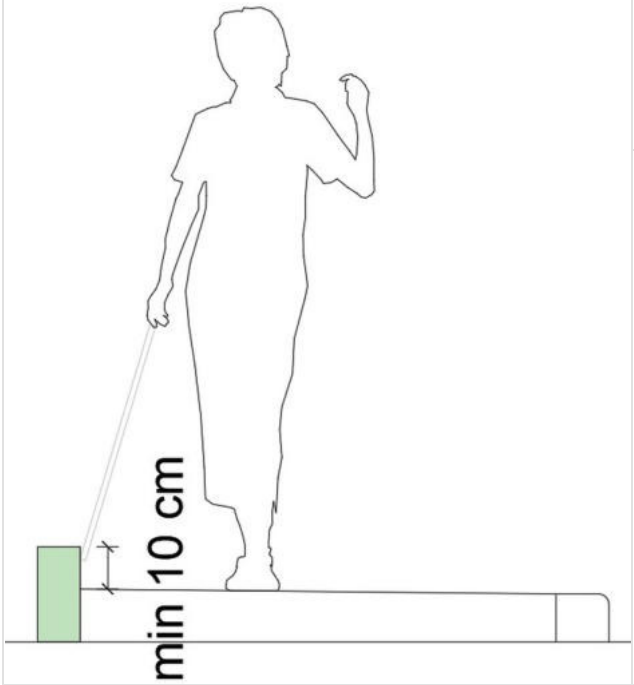

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.328 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02580**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

Primo attraversamento (larghezza della sede stradale) di 1100 cm, marciapiede di 200 cm, dislivello di 0 cm. Area da rendere pedonale di 1800 cm. Secondo attraversamento (larghezza della sede stradale) di 1130 cm, marciapiede di 235 cm, dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02575	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02576	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02577	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02578	LIV. 1	**Risalti/incasso Ostacolo orizzontale** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione nuovo attraversamento pedonale

Sistemazione delle rampe esistenti tramite rifacimento delle rampe con pendenza max del 5% e rifacimento della pavimentazione. Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di nuova isola pedonale per collegare entrambe le corsie di marcia. Sul marciapiede lato Nord realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max del 5% e in corrispondenza dell'attraversamento pedonale pendenza trasversale max 1%. Parte del nuovo attraversamento verrà integrato all'attraversamento ciclabile già esistente.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **24.412 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02581**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

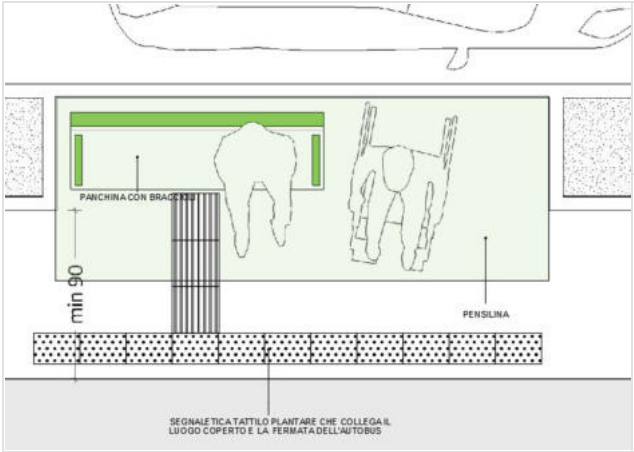

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02582**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 13500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0648 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione della vegetazione infestante sulla pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **942 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02583**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 700,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

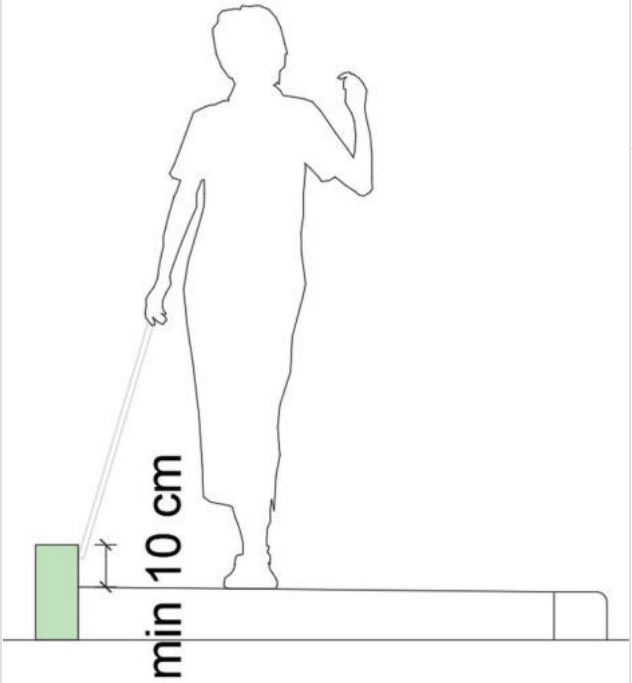

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

300 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02584**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

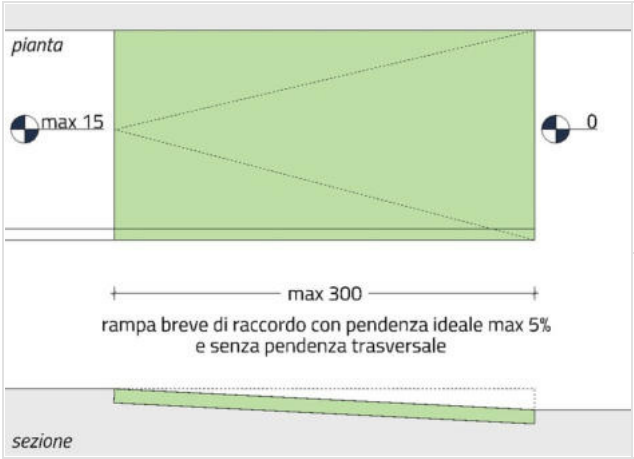

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.151 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02585**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

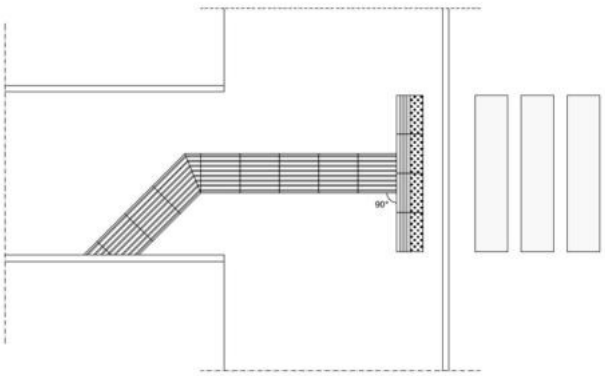

(modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **561 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02586**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Maglia attraversabile da sfera di 2 cm	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 65,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

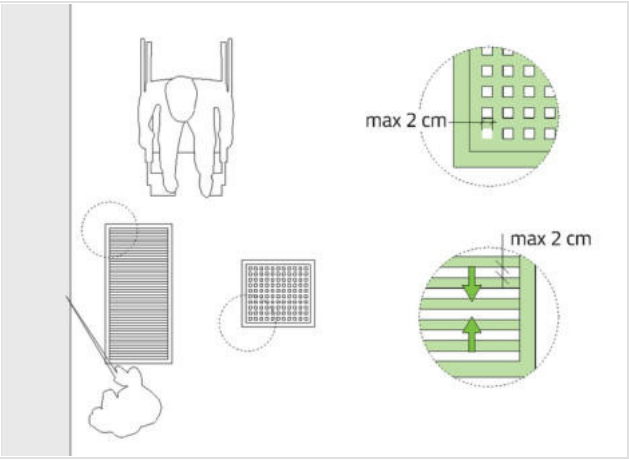

P0617 (modificato)
Sostituzione con grigliato inattravversabile da sfera di 2 cm

Sostituzione della caditoia o della griglia con altra avente fori non attraversabili da una sfera di diametro di 2 cm e posti trasversalmente al senso di marcia.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **235 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02587**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02588	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02589	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione del tratto di percorso.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **4.308 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02588**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	24	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 48,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02587	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **4308 €**
E 00FF5-02589	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02587.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02589**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Si consiglia l'eliminazione della porzione di percorso in risalto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02587	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **4308 €**
E 00FF5-02588	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 6, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02587.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02590**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	53	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

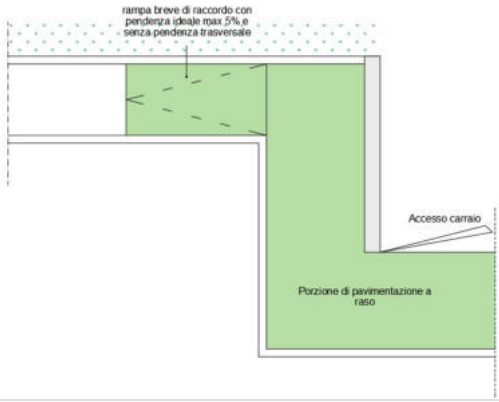

(modificato)
Eliminazione della rampa e suo riposizionamento

Eliminazione della rampa e suo riposizionamento (come da schema).
Rifacimento della porzione di pavimentazione in piano.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **3.602 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02591**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 3100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

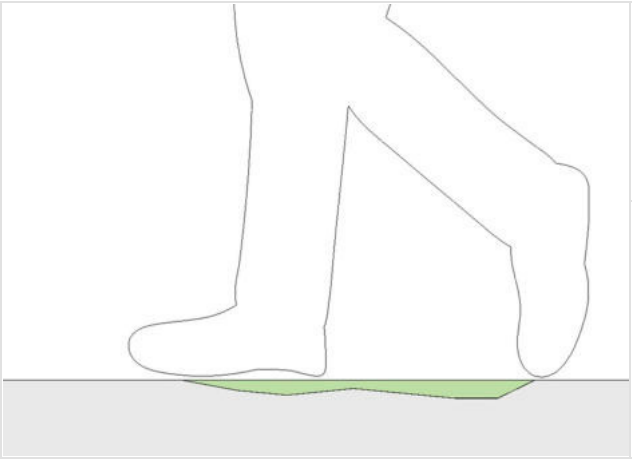

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.795 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02592**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3100,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

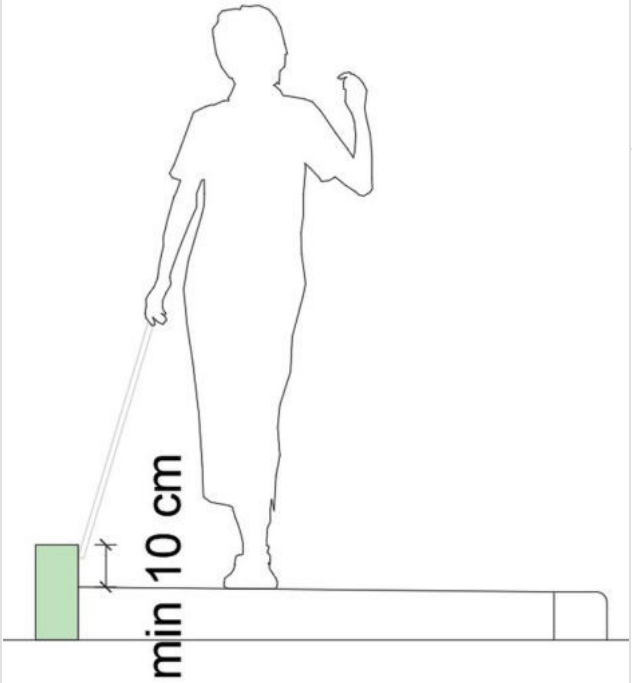

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.328 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02593**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02594	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02595	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

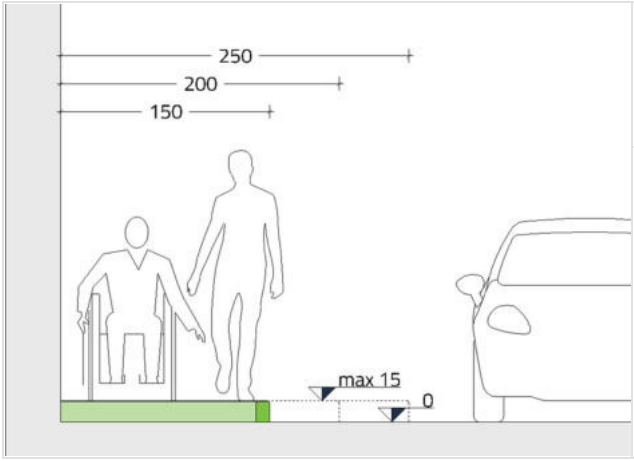

(modificato)
Eliminazione delle rampe

Rifacimento in piano del percorso pedonale con eliminazione delle rampe longitudinali.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

2.170 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02594**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02593	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato **2170 €**
E 00FF5-02595	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

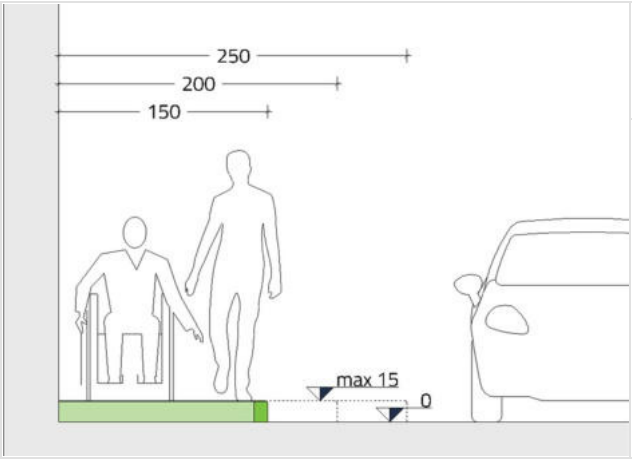

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02593.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02595**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02593	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato **2170 €**
E 00FF5-02594	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale 25 Aprile 2, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

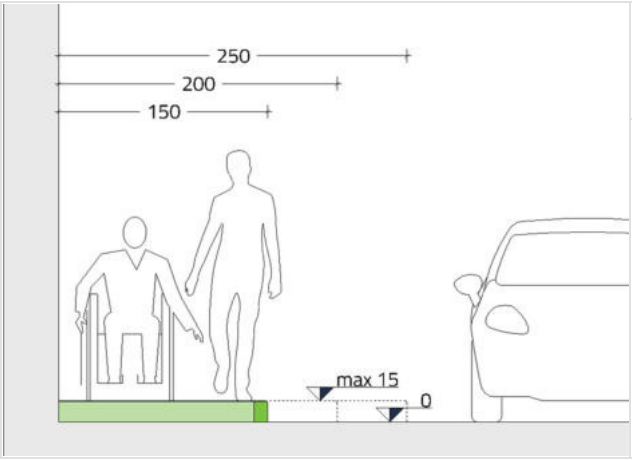

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02593.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02596**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 6000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

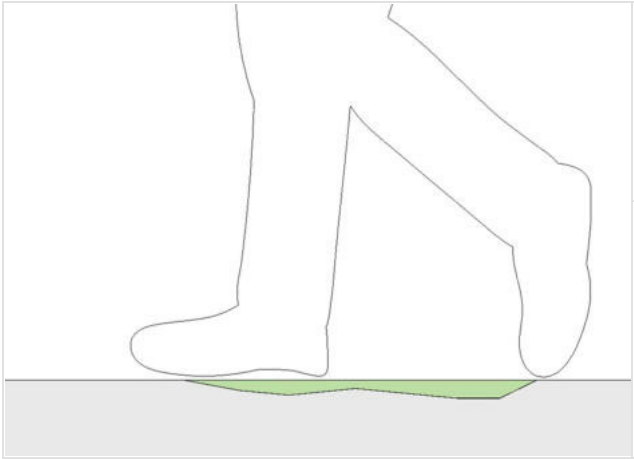

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

17.022 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Viale 25 Aprile 2, Udine	1	E 00FF5-02597

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02598	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Viale 25 Aprile 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

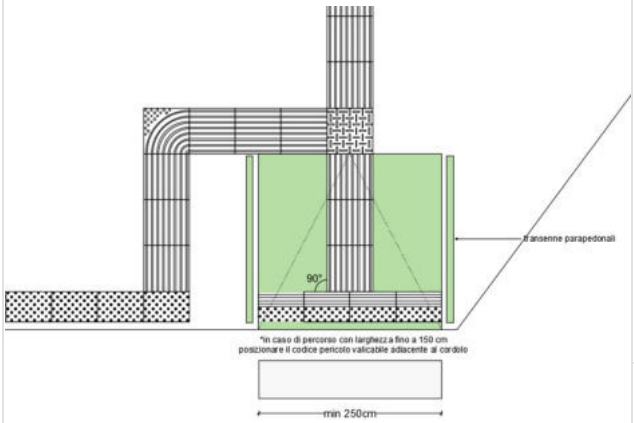

P0873 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione e posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. La segnaletica tattilo-plantare si collegherà alla segnaletica già presente alla fermata del trasporto pubblico.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

9.124 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02598**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	10	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02597	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale 25 Aprile 2, Udine	**9124 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

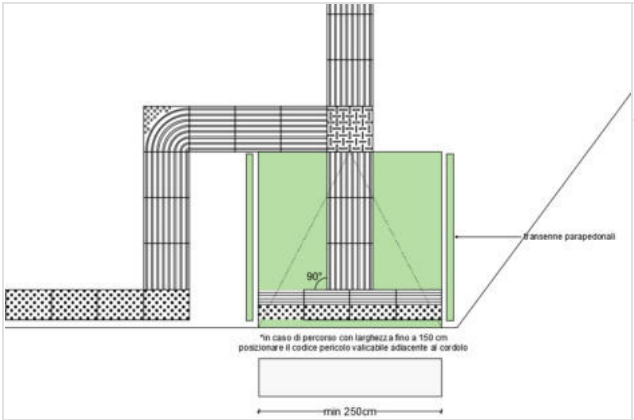

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02597.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02599**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0711 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **67 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02600**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Assenza di panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

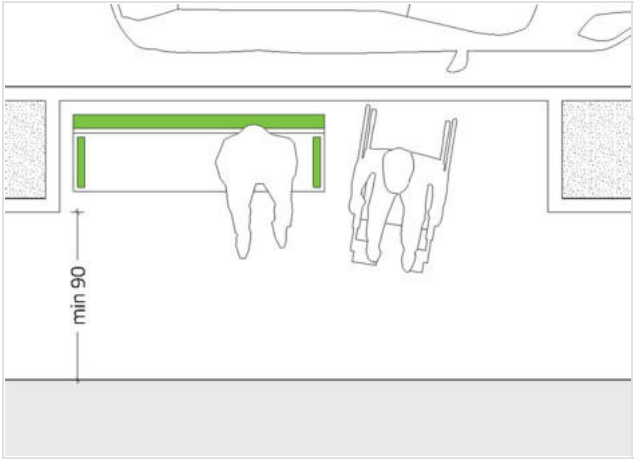

(modificato)
Posa di panchina

Adeguamento della fermata TPL con panchina con braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL **400 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Viale 25 Aprile

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Viale 25 Aprile 2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02601**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

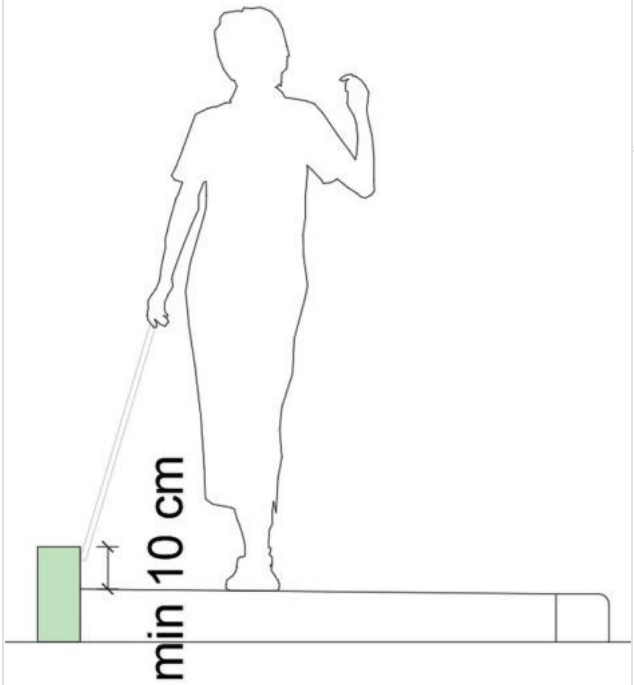

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

2.570 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Mario Miglioranza, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02614**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
Assenza di pavimentazione su percorso esistente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **1.272 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Mario Miglioranza, Udine**	2	E **00FF5-02615**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

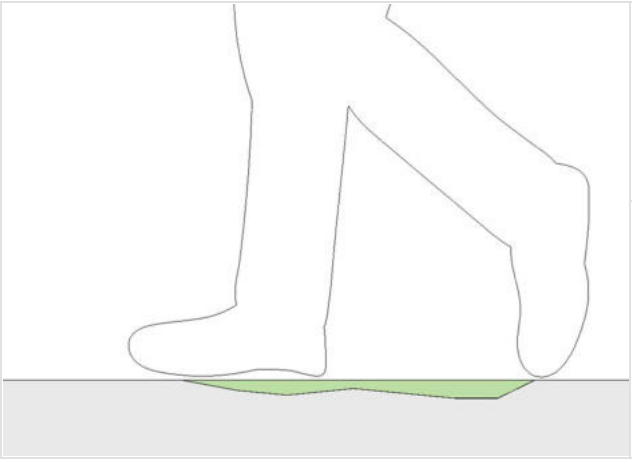

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **879 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **23 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025

Indirizzo
Via Mario Miglioranza, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02616

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 580 cm. Larghezza del marciapiede di 190 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02617).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **3.754 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Mario Miglioranza, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02617**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 580 cm. Larghezza del marciapiede di 150 cm. Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02616).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.287 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Mario Miglioranza, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02618**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02619	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Mario Miglioranza, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

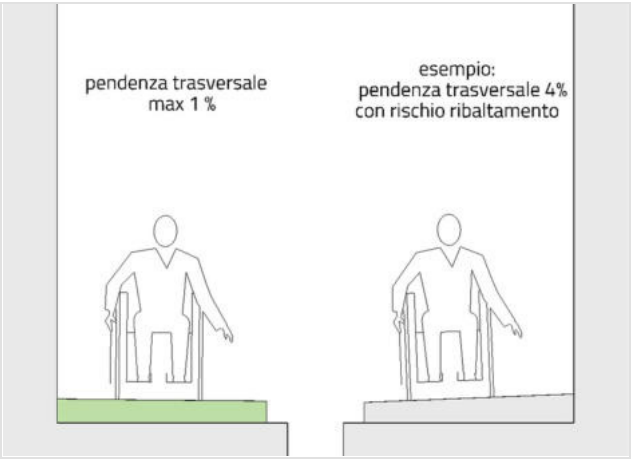

P1051 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.391 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Mario Miglioranza

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Mario Miglioranza, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02619**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02618	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Mario Miglioranza, Udine	Costo stimato **1391 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

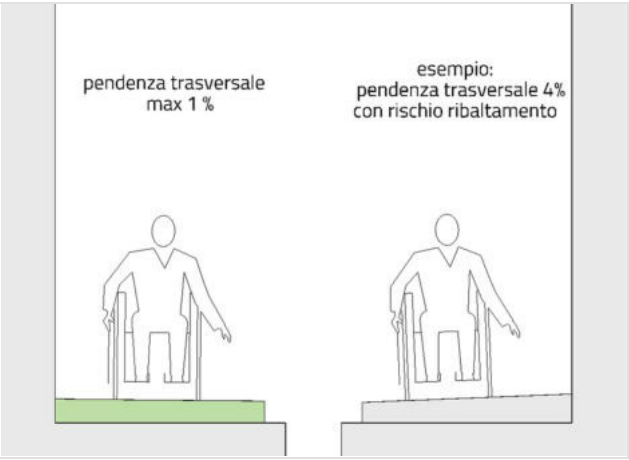

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02618.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Gio Batta Periz

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gio Batta Periz, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02635**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

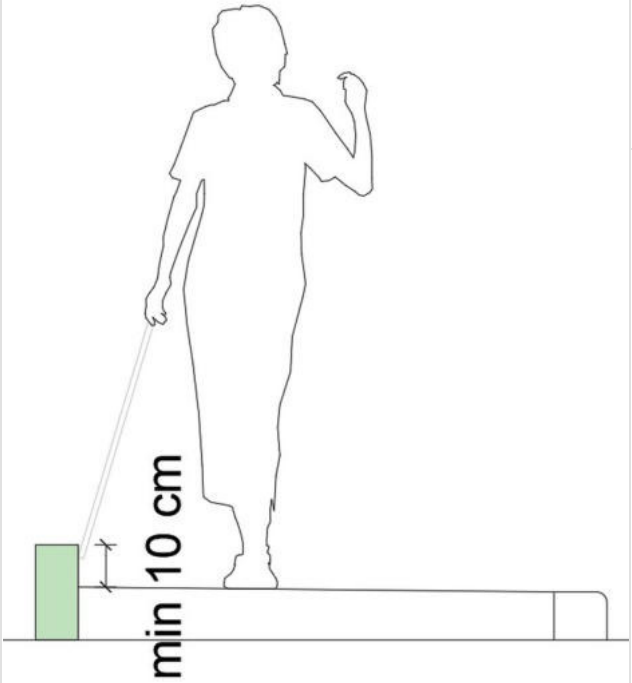

(modificato)
Posa di cordolo di guida naturale

Posa di cordolo a contrasto cromatico in calcestruzzo o gomma per la delimitazione e protezione del percorso pedonale. Altezza cordolo min 10 cm da piano di calpestio.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo

1.413 €

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Gio Batta Periz

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Indirizzo **Via Gio Batta Periz, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02636**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

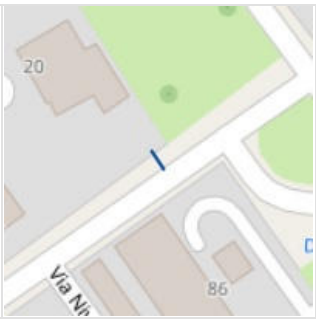

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 580 cm. Larghezza del marciapiede di 280 cm. Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale ortogonale al percorso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02637).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale **5.702 €**

PEBA comune di udine > QUARTIERE AURORA > Via Gio Batta Periz

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 11 Settembre 2025	Via Gio Batta Periz, Udine	2	E 00FF5-02637

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 580 cm. Larghezza del marciapiede di 620 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di rampe per nuovo attraversamento

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02636).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.178 €

13

VIA CIVIDALE

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 294, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02662**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 2800,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

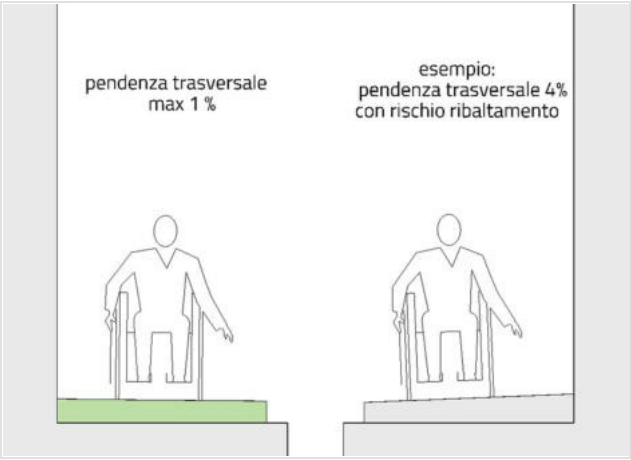

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

9.295 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 286, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02663**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

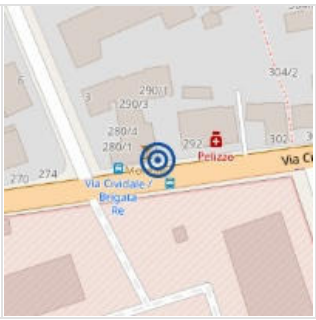

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

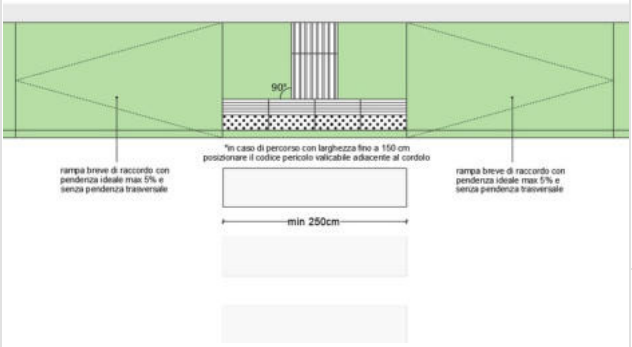

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.871 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 286, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02664**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

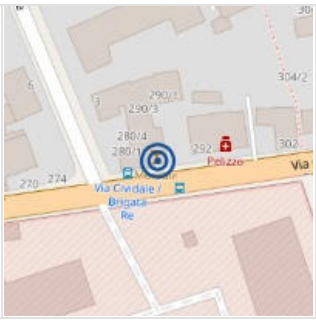

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Davanzale reclinabile. Altezza libera da terra di 97 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02665	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02666	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Si suggerisce l'eliminazione degli elementi reclinabile che costituiscono ostacolo per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo **136 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 286, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02665**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

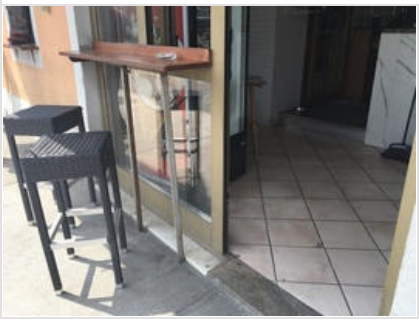

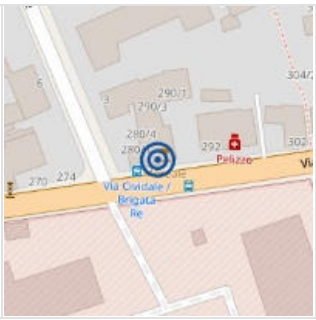

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Davanzale reclinabile. Altezza libera da terra di 97 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02664	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato **136 €**
E 00FF5-02666	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02664.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 286, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02666**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

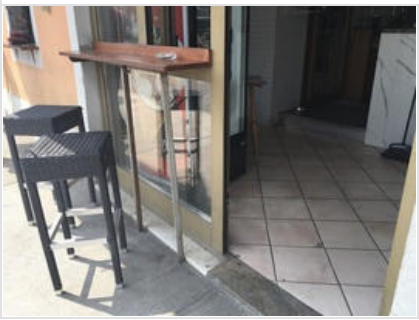

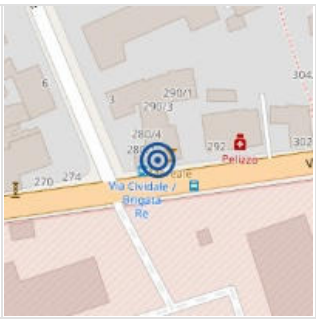

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Davanzale reclinabile. Altezza libera da terra di 97 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02664	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato **136 €**
E 00FF5-02665	LIV. 2	**Arredo attività commerciale Ostacolo verticale** Via Cividale 286, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02664.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 286, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02667**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

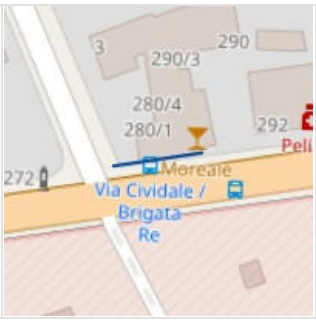

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 2200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

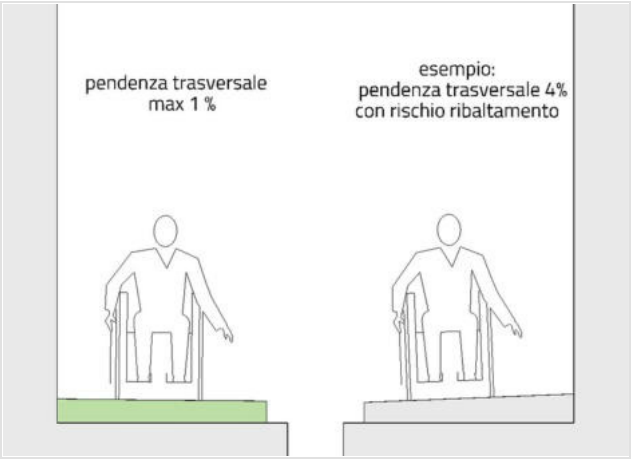

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

5.970 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 282, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02668**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

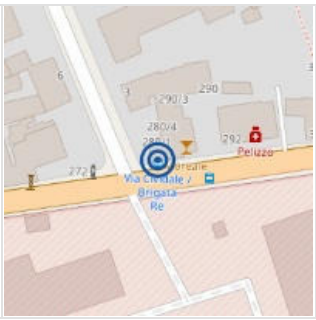

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

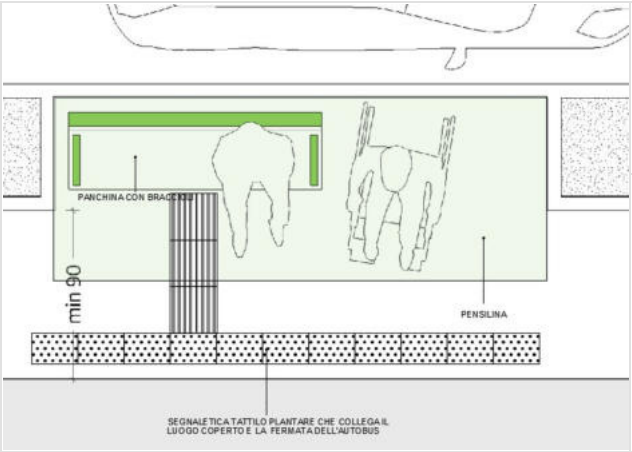

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e spostamento della palina di segnaletica in corrispondenza della fermata.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina

11.567 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 282, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02669**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

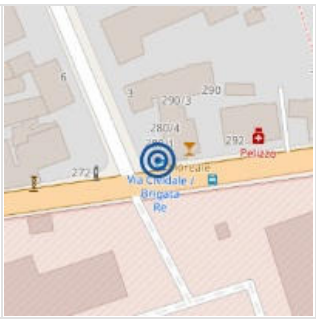

Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 16,00 cm	Y 16,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

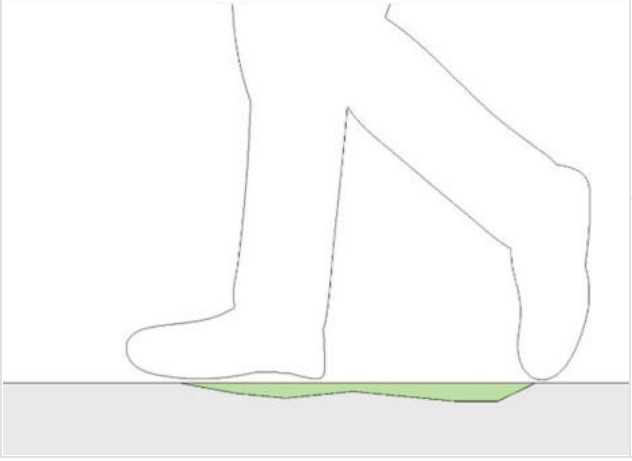

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

99 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 282, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02670**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

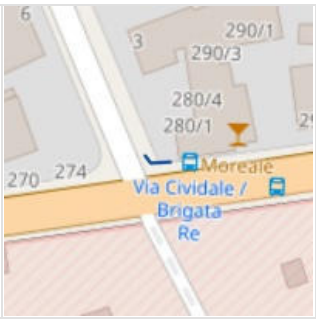

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

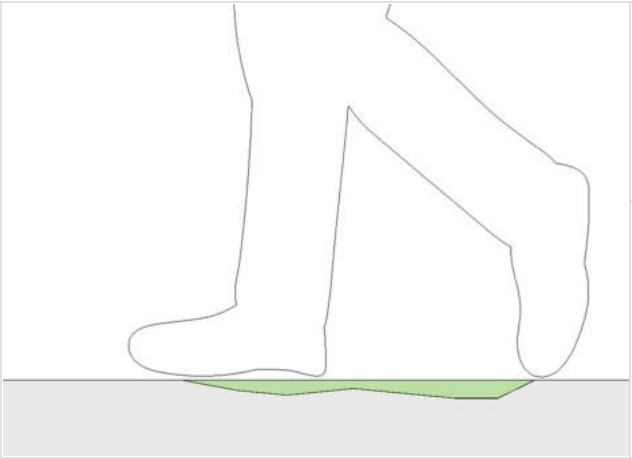

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.750 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 280, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02671**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 245,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 245 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale **3.203 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 280, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02672**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

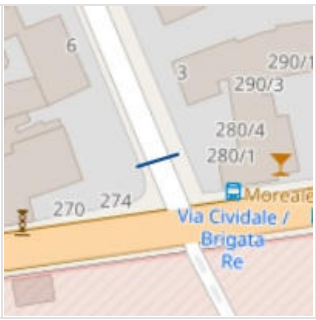

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 245 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02673)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

7.325 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Via Cividale 280, Udine	2	E 00FF5-02673

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 310 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02672)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.143 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 280, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02674**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza di 310 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **2.211 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 272, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02675**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 610,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

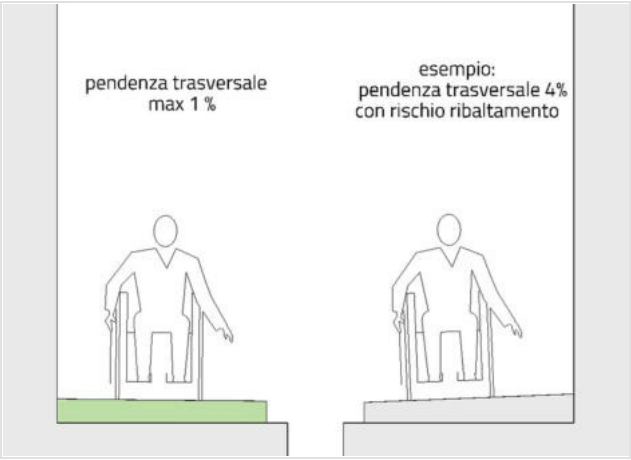

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

605 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 270, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02676**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 245,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

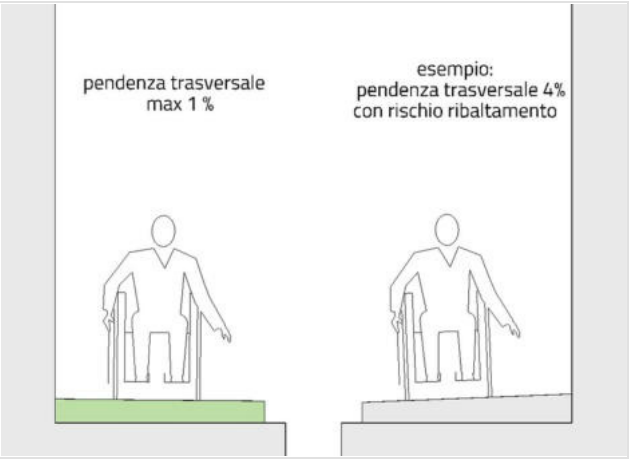

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

223 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 270, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02677**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

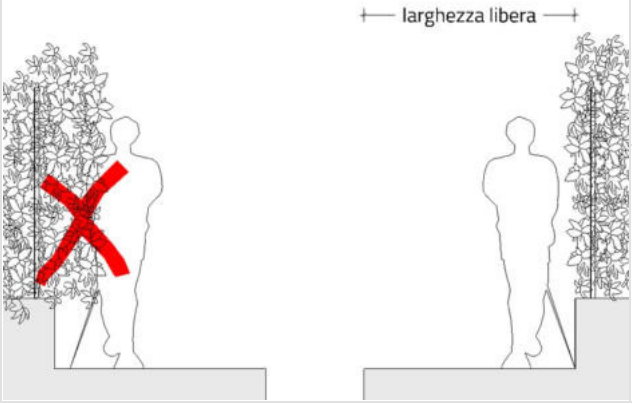

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

74 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 266, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02678**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	35	≥ 90cm
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

539 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02679**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	85	≥ 90cm
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 2900,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

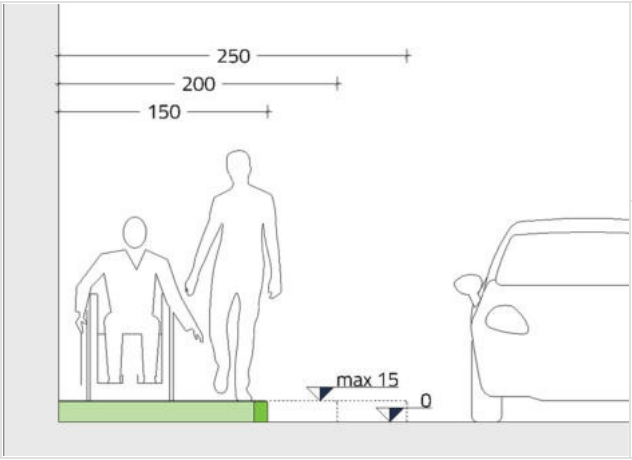

P1032 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **8.233 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 248, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02680**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	50	≥ 90cm
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 330,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

969 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02681**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

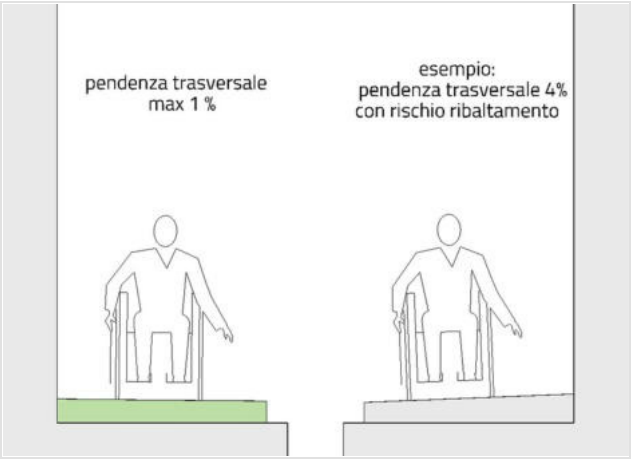

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

412 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02682**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 135,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 17 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

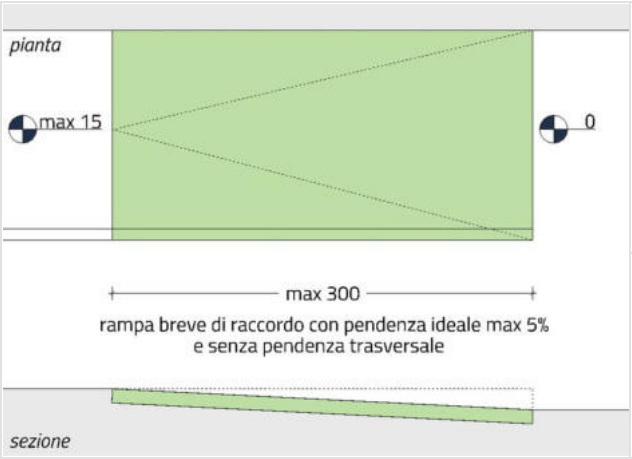

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.132 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02683**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 1130,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

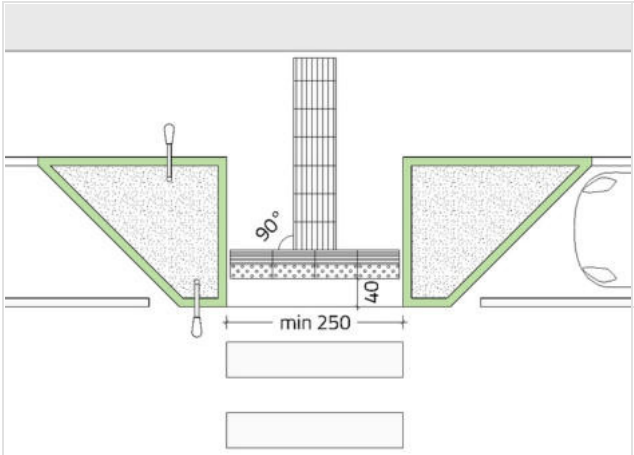

P0771 (modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale e posa di moduli tattilo-plantari

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale e posa di moduli tattilo-plantari
4.514 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02684**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 197,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

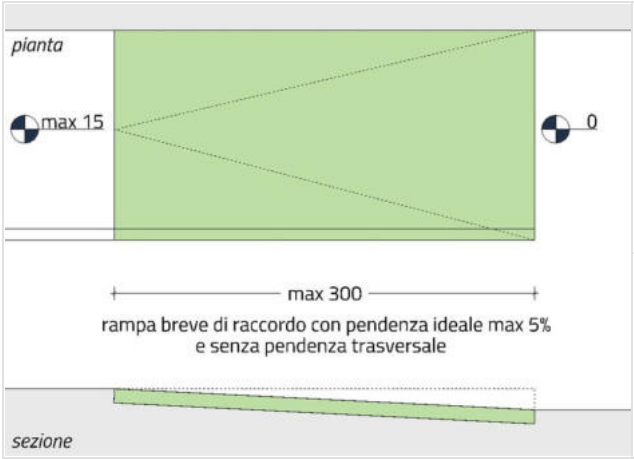

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

851 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02685**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 174 cm. Larghezza totale del marciapiede di 196 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

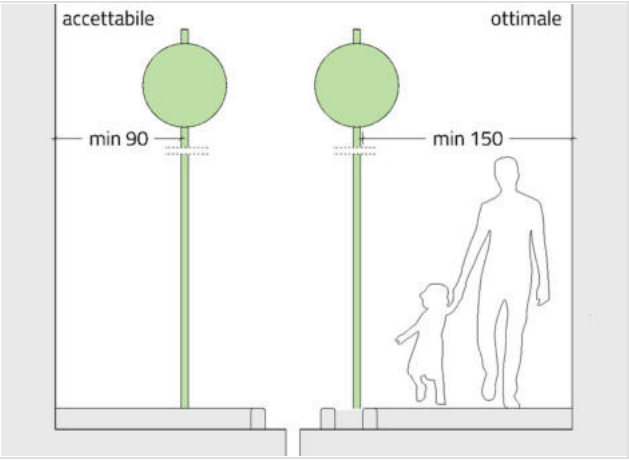

P1172
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02686**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

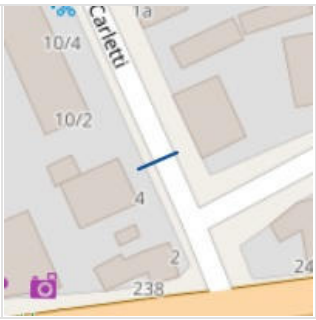

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 770 cm. Larghezza del marciapiede di 205 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02687)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di percorso pedonale a raso compresa segnaletica tattilo-plantare

6.570 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **23 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 252, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02687

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 770,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 770 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02686)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.702 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02688**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 2950,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

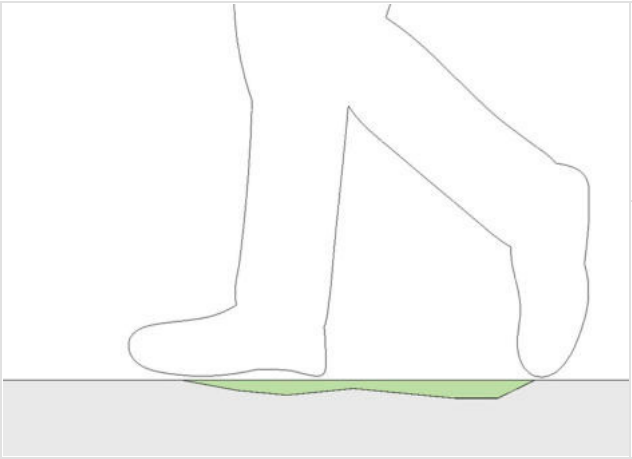

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **8.810 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 252, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02689**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	11	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 202,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

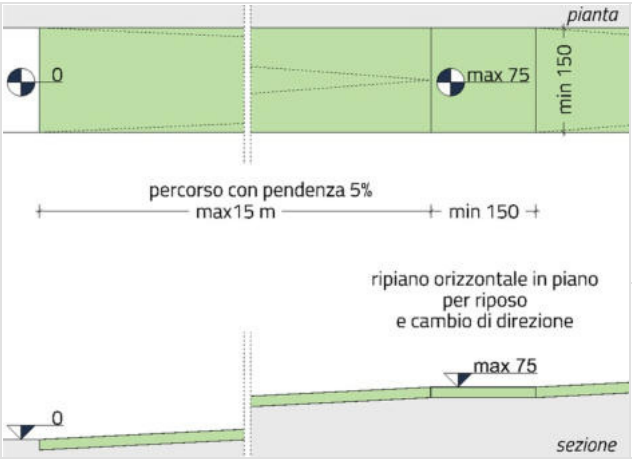

P1062 (modificato)
Demolizione e ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Considerata la pendenza del tratto di percorso si suggerisce di realizzare un ripiano orizzontale in piano per riposo ed eventuale cambio direzione.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.339 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 238, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02690**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

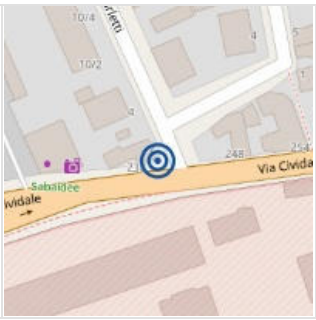

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 135,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

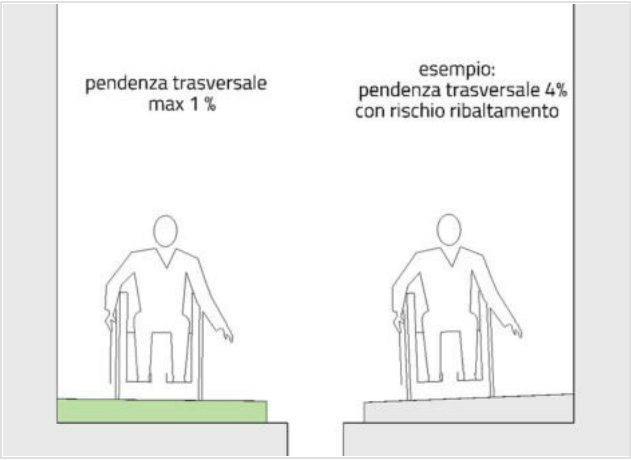

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **669 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 238, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02691**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 370,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

996 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 234, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02692**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	60	≥ 90cm
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 430,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

1.157 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 234, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02693**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

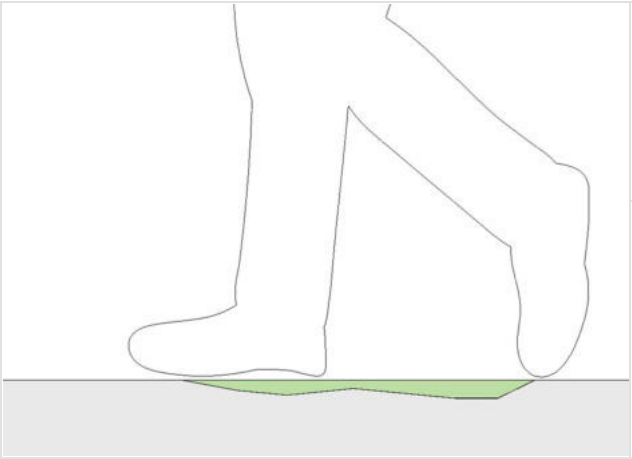

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

625 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 234, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02694**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

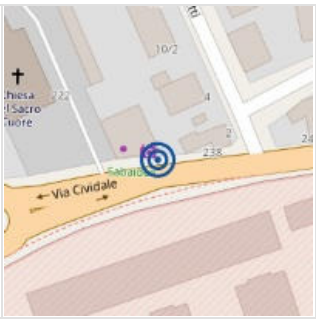

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 90,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

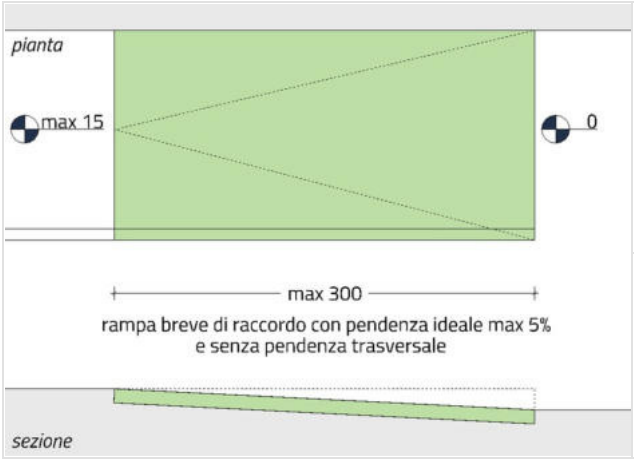

PS1734
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

943 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 234, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02695**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 3000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

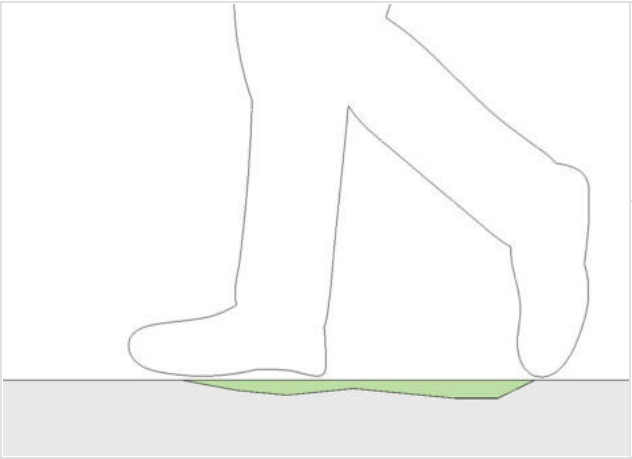

P0688 (modificato)
Riparazione del marciapiede

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **5.838 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **23 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 228, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02696**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 380,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

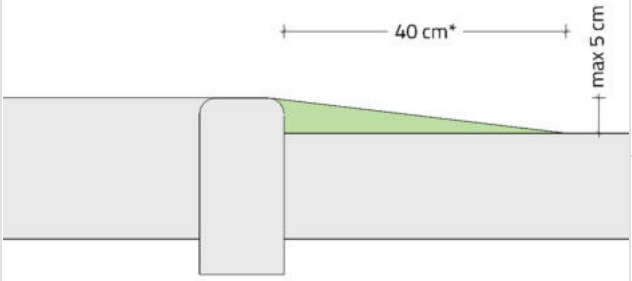

*misura indicativa

P0544 (modificato)
Realizzazione di raccordo mediante riporto per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, per superare il dislivello tra 2,5 cm e 5 cm. Lunghezza come intera fascia di contatto pari alla larghezza del dislivello, profondità min 40 cm, privo di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo **227 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 22, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02697**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 3170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

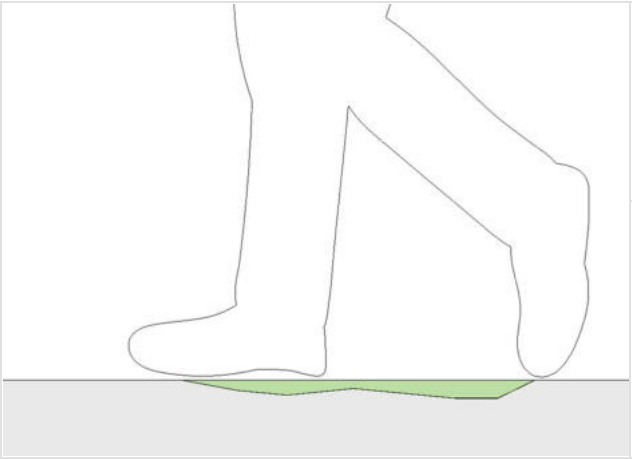

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **4.779 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 22, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02698**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 3170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

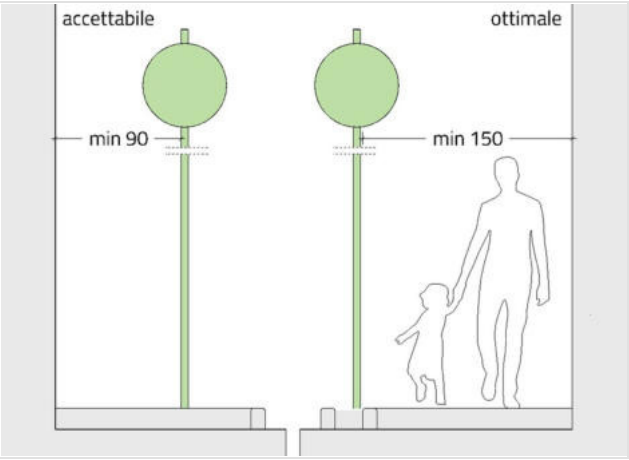

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02699**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	13	≤ 1%
Dimensioni	X 127,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02700	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 22, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

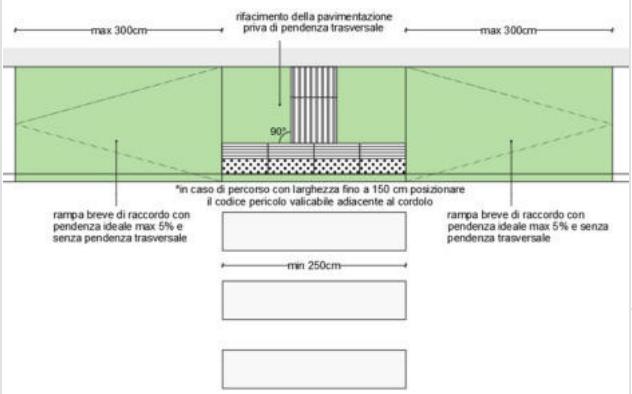

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.729 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 22, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02700

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 127,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02699	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 22, Udine	Costo stimato **2729 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

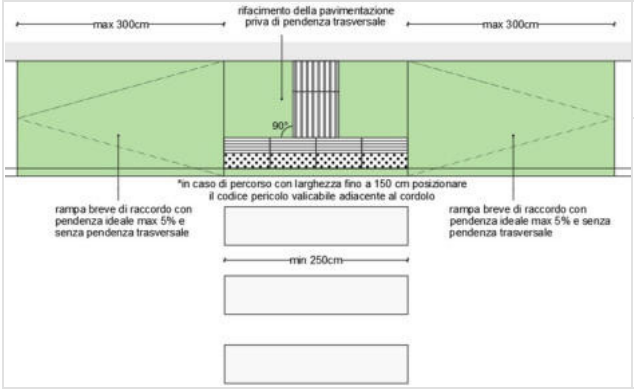

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02699.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 22, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02701**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **83 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02702**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 230,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02703	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 210, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02704	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 210, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

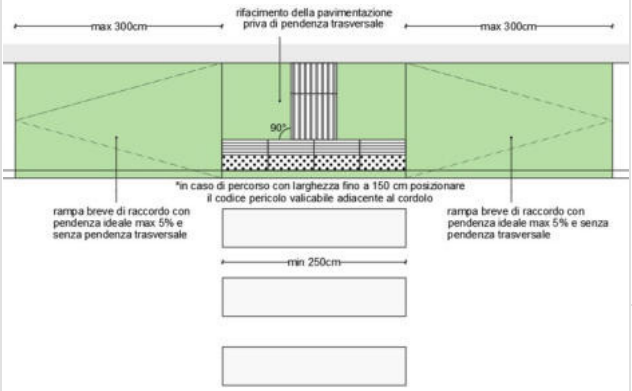

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.907 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Via Cividale 210, Udine	1	E 00FF5-02703

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	17	≤ 1%
Dimensioni	X 147,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02702	1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 210, Udine	2907 €
E 00FF5-02704	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 210, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

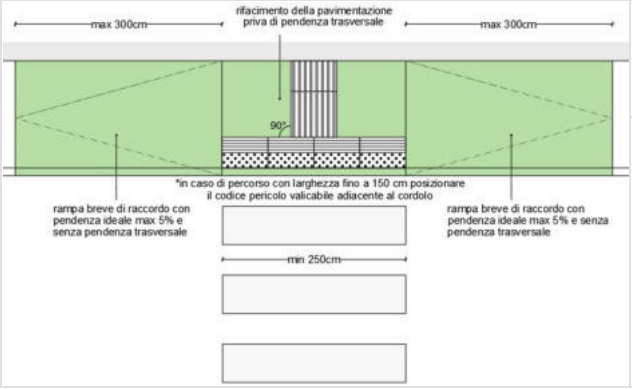

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02702.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02704**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 147,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02702	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 210, Udine	Costo stimato **2907 €**
E 00FF5-02703	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 210, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

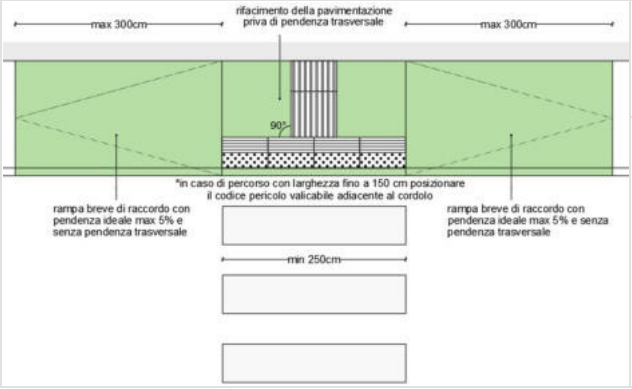

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02702.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02705**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. larghezza libera di passaggio di 131 cm larghezza totale del marciapiede di 147 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

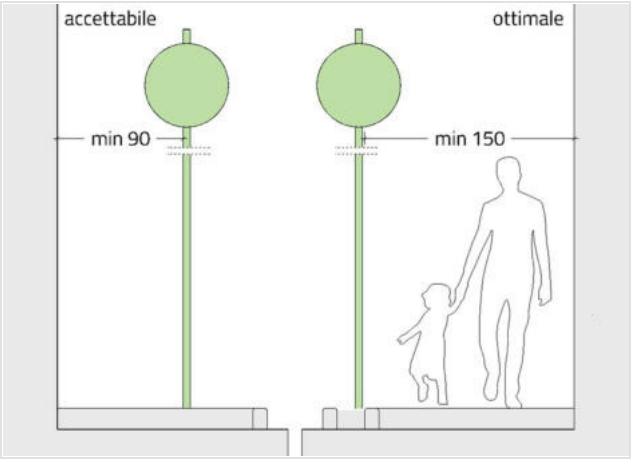

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02706**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 147,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02707	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 210, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

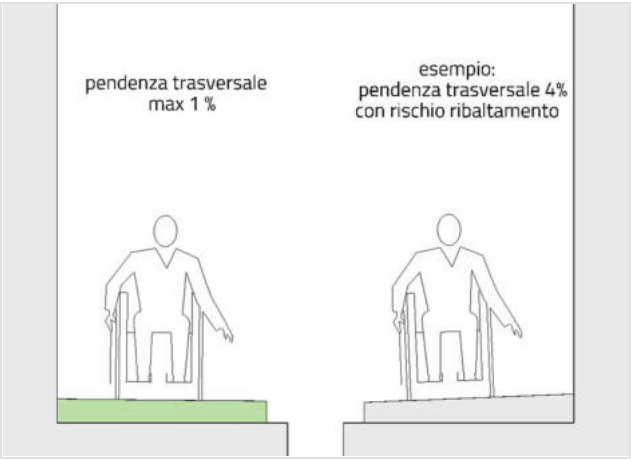

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.293 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02707**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 147,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02706	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 210, Udine	Costo stimato **3293 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

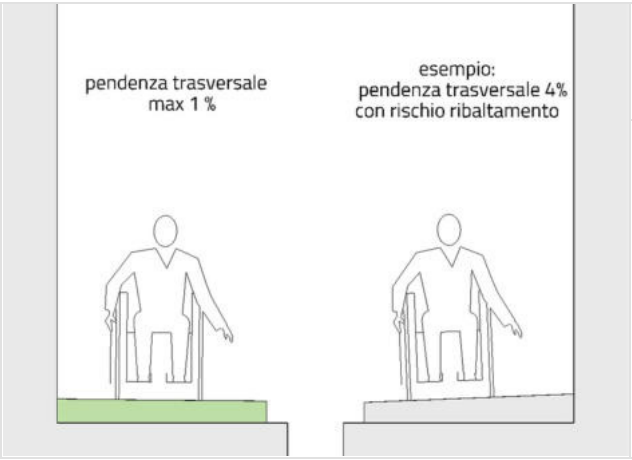

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02706.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02708**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 11 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 136 cm larghezza totale del marciapiede di 147 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

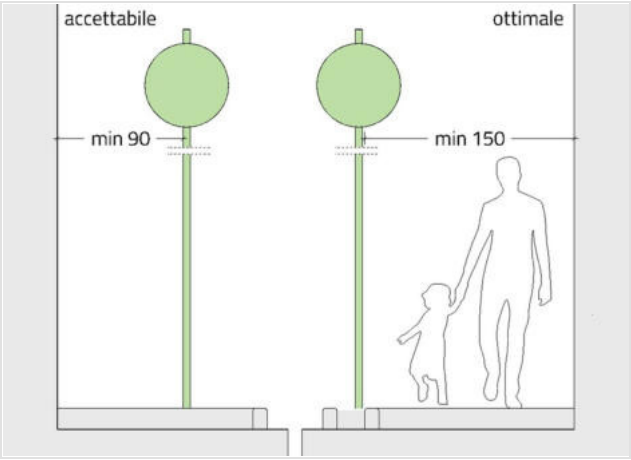

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 210, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02709**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Arbusti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

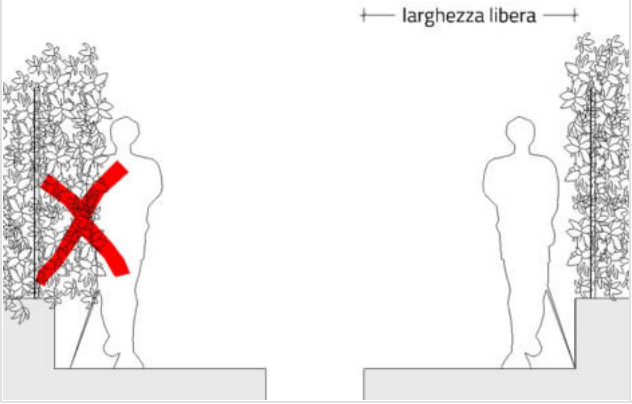

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione **90 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02710**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 55 cm. Altezza del cestino di 46 cm. Ingombro di 32 cm. Collocato su palo inclinato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

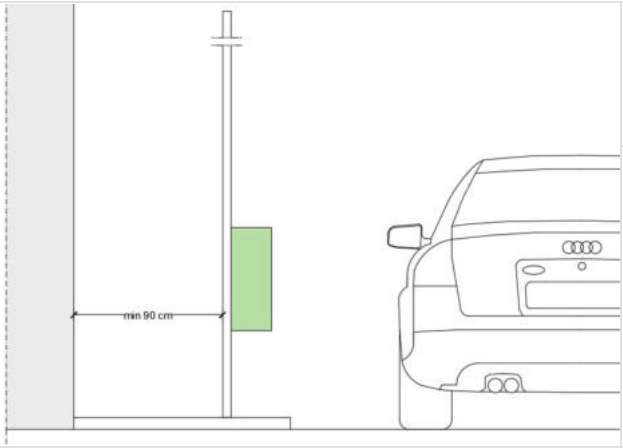

Rotazione del cestino di 90°

Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 208, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02711**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 490,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo

Dislivello di 13 cm. La rampa di discesa alla sede stradale è seguita da una fascia in piano la larghezza totale del marciapiede è di 245 cm. L'attraversamento pedonale è in prossimità della porta d'ingresso di un'attività commerciale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02712	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02713	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02763	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02764	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

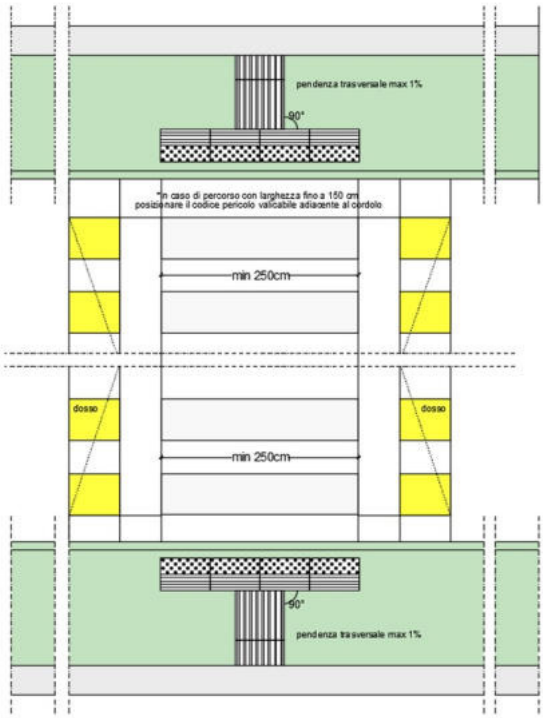

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e della segnaletica tattilo-plantare a livello del marciapiede

Considerata la vicinanza a ingressi alle attività commerciali e l'impossibilità di allungare le rampe per garantire una pendenza max del 5%, si suggerisce di portare l'attraversamento pedonale a livello con il marciapiede. Quindi si consiglia il rifacimento della pavimentazione del tratto di percorso in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti. Innalzamento dell'attraversamento pedonale creando un dosso sulla sede stradale. La stessa soluzione si propone sul lato opposto della strada (ID Scheda 00FF5-02763 e 00FF5-02764).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

10.485 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 208, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02712

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 245,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02711	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato **10485 €**
E 00FF5-02764	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02763	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02713	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

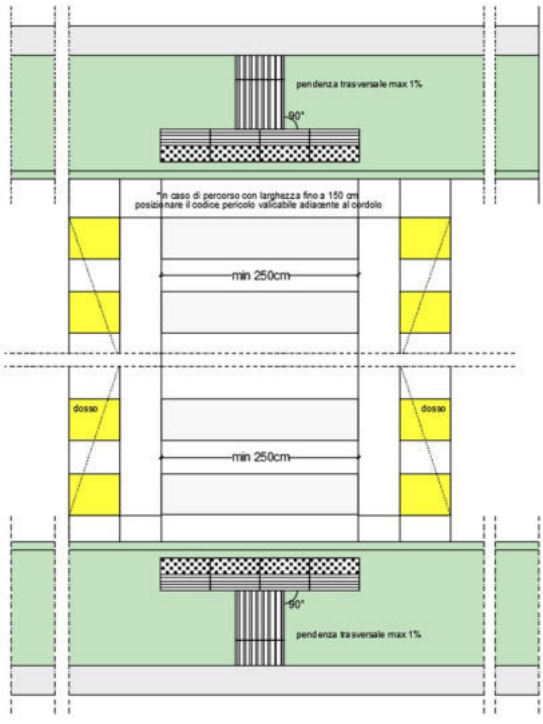

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02711.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 208, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02713

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02711	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato **10485 €**
E 00FF5-02764	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02763	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02712	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

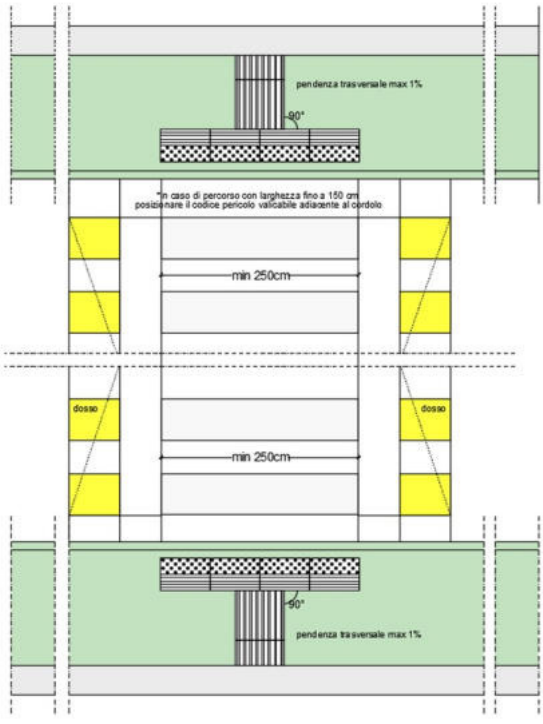

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02711.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 204, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02714**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

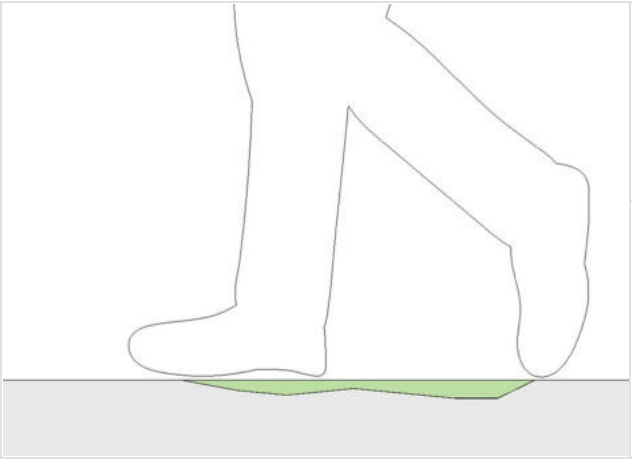

P0688
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

433 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 194, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02715**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

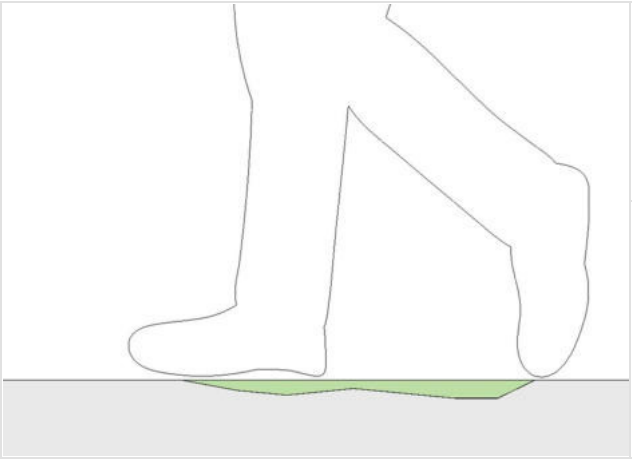

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale **224 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 176, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02716**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 162,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Panchina senza bracciali.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

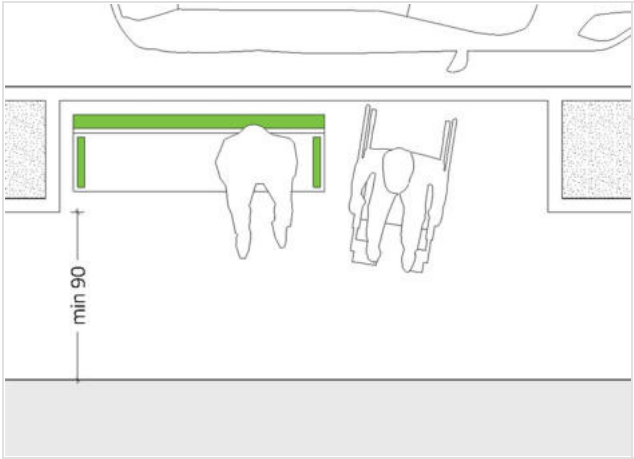

P0965 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione della panchina esistente con una con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di panchina **582 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 176, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02717**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 25,00 cm	Y 25,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

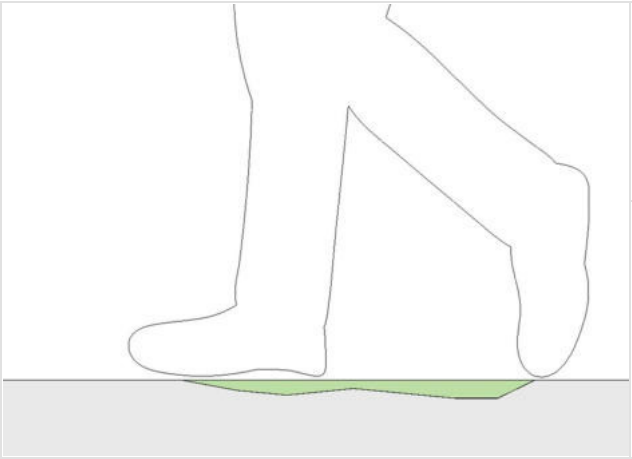

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

149 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 176, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02718**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

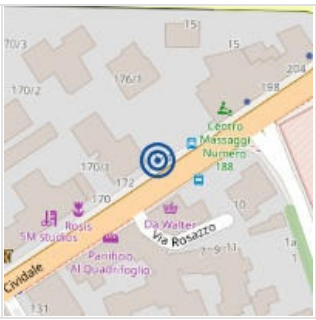

Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 140,00 cm Y 370,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti
Note relative al rilievo --	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

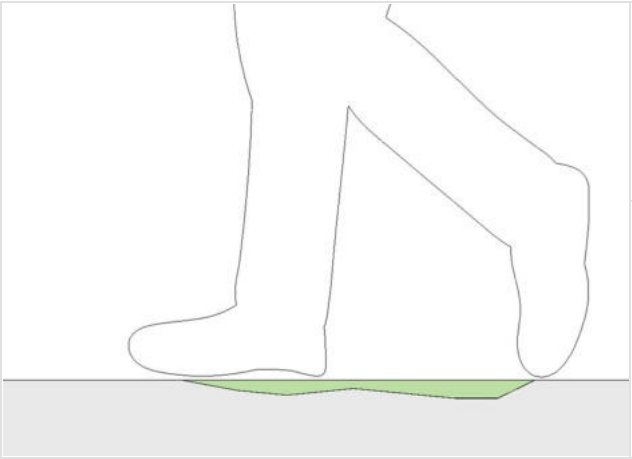

P0688
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale **829 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo Via Cividale 176-156,Udine	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02719**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 212,00 cm	Y 5650,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

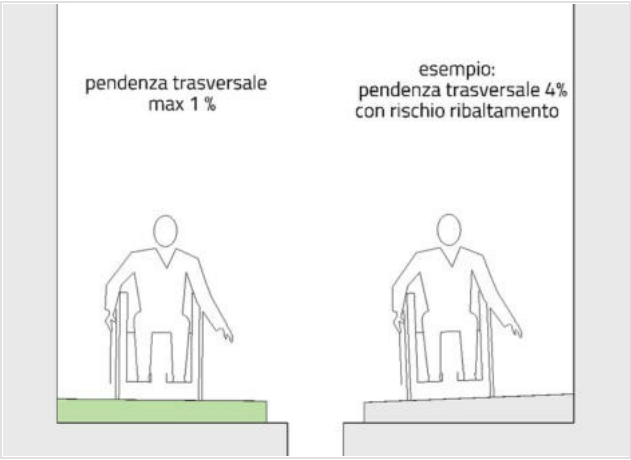

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

17.717 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 170, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02720**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

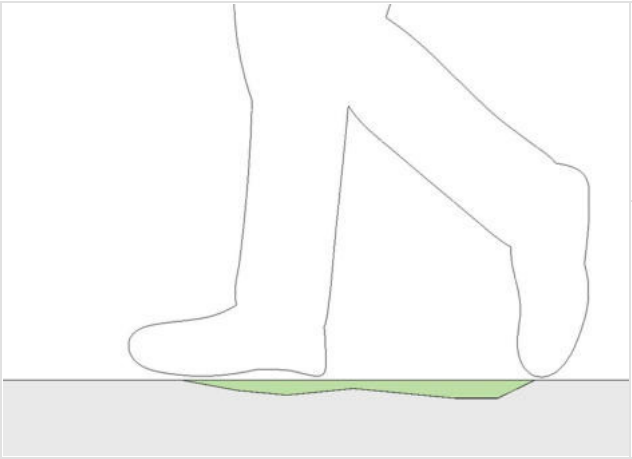

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **1.680 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 154, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02721**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02722	**2**	**Altezza Dislivello** Via Cividale 154, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

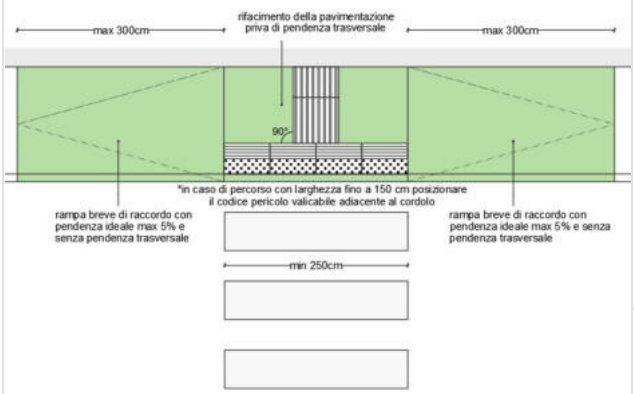

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.388 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Via Cividale 154, Udine	2	E 00FF5-02722

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 290,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02721	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 154, Udine	4388 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

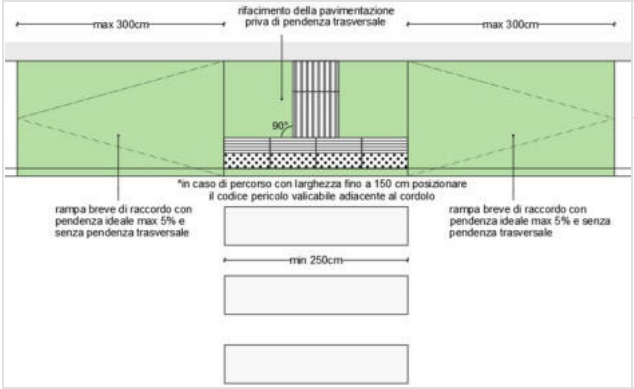

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02721.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 152, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02723**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

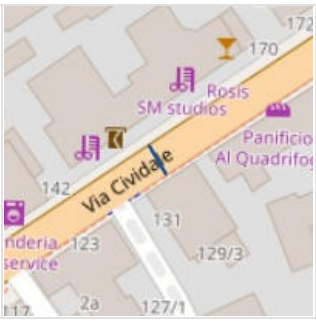

Assenza contrasto cromatico	Si
Dimensioni	X 290,00 cm Y --
Materiale	Porfido a cubetti
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **1.941 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 152-134, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02724**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

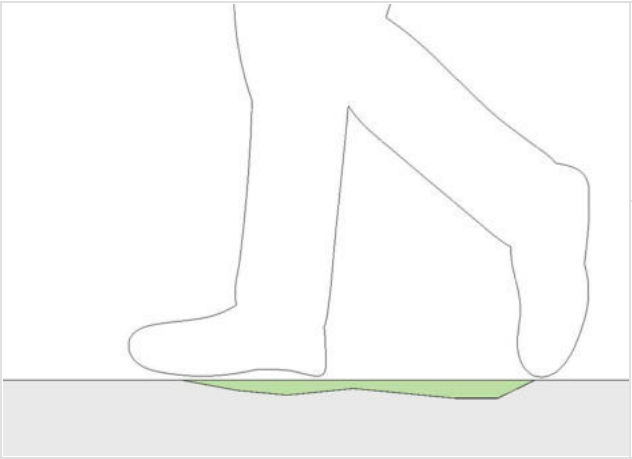

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

13.737 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 140, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02725**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

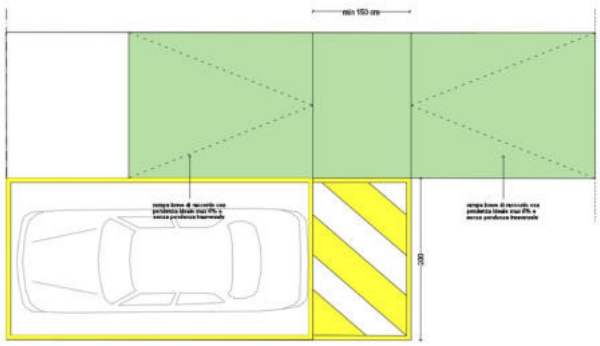

P1448 (modificato)
Rifacimento del percorso pedonale e creazione di parte in piano e rampe longitudinali

Abbassamento del marciapiede e realizzazione di rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Parte in piano per permettere la salita sul marciapiede dallo stallo riservato.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del percorso pedonale e creazione di parte in piano e rampe longitudinali per collegamento allo stallo riservato

2.757 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 134, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02726**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
L'attraversamento è in prossimità dell'accesso ad un'attività commerciale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02727	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02728	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

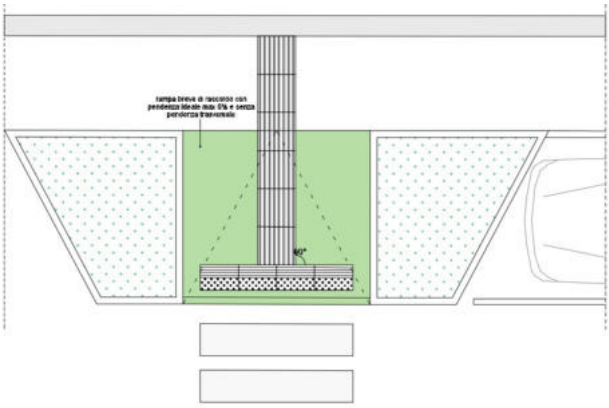

(modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale con pendenza di max 5%. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa rampa di raccordo e segnaletica tattilo-plantare per riduzione lunghezza attraversamento pedonale

5.170 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 134, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02727**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02726	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato **5170 €**
E 00FF5-02728	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

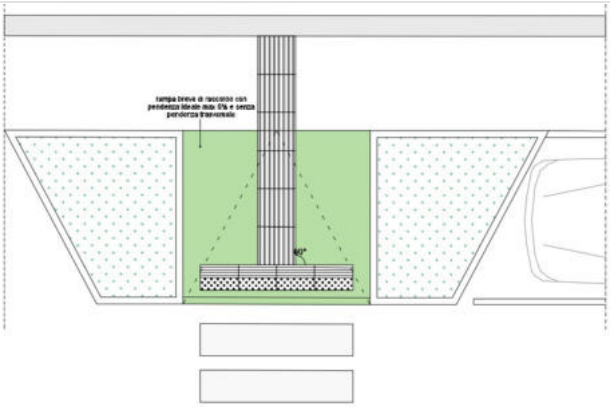

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02726.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 134, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02728**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 880,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02726	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato **5170 €**
E 00FF5-02727	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 134, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

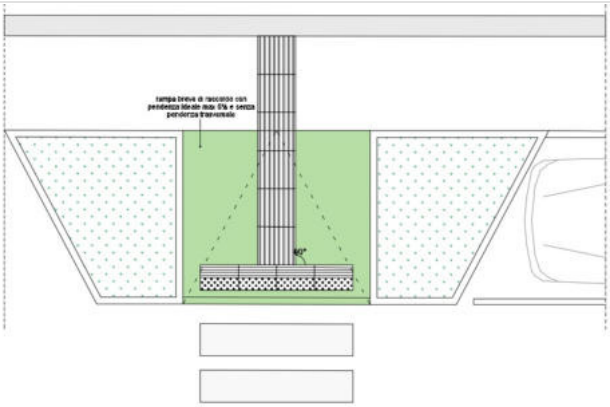

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02726.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 134, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02729**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 185,00 cm	Y 1770,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

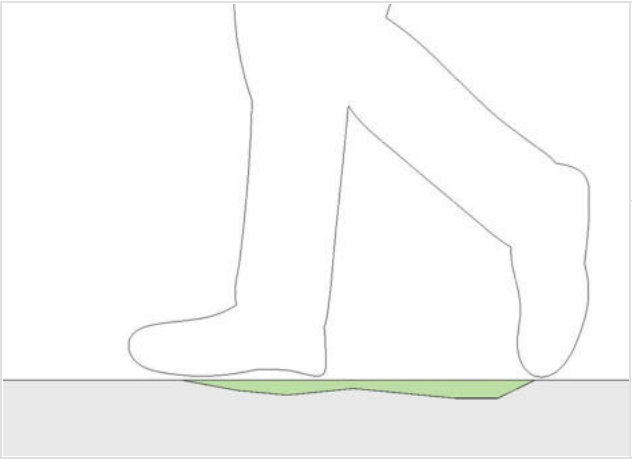

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **5.135 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02730**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 154,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

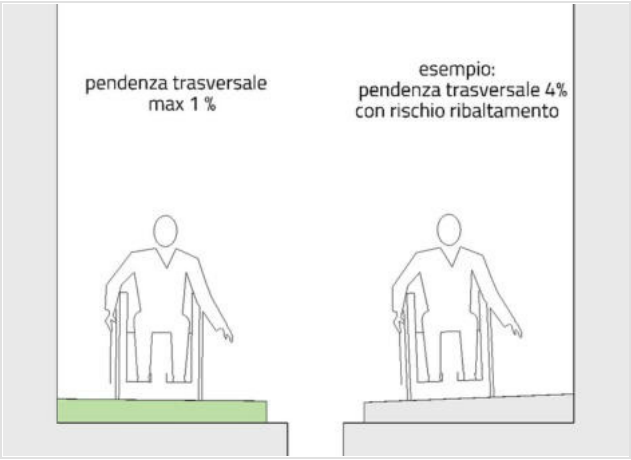

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e della segnaletica tattilo-plantare e sua ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sistemazione e riposizionamento della segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso compresa segnaletica tattilo-plantare

947 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 128, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02731

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	15	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso pedonale pubblico ha una profondità di 160 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

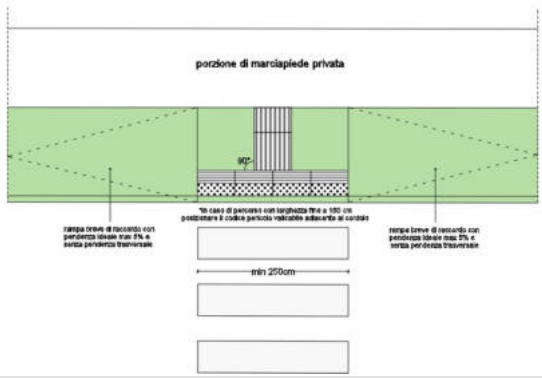

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, nella porzione di marciapiede pubblico, in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.783 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 128, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02732**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo

Non sono presenti elementi di arredo urbano che separano il percorso pubblico dalla proprietà privata si evidenzia che buona parte di questo percorso viene interessata in area privata dagli espositori dell'ortofrutta.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

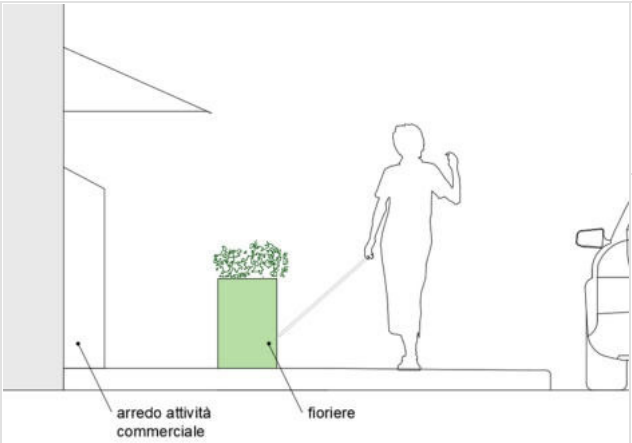

(modificato)
Posizionamento di fioriere per delimitare l'area

Posizionamento di fioriere o elementi di arredo per creare un elemento di guida naturale per le persone con disabilità visiva che divida la porzione di marciapiede pubblico da quello privato.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano

5.000 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02733**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di pensilina con seduta dotata di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

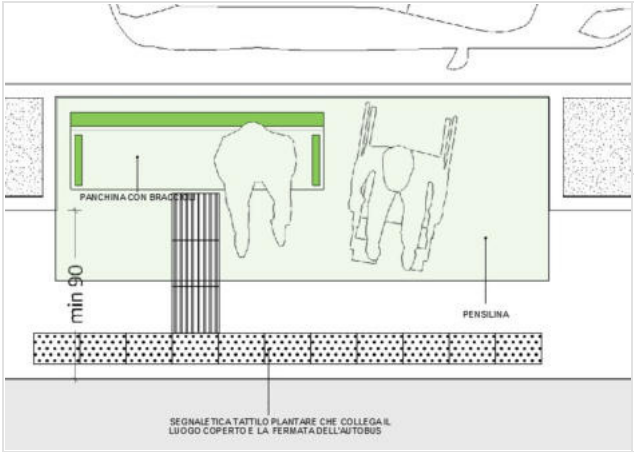

(modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con braccioli e schienale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Via Cividale 122, Udine	2	E 00FF5-02734

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 215,00 cm	Y 2700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02735	2	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Cividale 108, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

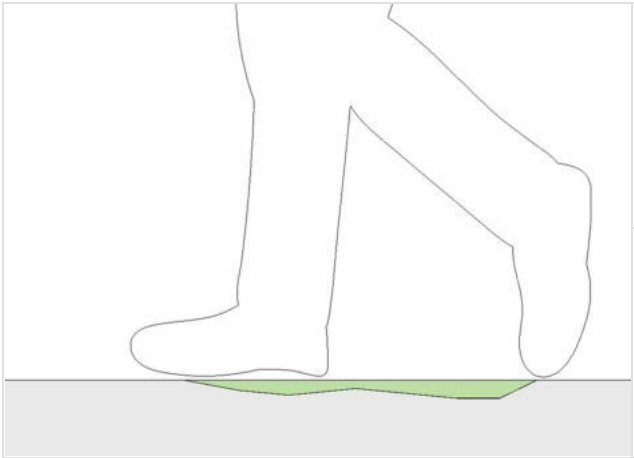

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione in piano con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Eliminazione della breve rampa di raccordo tramite collegamento in piano con le pavimentazione adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **9.132 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 108, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02735**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	**16**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 120,00 cm**	**Y 100,00 cm**
Materiale	**Porfido a cubetti**	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02734	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale 122, Udine	Costo stimato **9132 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

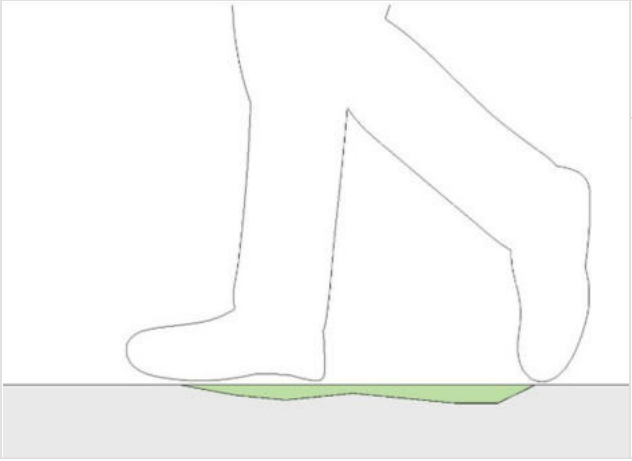

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02734.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 96, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02736**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

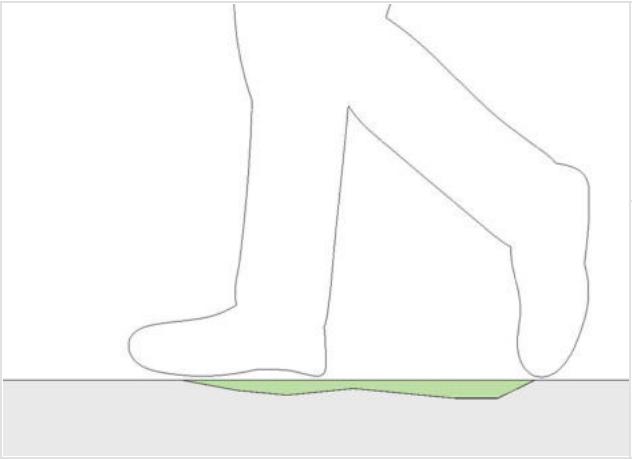

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **982 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 96, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02737**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Altro	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Attraversamento ferroviario.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

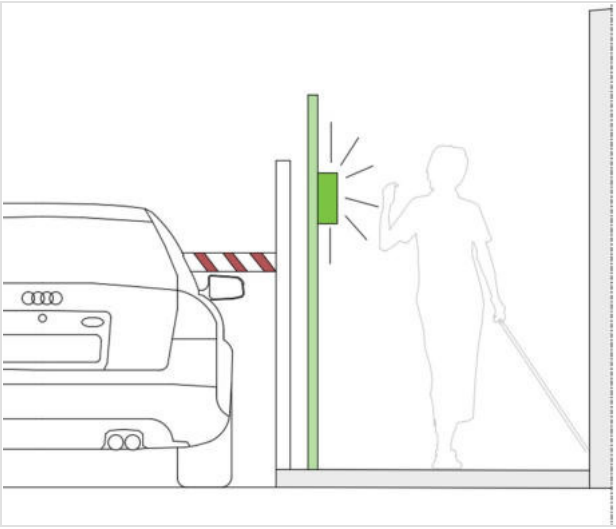

Posizionamento segnalatore acustico

Posizionamento di segnalatore acustico in prossimità del passaggio a livello, come avvisatore di passaggio del treno per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Installazione di segnalatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 92, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02738**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

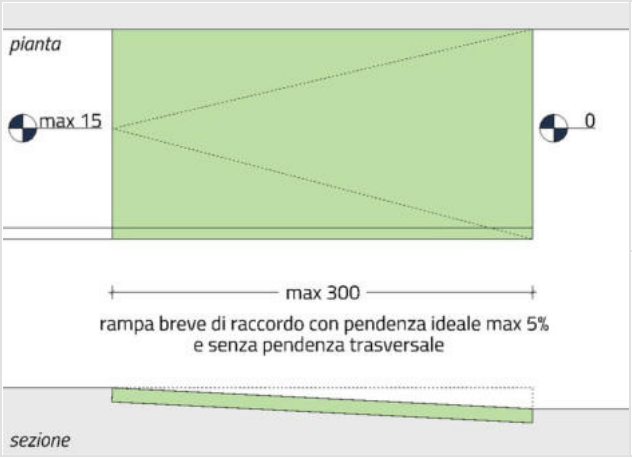

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.481 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo Via Cividale 92, Udine	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02739**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

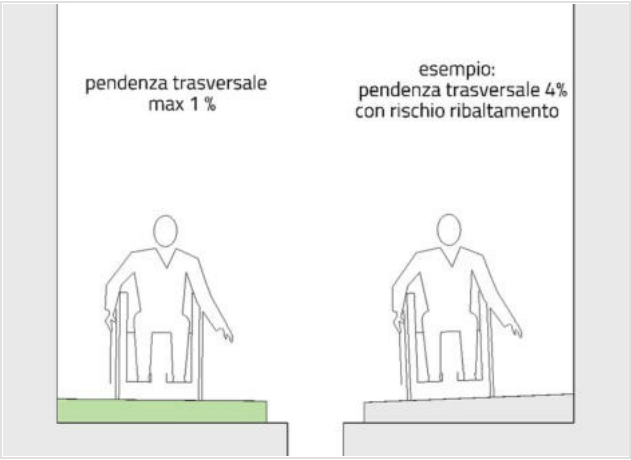

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.362 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 82, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02740**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 520,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

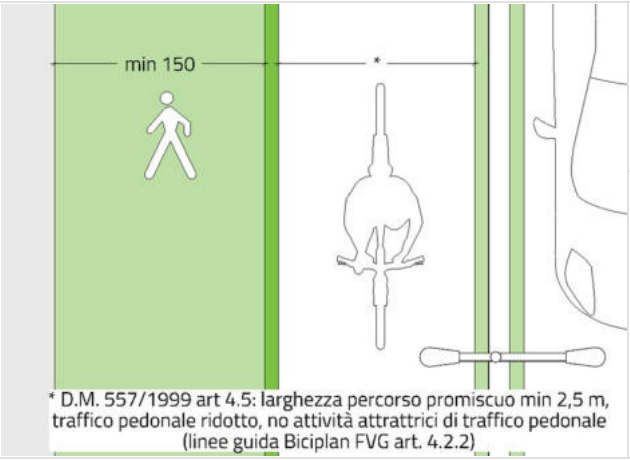

P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

29 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 82, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02741**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

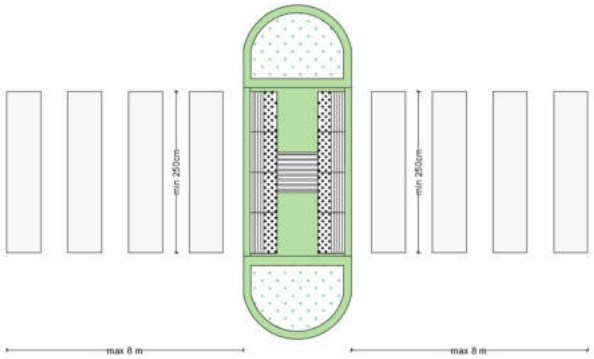

P0770 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale

2.083 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo Via Cividale 63, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-02742

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

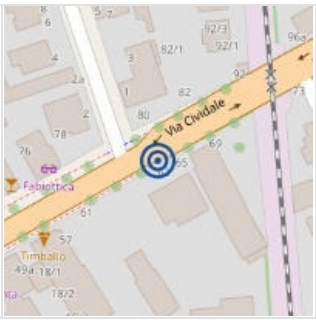

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

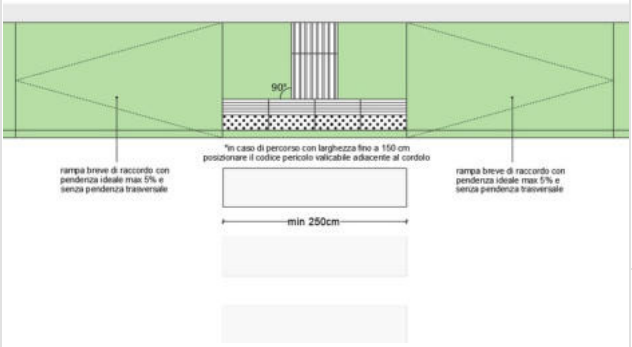

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

7.427 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 65, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02743**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

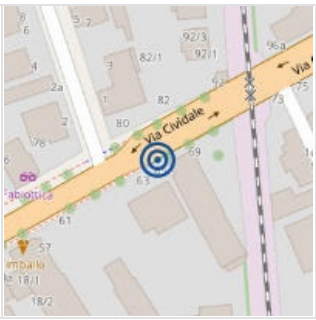

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

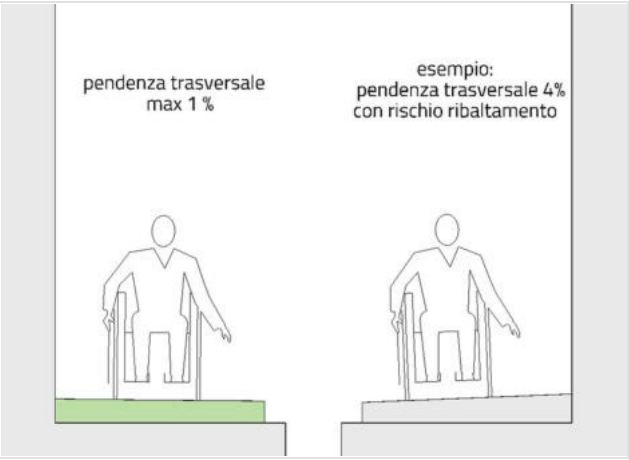

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.875 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 65, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02744**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 360,00 cm	Y 68300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

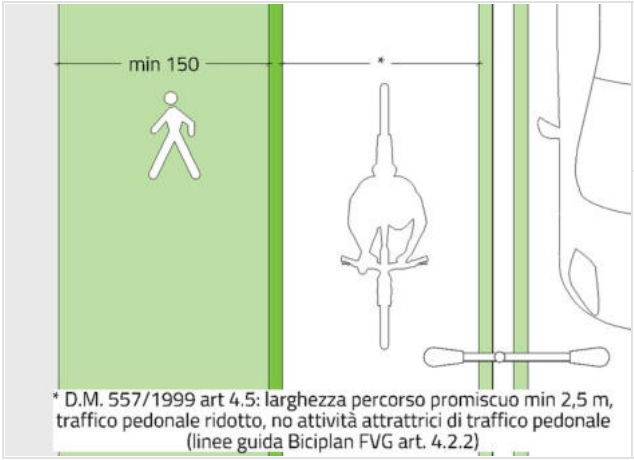

P1069 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

44 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 69, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02745**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Siepe	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

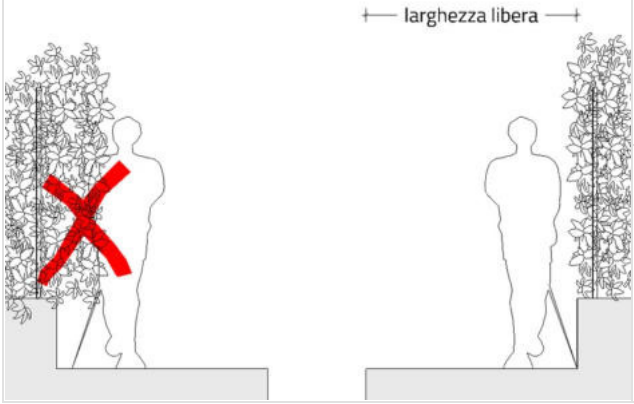

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

263 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 69, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02746

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Altro	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Attraversamento ferroviario.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

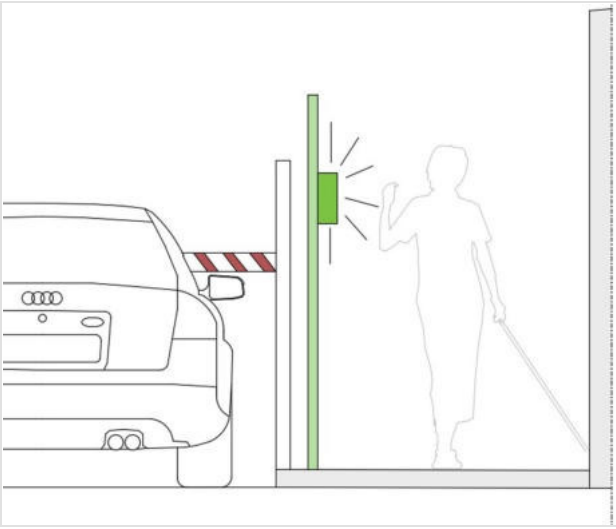

PS1828
Posizionamento segnalatore acustico

Posizionamento di segnalatore acustico in prossimità del passaggio a livello, come avvisatore di passaggio del treno per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Installazione di segnalatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 05 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 69, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02747**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 1800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

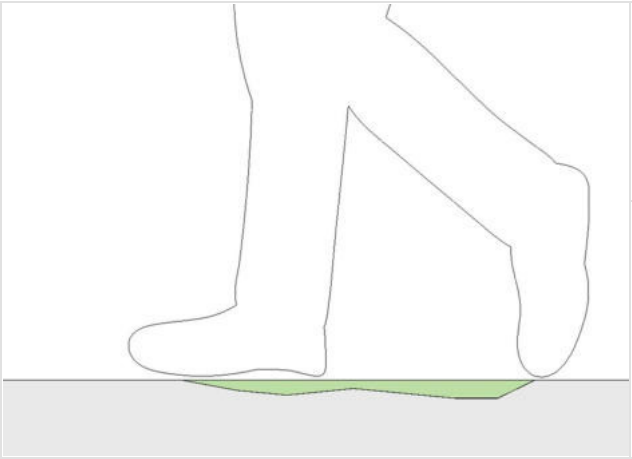

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **3.985 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 73, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02748**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 24 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 220 cm larghezza totale del marciapiede di 246 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

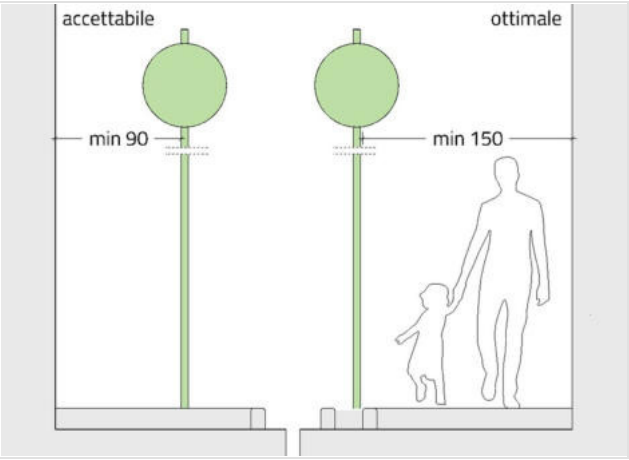

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 79, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02749**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 226,00 cm	Y 140,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

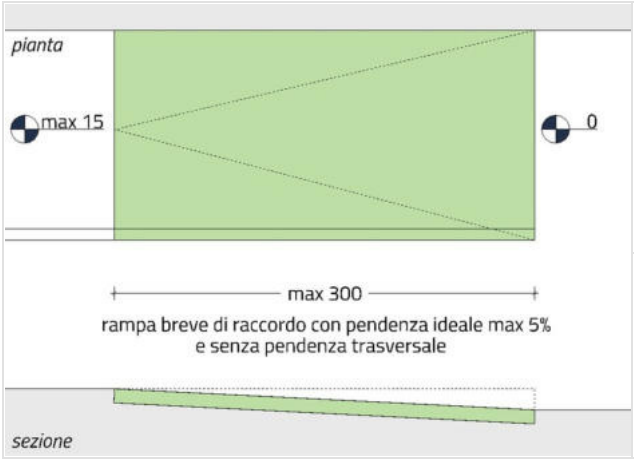

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.357 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 98, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02750**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

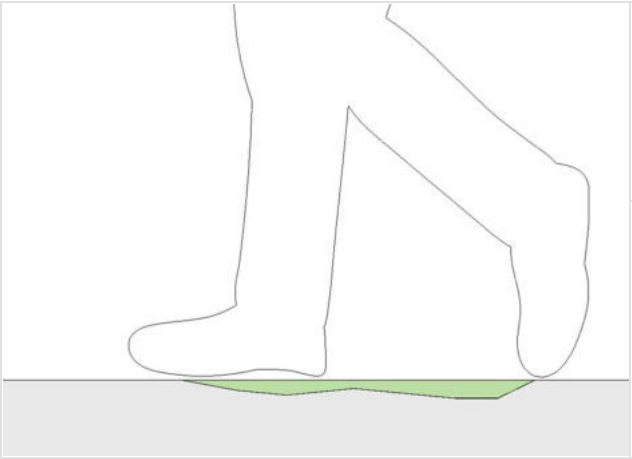

P0688 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

2.044 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 91, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02751**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0965 (modificato)
Sostituzione dell'elemento

Si suggerisce l'integrazione di un elemento di arredo urbano per delimitare maggiormente l'area di occupazione suolo pubblico in funzione dell'attività commerciale rispetto al percorso pedonale pubblico.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano — **250 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 105, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02752**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico priva di pensilina con seduta
.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

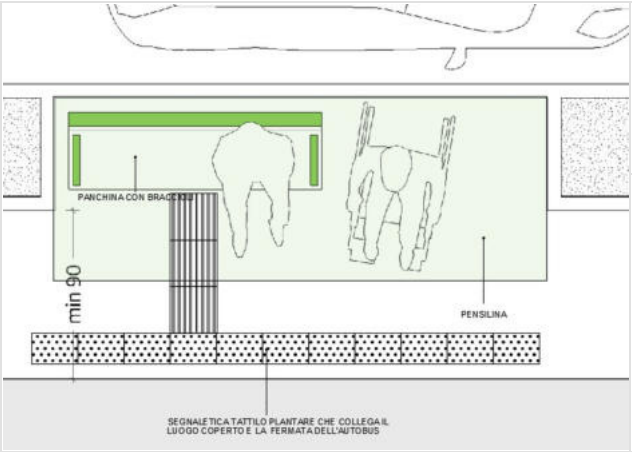

PS1752
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **25 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025

Indirizzo
Via Cividale 117, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02753

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Parlo di segnaletica collocato in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

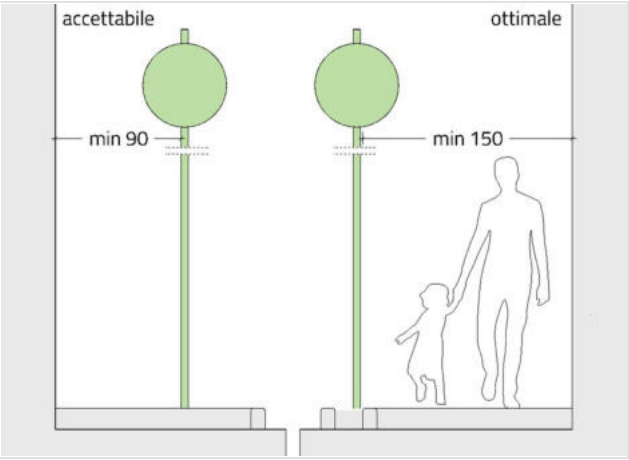

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna all'attraversamento pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna all'attraversamento pedonale, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Via Cividale 119, Udine	3	E 00FF5-02754

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza libera di passaggio di 135 cm larghezza totale di marciapiede di 147 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

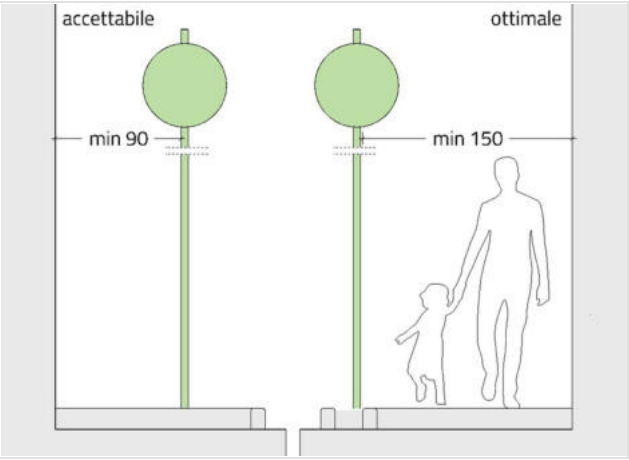

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 121, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02755**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 35,00 cm	Y 145,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0656 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del manufatto edilizio **44 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 121, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02756**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 255,00 cm	Y 6900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

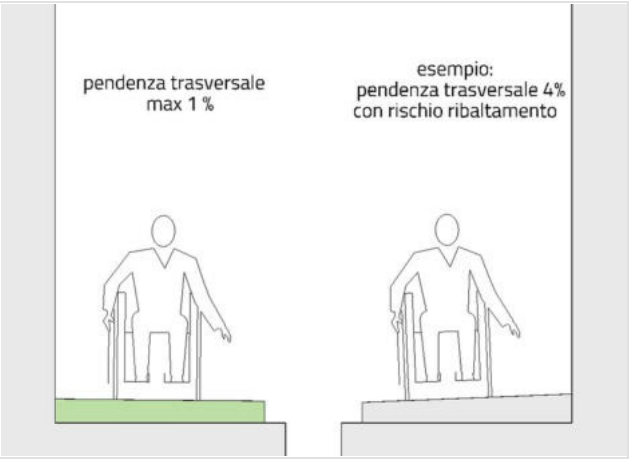

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

19.318 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 159, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02757**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

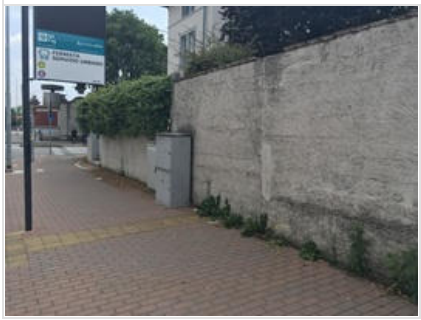

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Fermata del trasporto pubblico non attrezzata con pensilina e seduta dotata di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

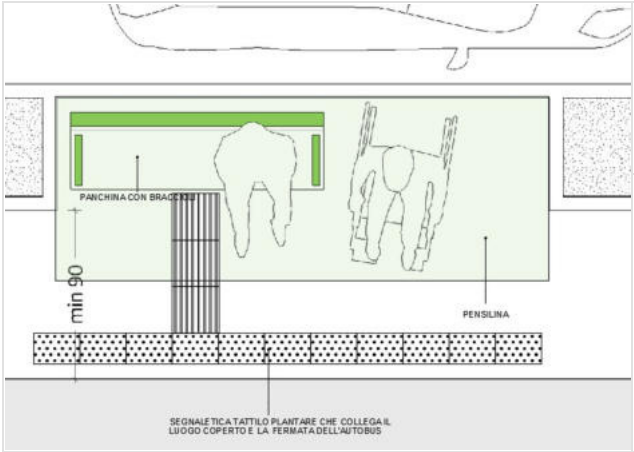

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 159, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02758**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 630,00 cm	Y 365,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

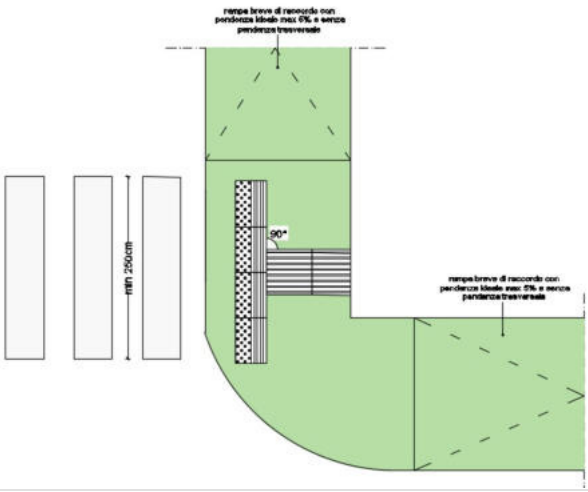

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.662 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 159, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02759**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	**3**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 300,00 cm**	**Y --**
Materiale	**Porfido a cubetti**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



ottimizzare la pendenza del raccordo
in base allo spazio disponibile

P0550 (modificato)
Realizzazione di raccordo per superare dislivello tra 2,5 cm e 5 cm

Realizzazione di raccordo tra le pavimentazioni mediante rifacimento della fascia di contatto per collegare a raso e senza discontinuità le pavimentazioni adiacenti, per superare il dislivello tra 2,5 cm e 5 cm. Lunghezza come intera fascia di contatto pari alla larghezza del dislivello, profondità min 10 cm, privo di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di raccordo **58 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 159, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02760**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02761	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02762	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

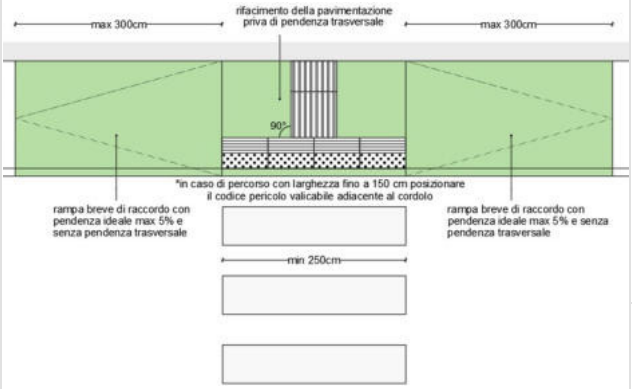

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.165 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Via Cividale 159, Udine	1	E 00FF5-02761

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02760	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato **4165 €**
E 00FF5-02762	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

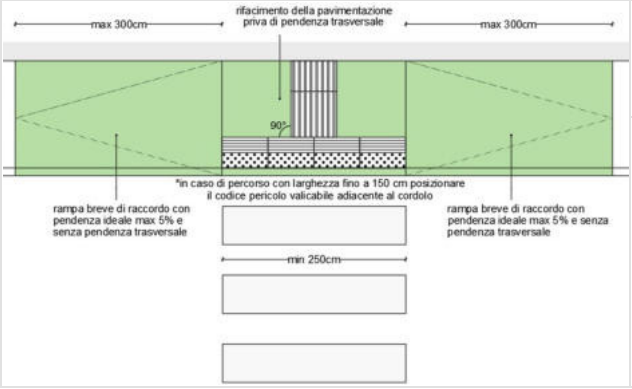

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02760.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 159, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02762**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02760	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato **4165 €**
E 00FF5-02761	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattile plantare** Via Cividale 159, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

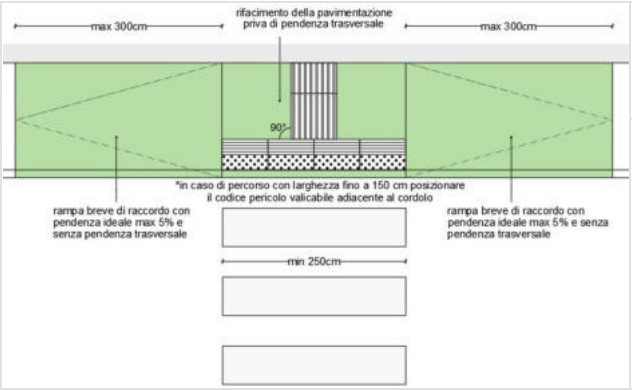

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02760.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02763**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 395,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02711	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato **10485 €**
E 00FF5-02764	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02713	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02712	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattile plantare** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

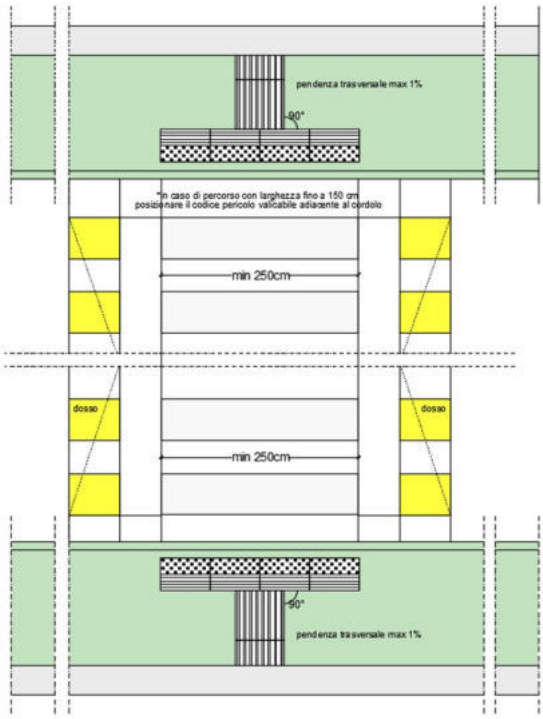

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02711.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02764**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02711	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato **10485 €**
E 00FF5-02763	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02713	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02712	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Cividale 208, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

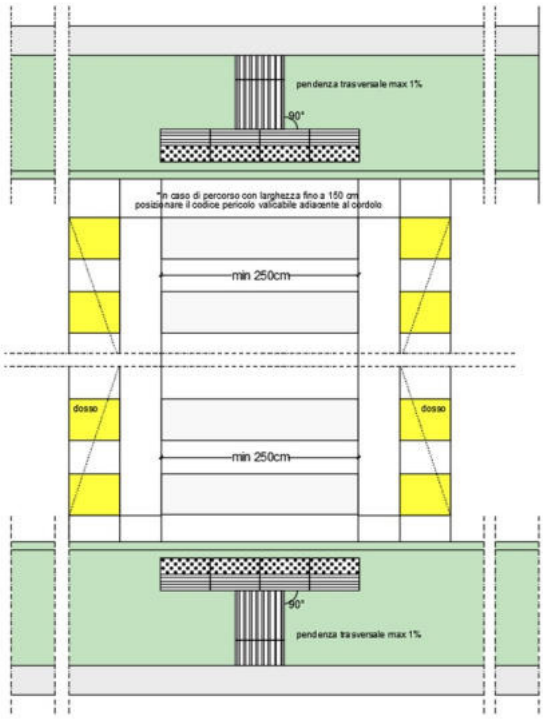

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02711.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02765**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 37 cm tra palo interasse e muro. Distanza di 23 cm da muro.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0657 (modificato)
Eliminazione dell'elemento

Si suggerisce l'eliminazione del palo in quanto non assolve più alcuna funzione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del palo **573 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02766**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

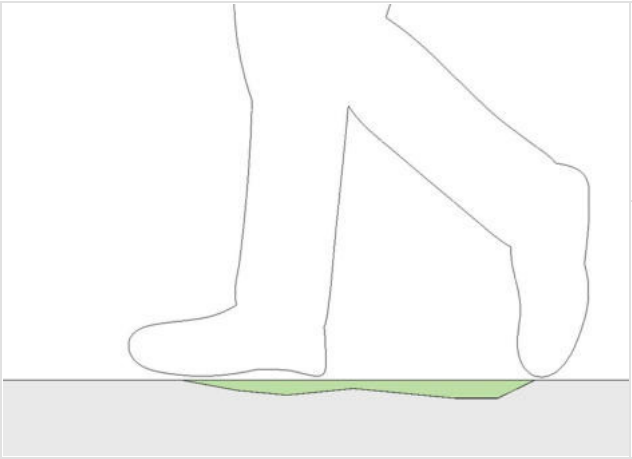

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

340 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02767**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

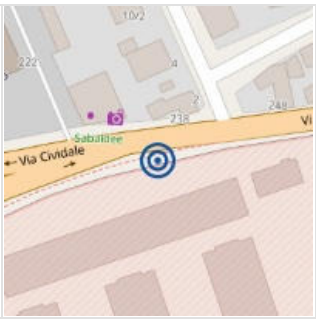

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02768	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02770	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02771	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

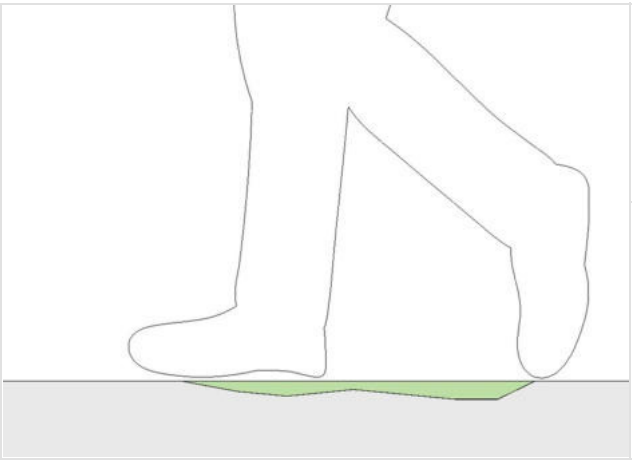

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale

496 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02768**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

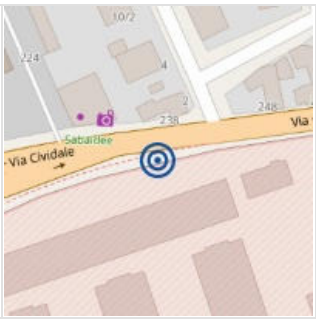

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato **496 €**
E 00FF5-02772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02771	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02770	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

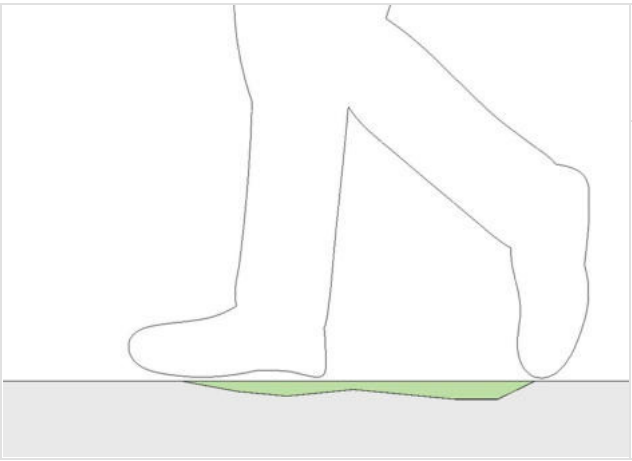

PS1738 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02767.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02769**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

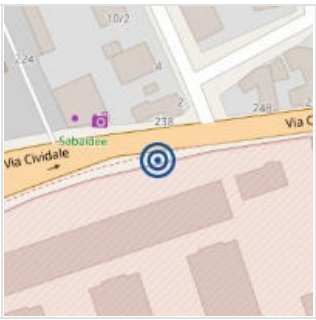

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

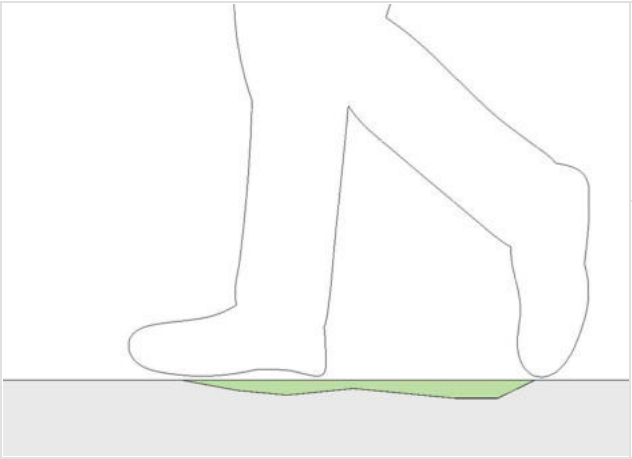

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

298 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02770**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

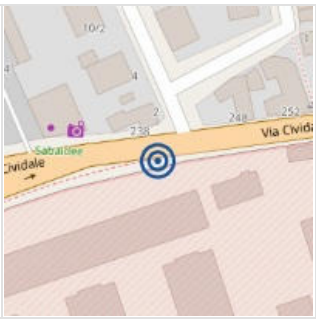

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato **496 €**
E 00FF5-02772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02771	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02768	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

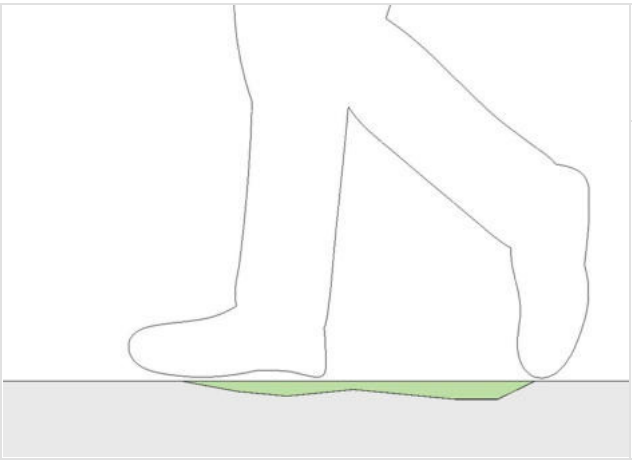

PS1738 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02767.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02771**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

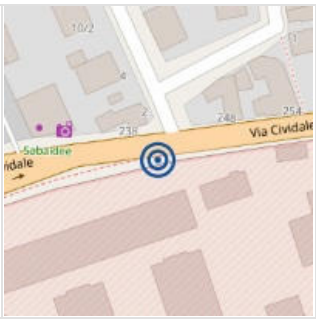

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato **496 €**
E 00FF5-02772	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02770	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02768	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

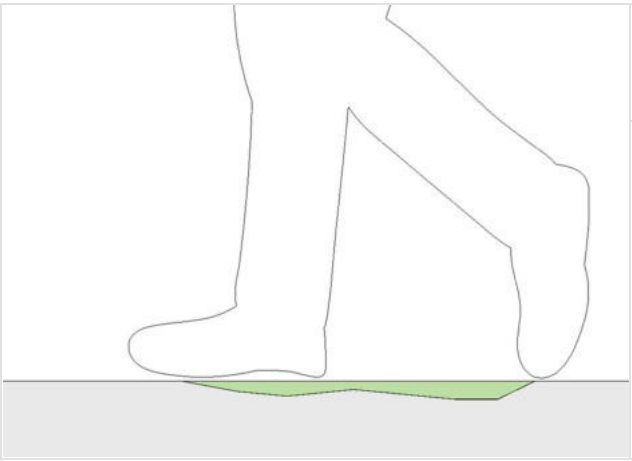

PS1738 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02767.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02772**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

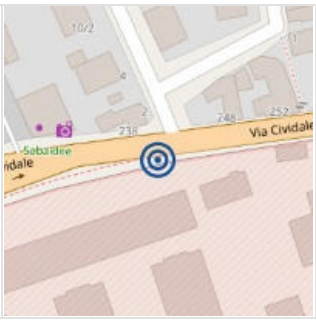

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 10,00 cm	Y 10,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02767	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato **496 €**
E 00FF5-02771	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02770	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02768	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

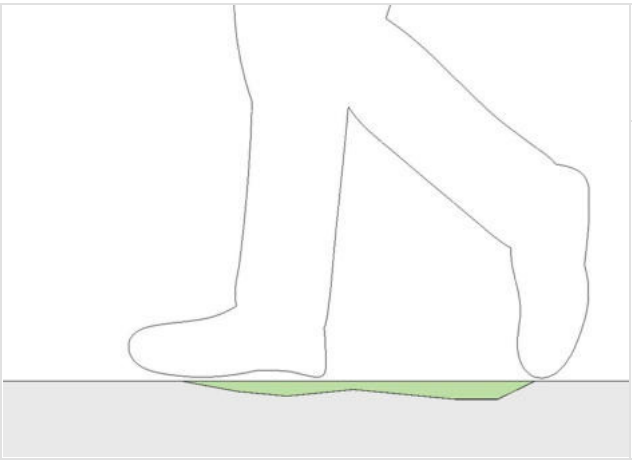

PS1738 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02767.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02773**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

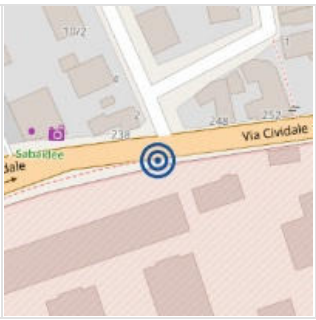

Cordolo	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Manutenzione del cordolo

Manutenzione del cordolo per ripristino continuità pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione del cordolo **271 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02774**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

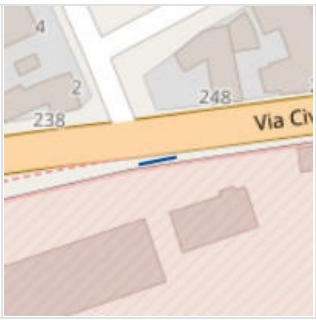

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 222,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

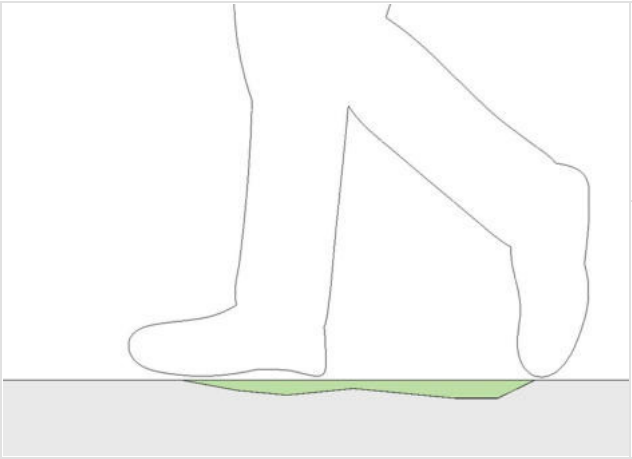

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **2.348 €**

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02775**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 222,00 cm	Y 9890,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02776	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

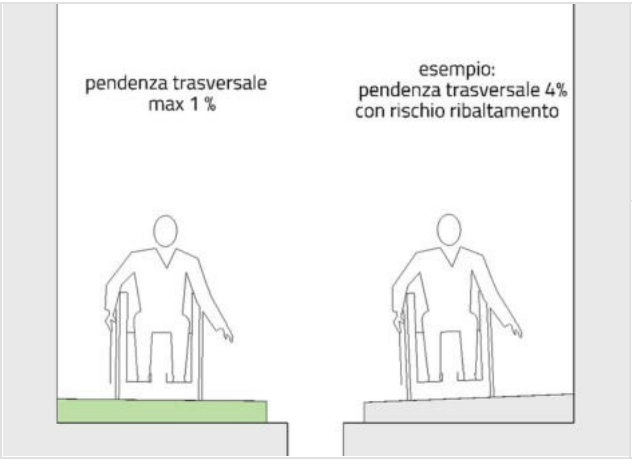

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

23.192 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02776**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02775	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	**23192 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

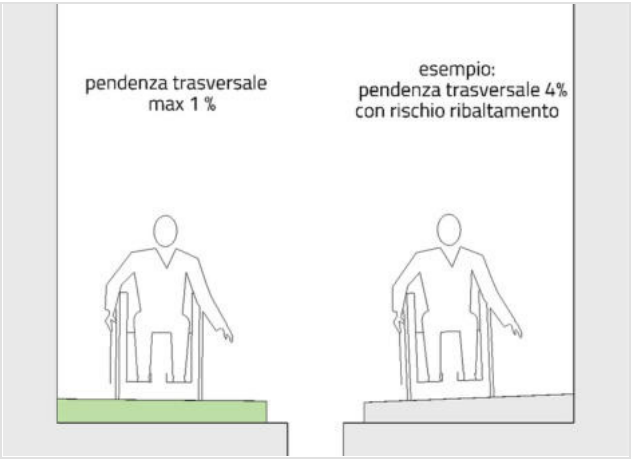

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02775.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02777**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 17,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 52 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

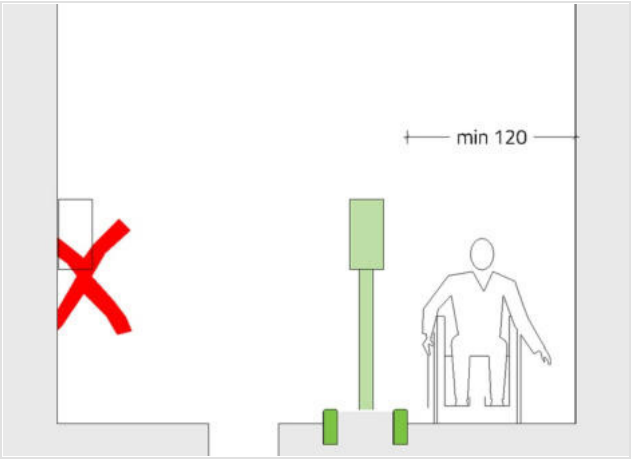

P0653 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del tabellone pubblicitario e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento dei plinti interrati.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02778**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 17,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 52 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

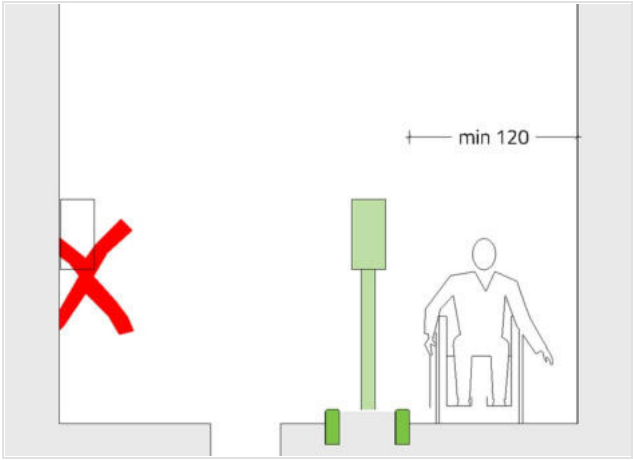

P0653 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del tabellone pubblicitario e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento dei plinti interrati.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02779**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02780	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Cividale, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

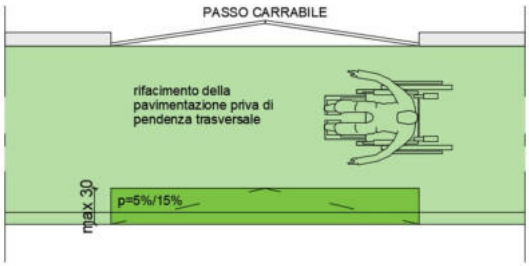

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.113 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02780**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02779	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Cividale, Udine	Costo stimato **3113 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

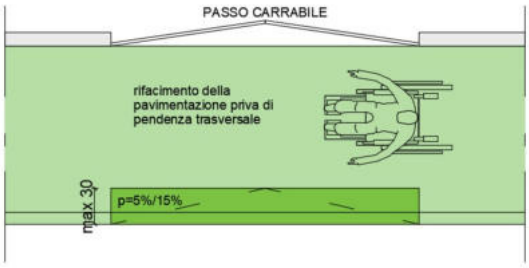

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02779.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02781**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

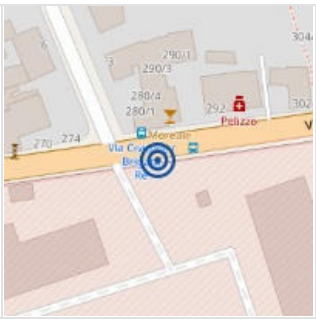

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 17,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 52 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

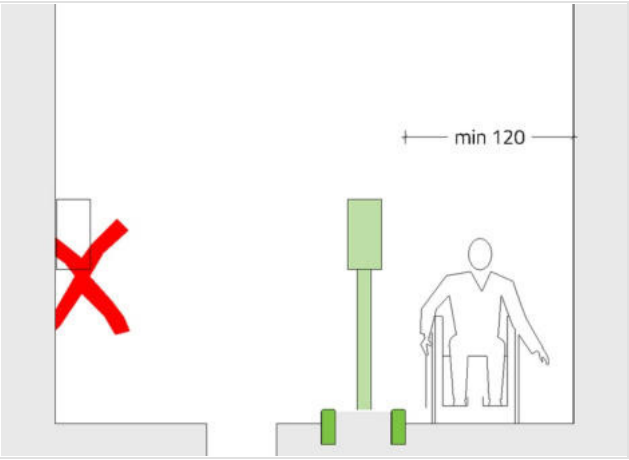

P0653 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del tabellone pubblicitario e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento dei plinti interrati.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02782**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

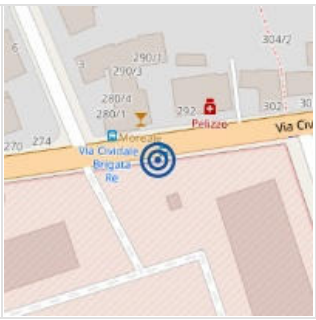

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 254,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

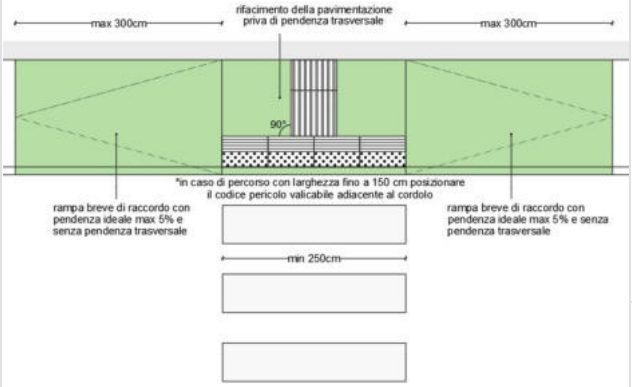

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.869 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02783**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

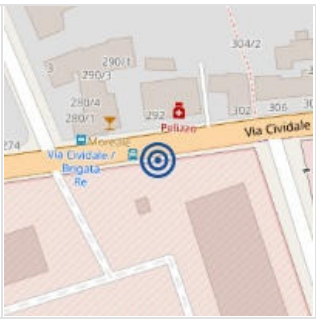

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	--	

Note relative al rilievo

Fermata del trasporto pubblico priva di pensilina e seduta con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

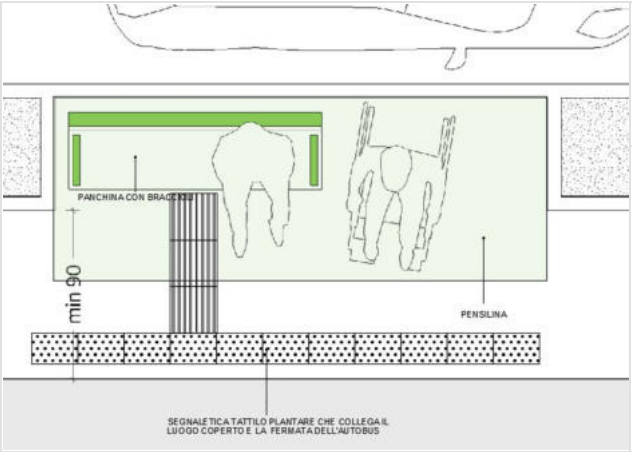

PS1751 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.190 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **25 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02784**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 17,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza dal muro di 52 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

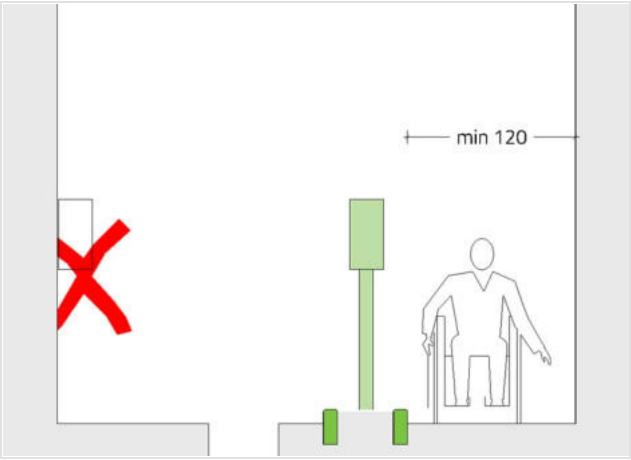

P0653 (modificato)
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del tabellone pubblicitario e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento dei plinti interrati.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > VIA CIVIDALE > Via Cividale

Rilevatore **0130** Data Rilievo **21 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 03 Settembre 2025	Indirizzo **Via Cividale 119, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03441**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo-plantare interrotta da chiusino.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

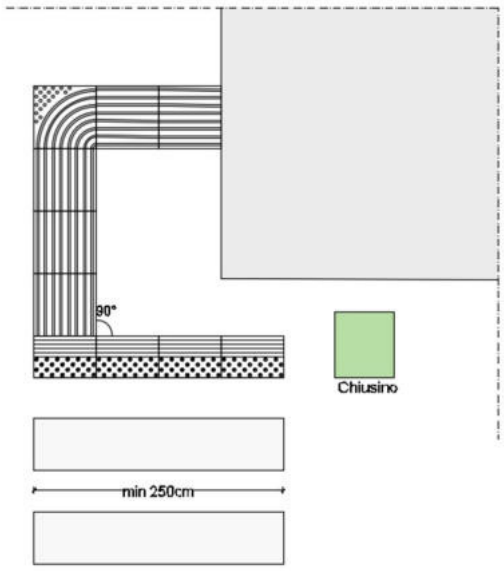

(modificato)
Spostamento del chiusino

Spostamento del chiusino in posizione esterna alla segnaletica tattilo-plantare.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del chiusino **1.000 €**

14

CHIAVRIS

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Forni di Sotto 11, Udine	1	E 00FF5-02786

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02787	1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	--
E 00FF5-02788	1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	--
E 00FF5-02791	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

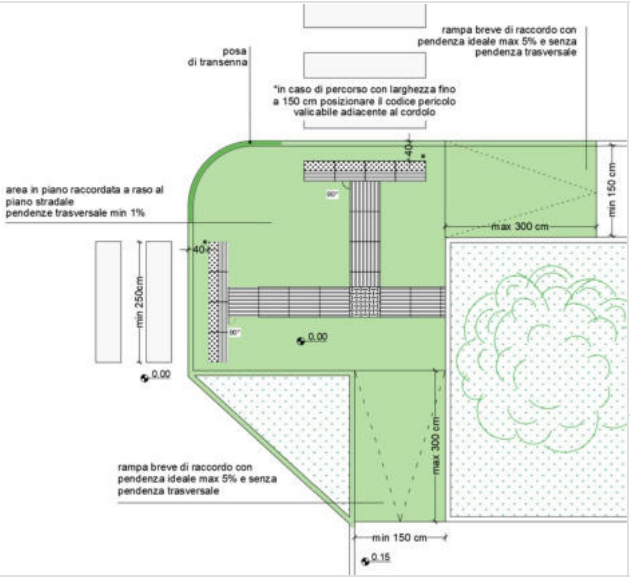

(modificato)
Demolizione del marciapiede e realizzazione di area in piano antistante l'attraversamento

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere un'area in piano e priva di discontinuità antistante l'attraversamento con pendenza trasversale max 1% Realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Sostituzione o posa di nuove transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.
Sostituzione transenne esistenti lato fermata del bus mediante realizzazione di aiuola.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo e transenne parapedonali

14.074 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02787**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 650,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02786	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato **14074 €**
E 00FF5-02791	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02788	LIV. 1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

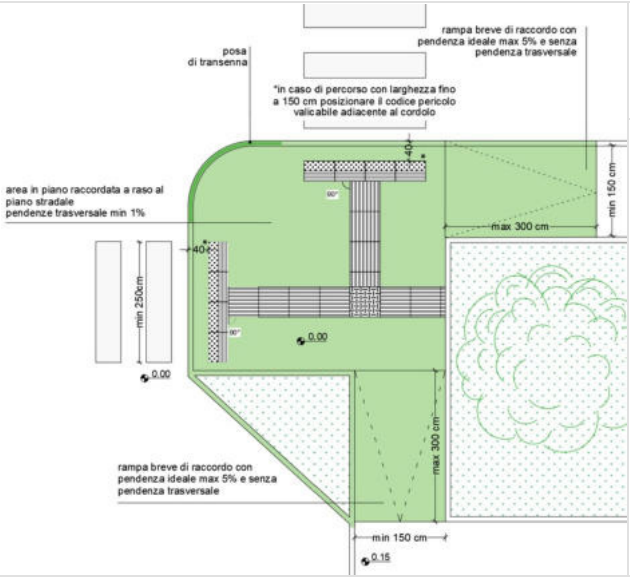

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02786.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Forni di Sotto 11, Udine	1	E 00FF5-02788

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 300,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02786	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	14074 €
E 00FF5-02791	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	--
E 00FF5-02787	1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

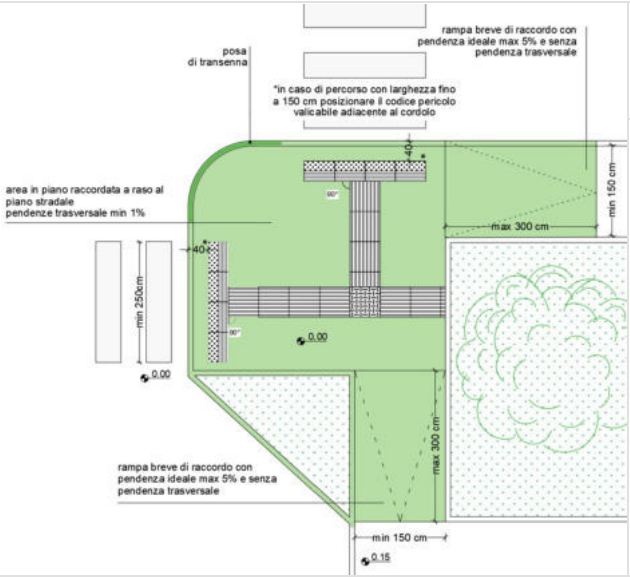

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02786.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02789**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Grigliato non ortogonale al verso di marcia	Si	
Dimensioni	X 45,00 cm	Y 45,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

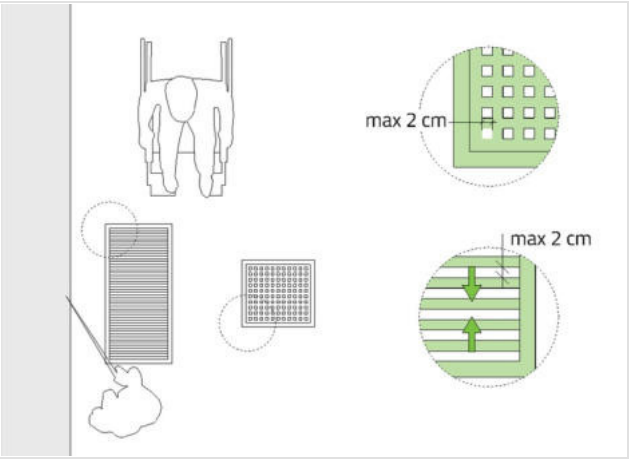

P0619 (modificato)
Rotazione del grigliato in posizione ortogonale al verso di marcia

Rotazione del grigliato in posizione ortogonale rispetto al verso di marcia e con fori di larghezza massima di 2 cm.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della caditoia **343 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02790**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

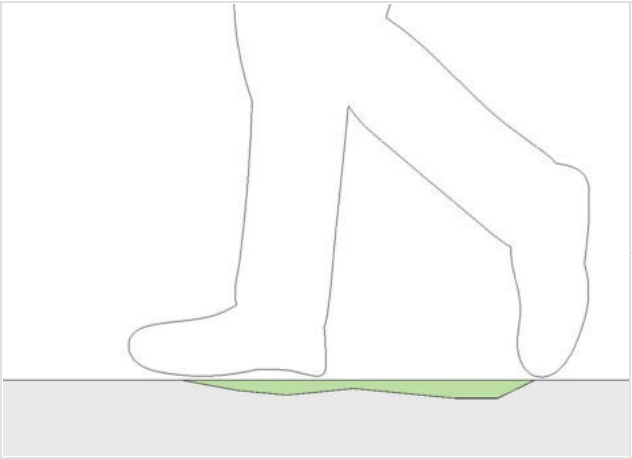

PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

2.562 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02791**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 460,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02786	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato **14074 €**
E 00FF5-02788	LIV. 1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02787	LIV. 1	**Inadeguato Arredo urbano** Via Forni di Sotto 11, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

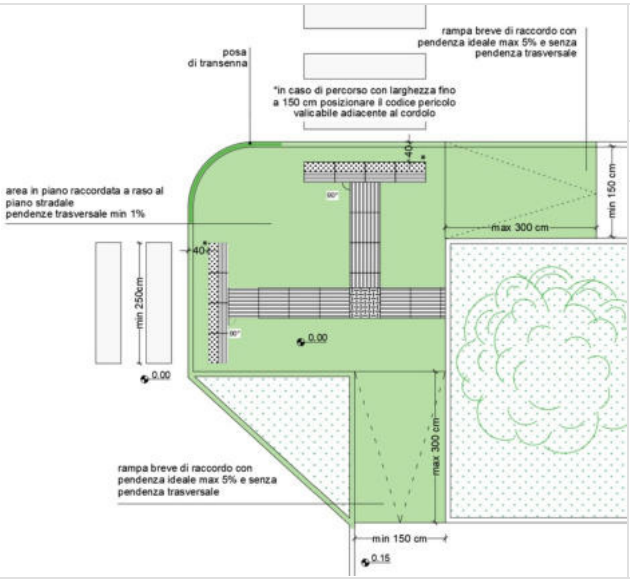

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02786.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02792**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

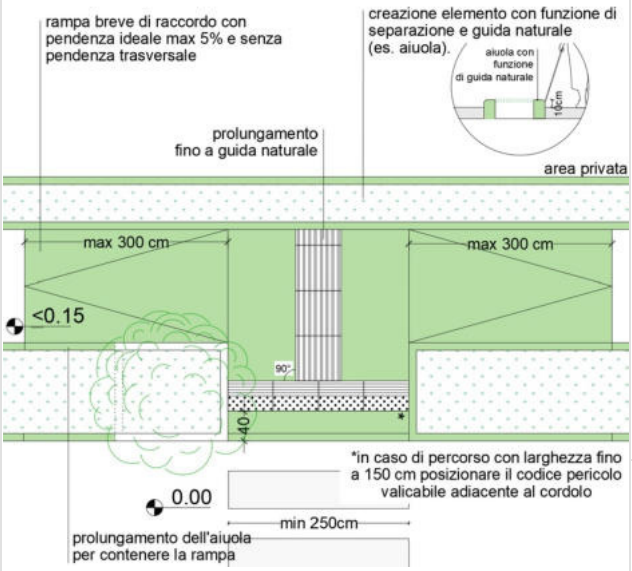

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo- plantare

Rifacimento della pavimentazione del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento del marciapiede del tratto di percorso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.340 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02793**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02794	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 7, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

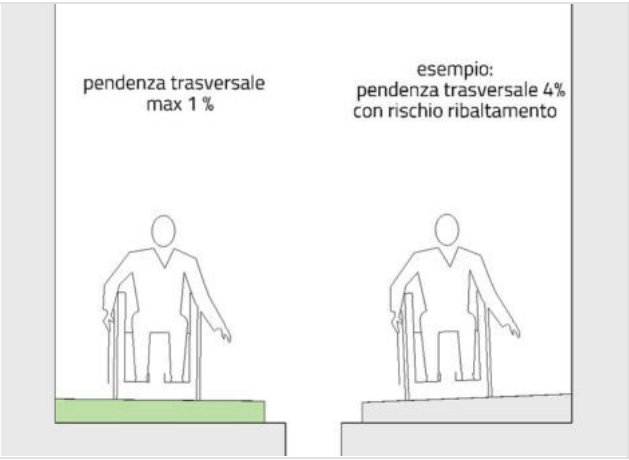

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.882 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02794**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02793	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 7, Udine	**10882 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

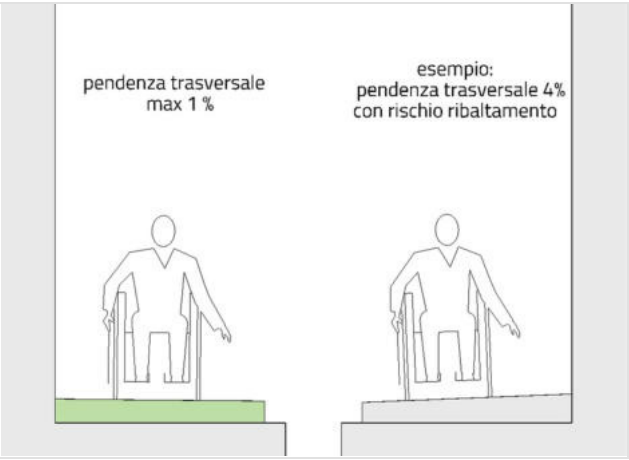

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02793.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02795**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 3200,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

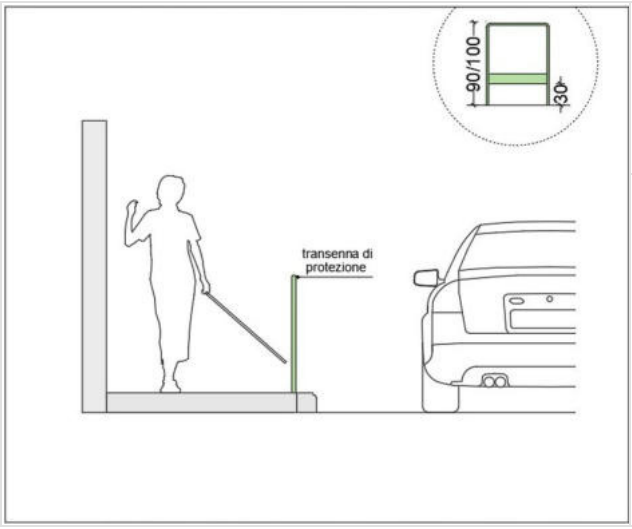

PS1832 (modificato)
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne

Rimozione dei paletti parapedonali e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione di paletti parapedonali con transenne **14.890 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02796**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 14 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 316 cm. Larghezza totale del marciapiede di 343 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

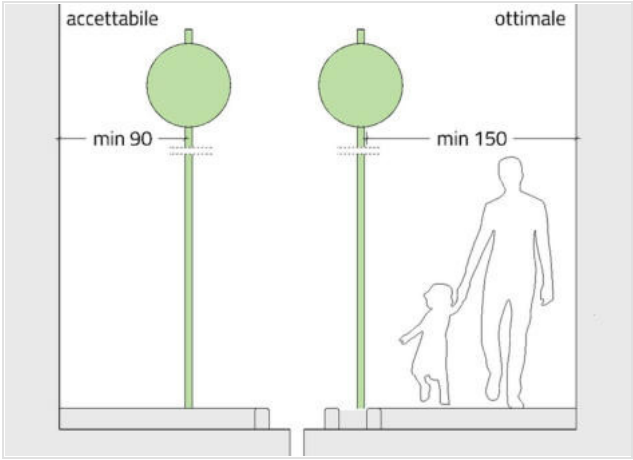

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 7-48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02797**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 11200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

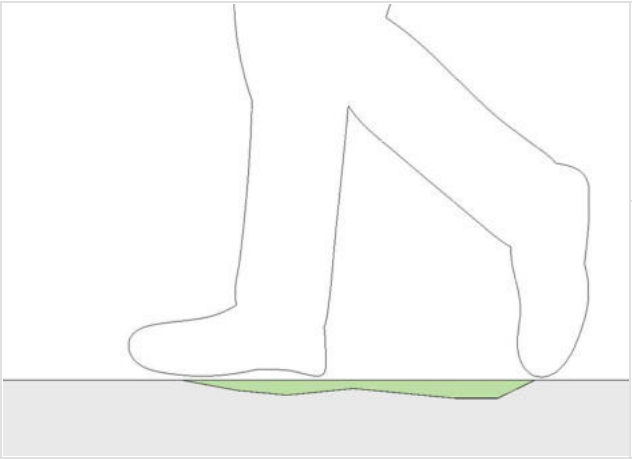

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

51.294 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 48, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02798**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

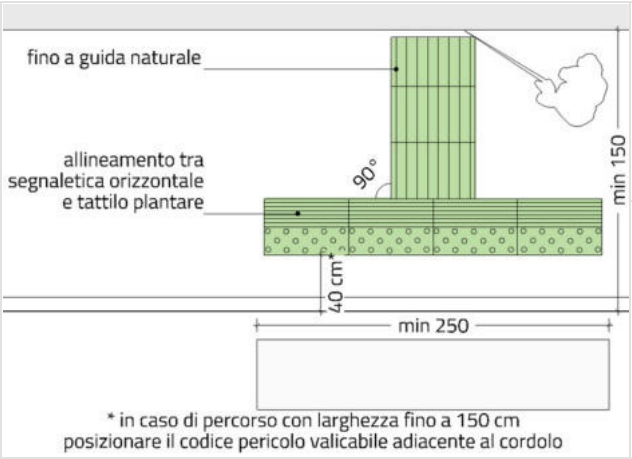

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **842 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 48, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02799**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	10	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1020,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

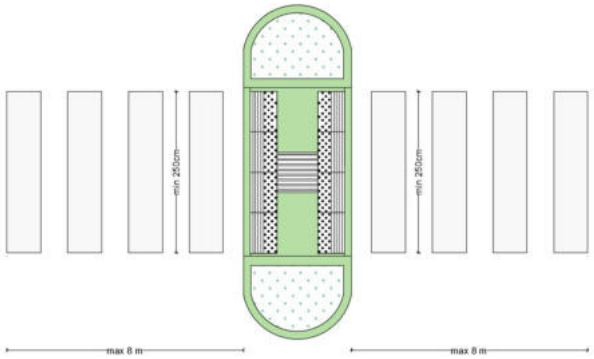

P0770 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale **3.441 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02800**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 520,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02801	2	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattile plantare** Via Forni di Sotto 46, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

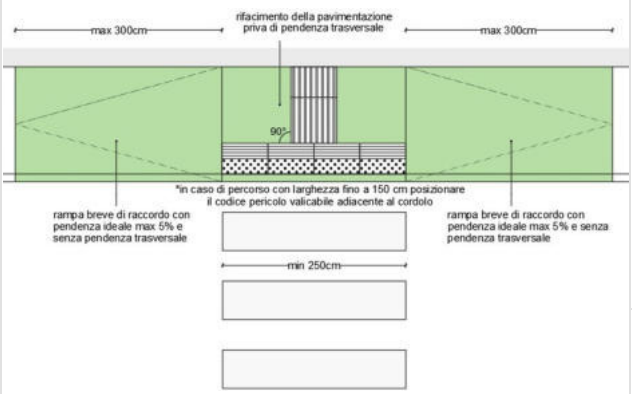

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

8.894 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02801**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 520,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02800	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 46, Udine	Costo stimato **8894 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

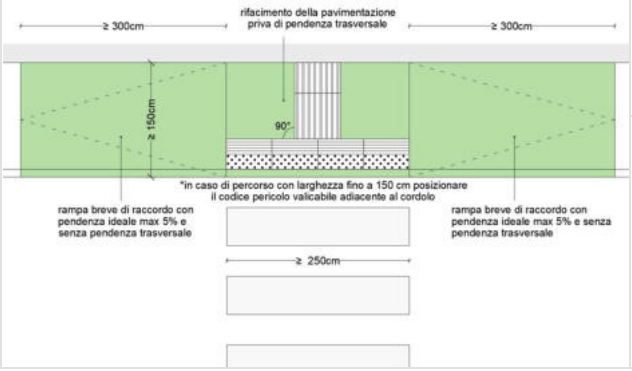

PS1897 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della scheda n 00FF5-02800.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02802**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

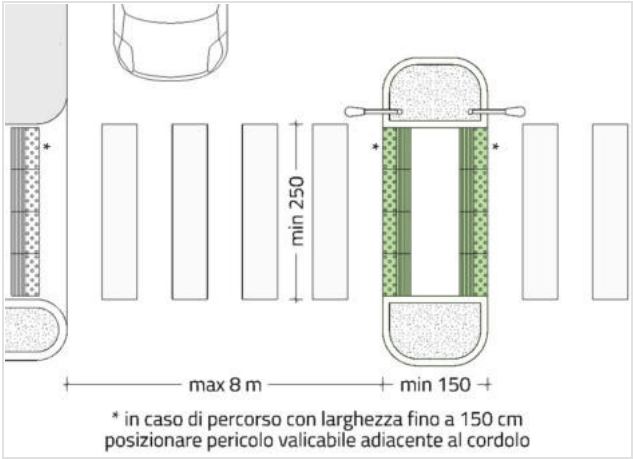

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale

1.677 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02804**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

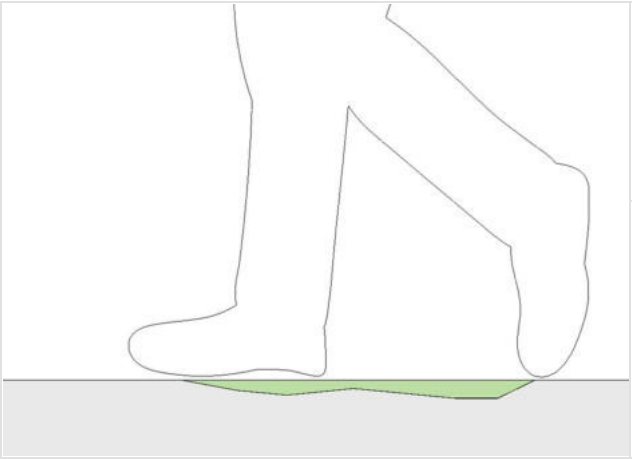

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione 2 — **242 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46-36, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02805**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 305,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

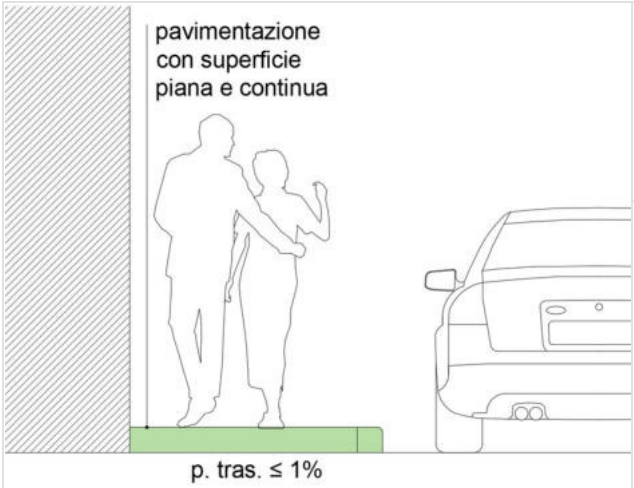

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

40.710 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 34, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02806**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 600,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità. Si suggerisce l'integrazione degli elementi di arredo urbano che vadano a colmare i vuoti tra le fioriere già esistenti che delimitano l'area esterna dell'attività commerciale.

STIMA DEL COSTO
Integrazione degli elementi di arredo urbano **750 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 46-36, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02807**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Transenna	Si	
Dimensioni	X --	Y 4000,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

Spostamento in area esterna al percorso pedonale (transenna)

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti e mantenere la larghezza libera min 120 cm.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 44, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02808**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo	Si	
Dimensioni	X 12,00 cm	Y 12,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletto parapedonali centrale al percorso pedonale. Non percepibili da persona con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 36, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02810**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02811	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 36, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

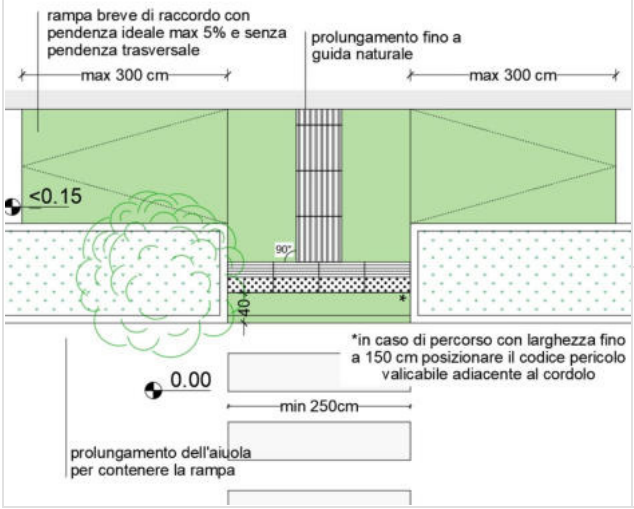

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.798 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Forni di Sotto 36, Udine	1	E 00FF5-02811

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 305,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02810	1	**Altezza Dislivello** Via Forni di Sotto 36, Udine	5798 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

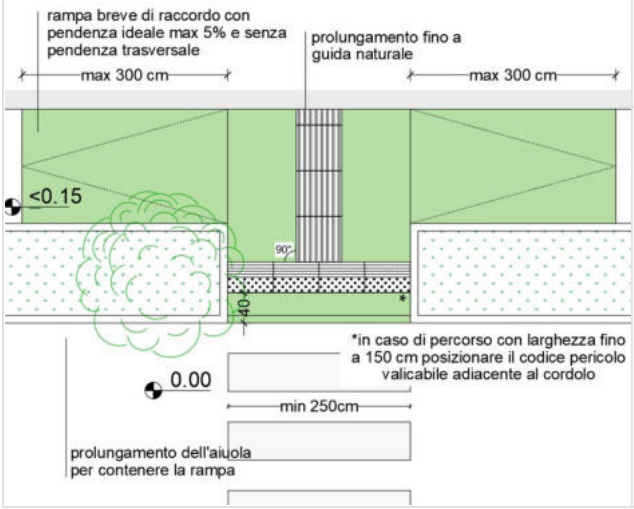

PS1850 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02810.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 36, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02812**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

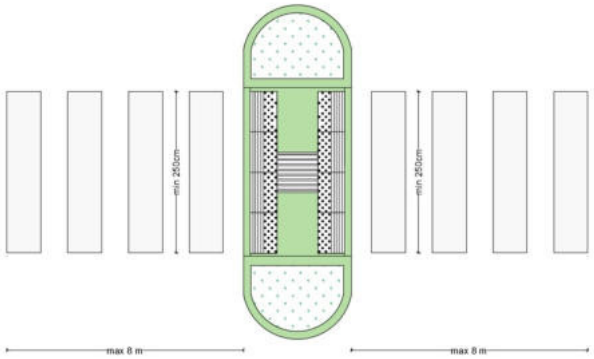

PS2055 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale

3.441 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 36, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02813**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli. Larghezza del marciapiede di 305 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

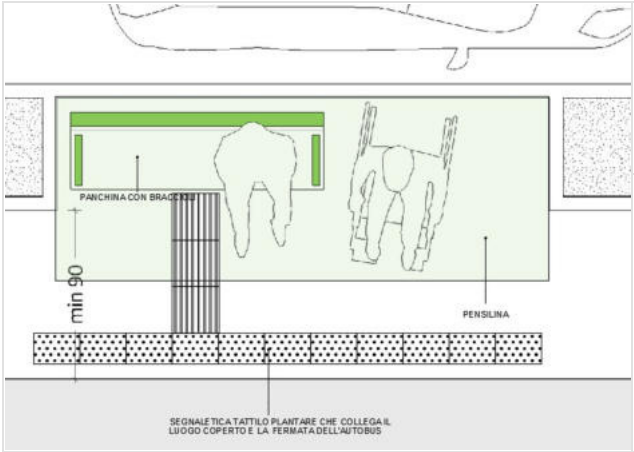

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 28-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02814**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

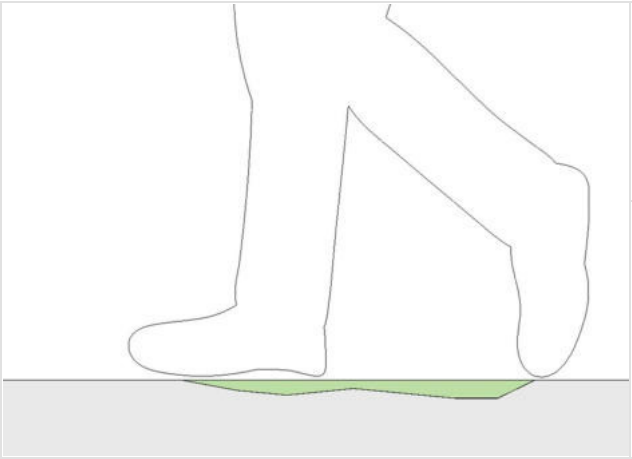

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

40.842 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 24-18, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02815**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 2450,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Guida naturale troppo bassa.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

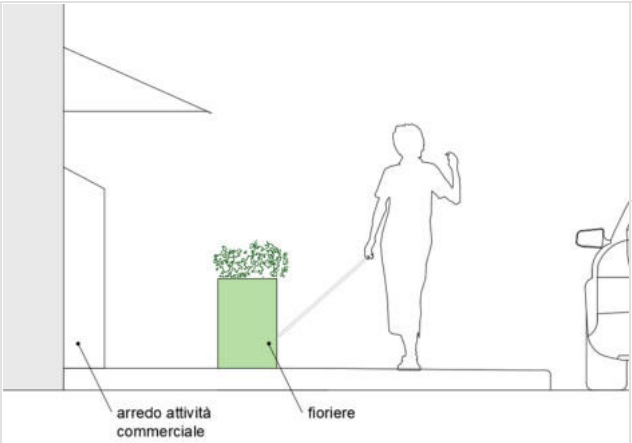

(modificato)
Realizzazione di protezione del percorso

Realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di protezione del percorso **3.000 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02816**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 11,00 cm	Y 11,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
Pluviale sporgente di 17 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2009
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione o sostituzione dell'ostacolo sporgente **163 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02817**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02818**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 207,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02819	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

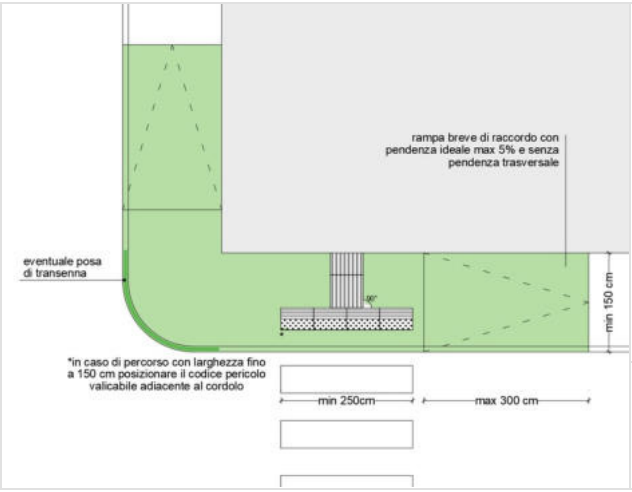

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto percorso con realizzazione di area in piano antistante l'attraversamento

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.159 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02819**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 207,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02818	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 6, Udine	**6159 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

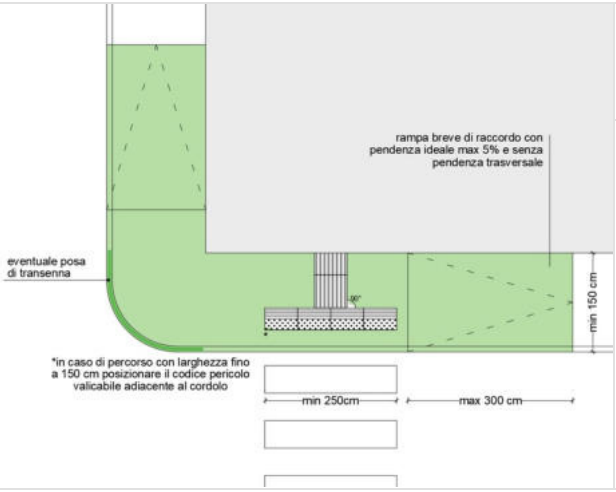

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02818.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02820**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

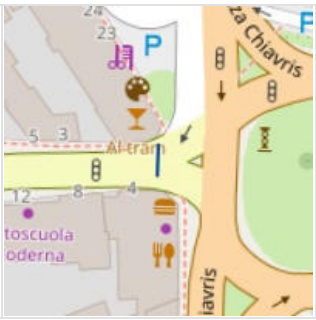

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1090,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

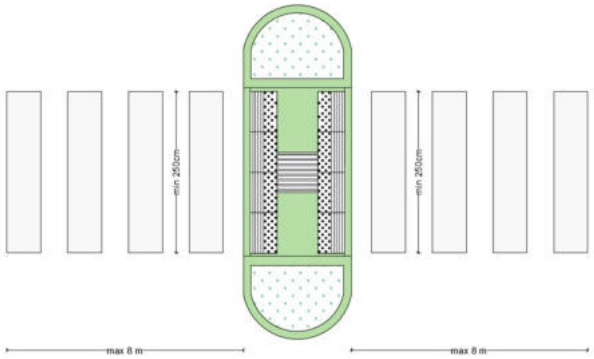

PS2055 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale **3.913 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02821**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

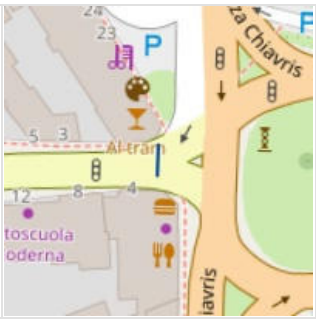

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1090,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02822	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Forni di Sotto 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

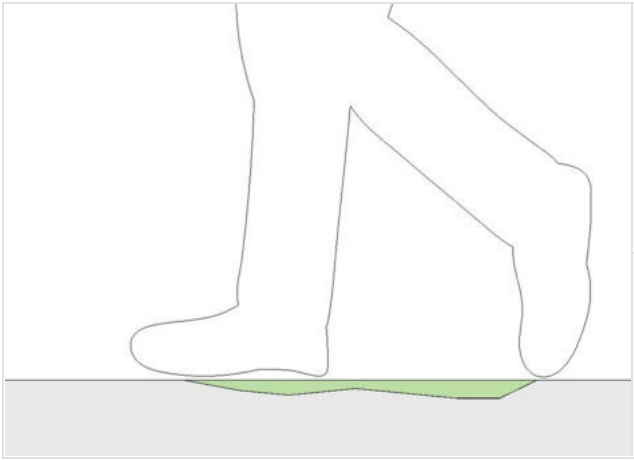

PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

890 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02822**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

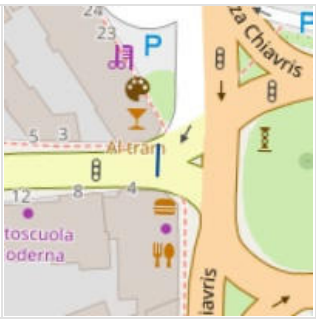

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1090,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02821	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 6, Udine	Costo stimato **890 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

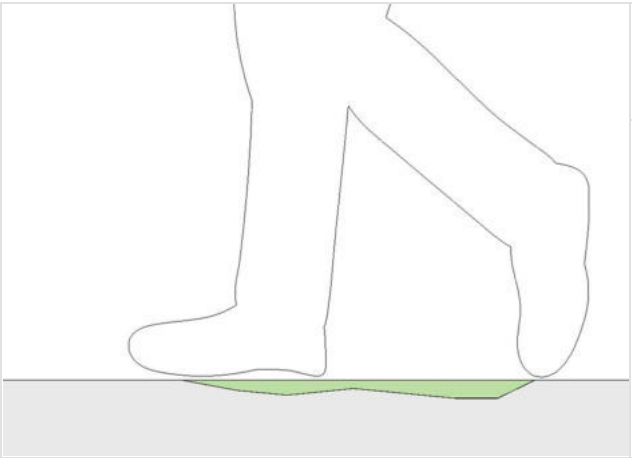

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02821.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02900**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 315,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02901	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

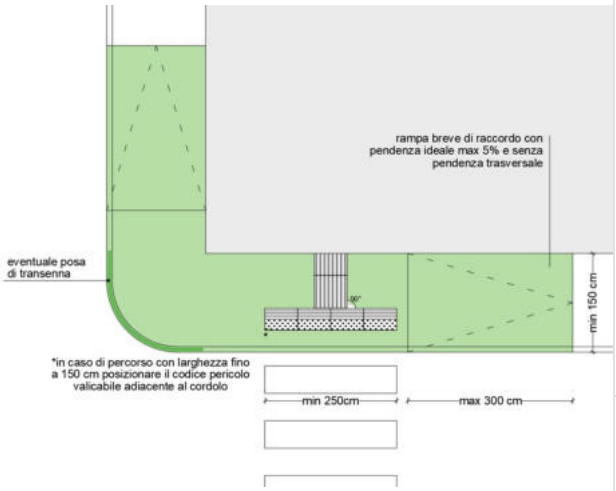

(modificato)
Rifacimento del tratto percorso con realizzazione di area in piano antistante l'attraversamento

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Si raccomanda di verificare l'ortogonalità dell'attraversamento rispetto al margine del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

7.610 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02901**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 315,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02900	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 1, Udine	Costo stimato **7610 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

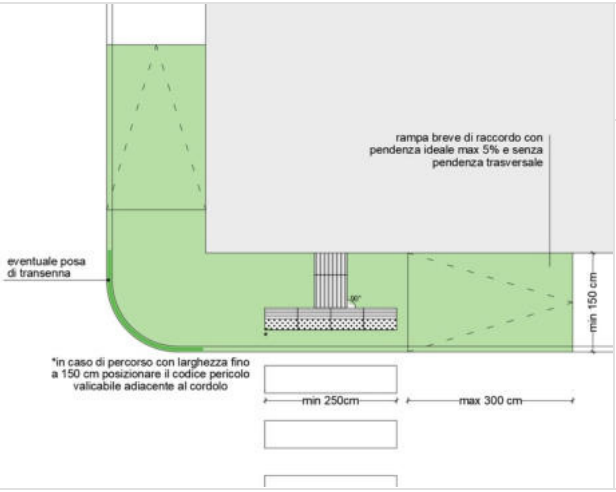

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02900.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 1, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02902**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **IMPIANTO SEMAFORICO**

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 1-71, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02903**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 22200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02904	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 1-71, Udine	**51066 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

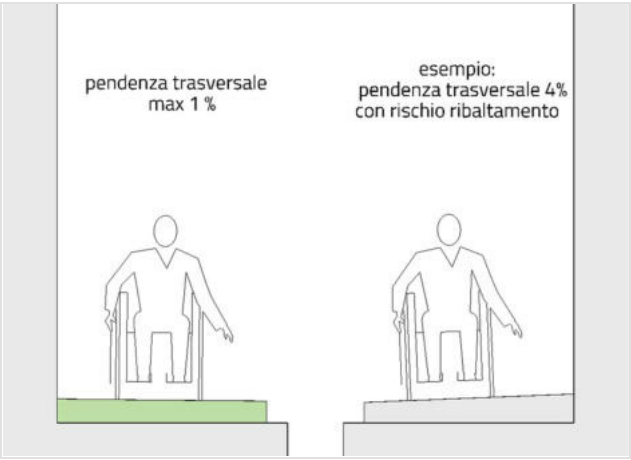

PS1882 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02904.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo Via Forni di Sotto 1-71, Udine	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02904**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 22200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02903	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 1-71, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

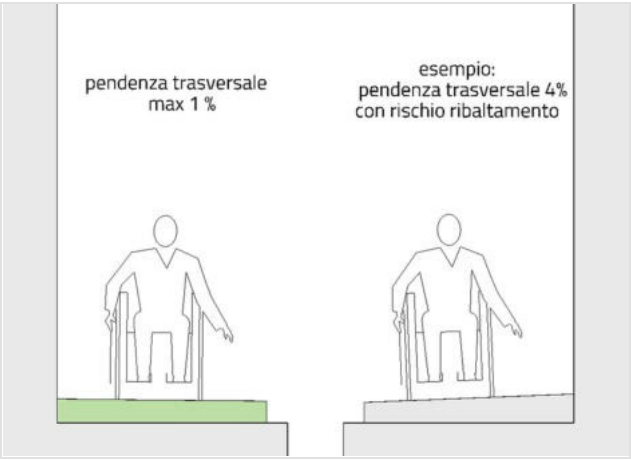

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

51.066 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 17, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02905**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

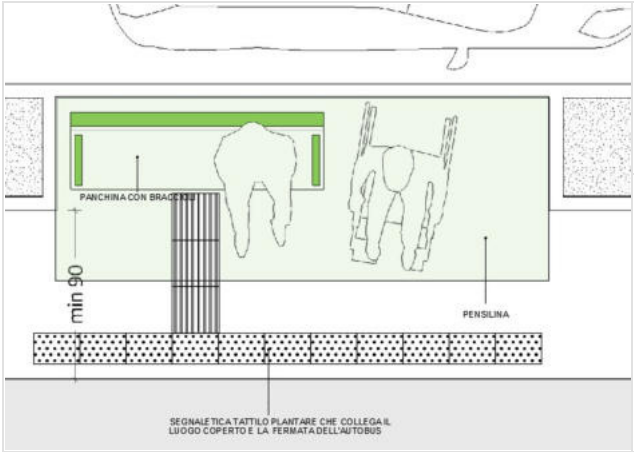

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **30 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Forni di Sotto 5, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02906

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	73	≥ 90cm
Dimensioni	X 73,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

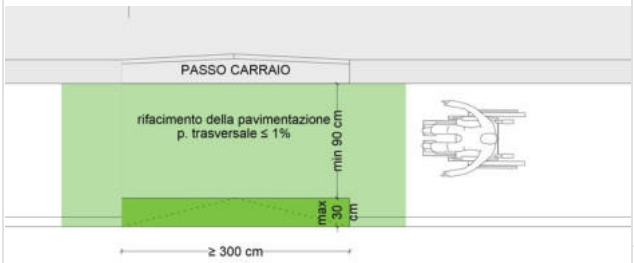

PS1783 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio (min90 cm)

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli. Larghezza percorso min 90 cm, pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.078 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 59, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02907**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02908	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 59, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. In corrispondenza dell'attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

Valutare il caso specifico per interferenza con passo carraio (vedi schema).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.493 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 59, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02908**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 296,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02907	**1**	**Altezza Dislivello** Via Forni di Sotto 59, Udine	**6493 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02907.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 71, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02909**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 296,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

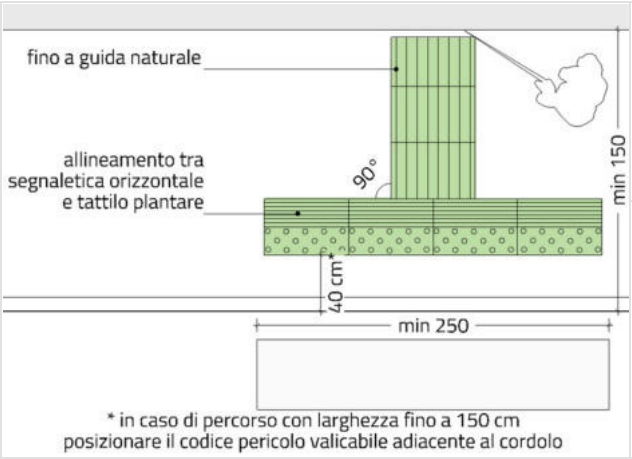

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare **1.766 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Via Forni di Sotto 71, Udine	1	E 00FF5-02910

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 85,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

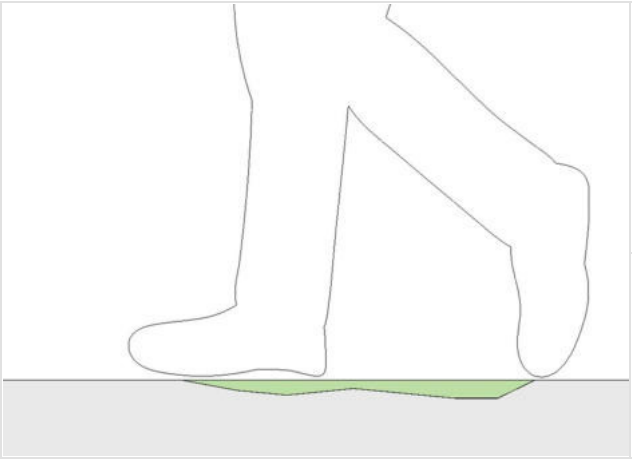

PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

490 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 71, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02911**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 460,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo **Dislivello di 15 cm.**		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02912	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02913	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02914	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02915	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

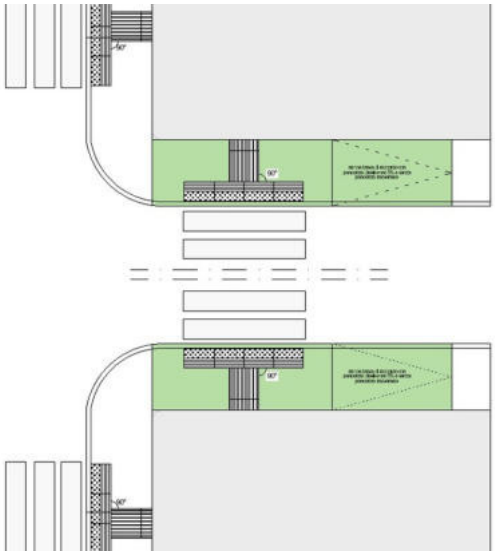

(modificato)
Spostamento e rifacimento dell'attraversamento e dei tratti di percorso con pendenze.

Rifacimento e arretramento dell'attraversamento rispetto all'incrocio. Rifacimento dei tratti di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.
Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con spostamento dell'attraversamento pedonale, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.985 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 71, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02912**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02911	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato **4985 €**
E 00FF5-02915	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02914	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02913	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

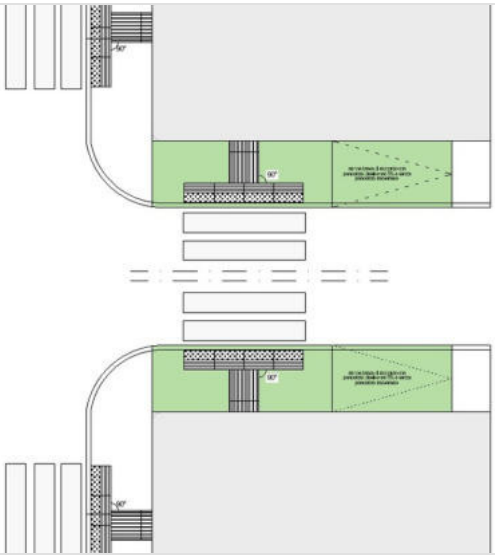

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02911.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 71, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02913**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02911	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato **4985 €**
E 00FF5-02915	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02914	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02912	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

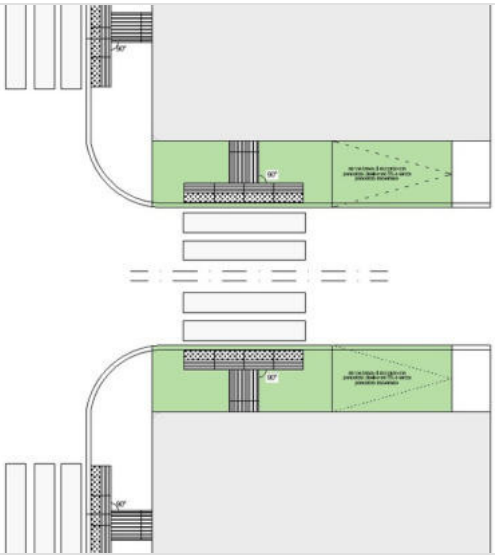

PS1845 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02911.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **30 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Forni di Sotto 75, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02914

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02911	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato **4985 €**
E 00FF5-02915	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02913	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02912	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

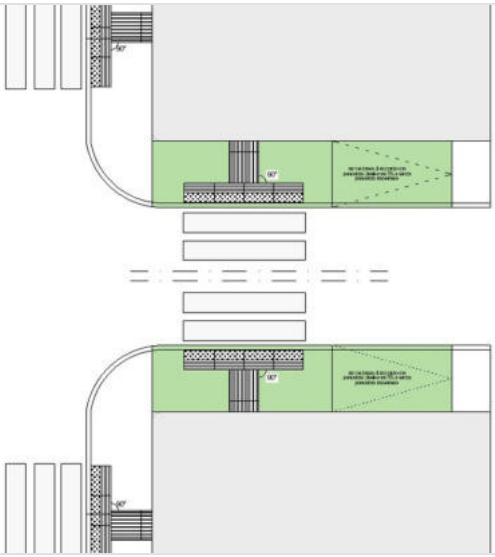

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02911.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02915**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 740,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02911	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato **4985 €**
E 00FF5-02914	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02913	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02912	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 71, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

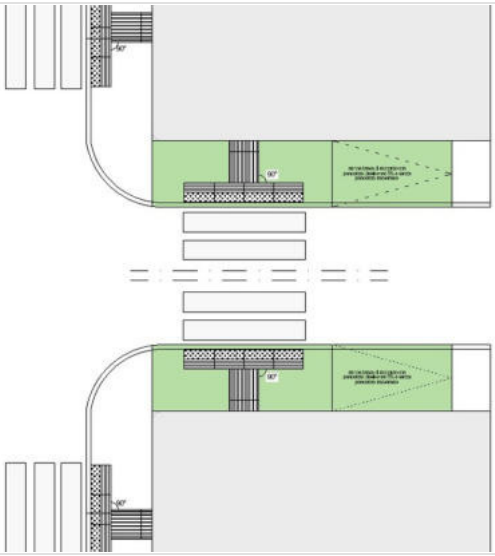

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02911.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02916**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

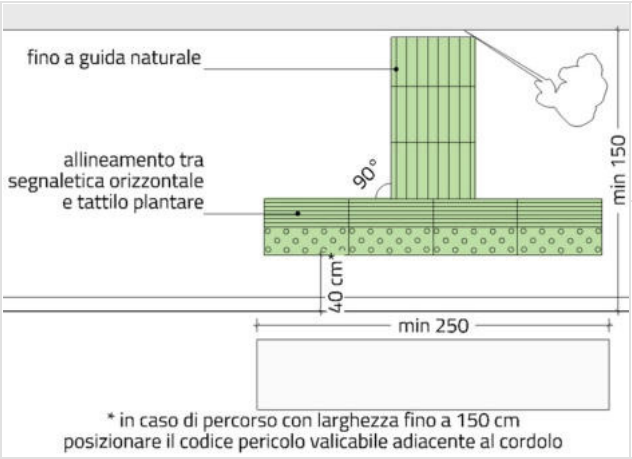

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare **1.926 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02917**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 290 cm. Larghezza totale del marciapiede di 320 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

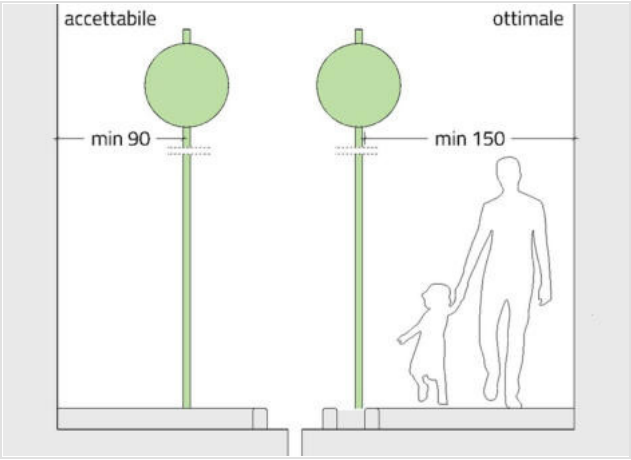

PS1733 (modificato)
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02919**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 11700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

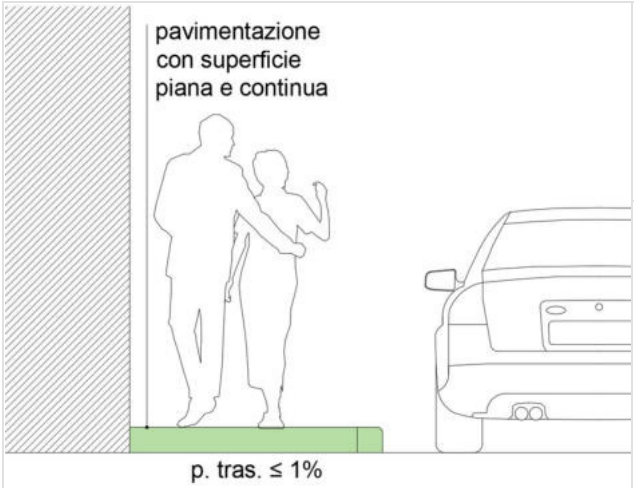

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

56.824 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02920**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

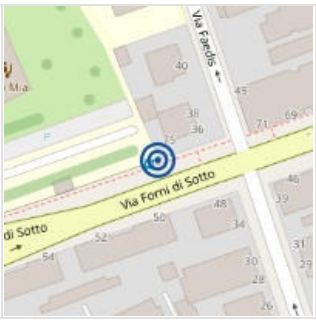

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

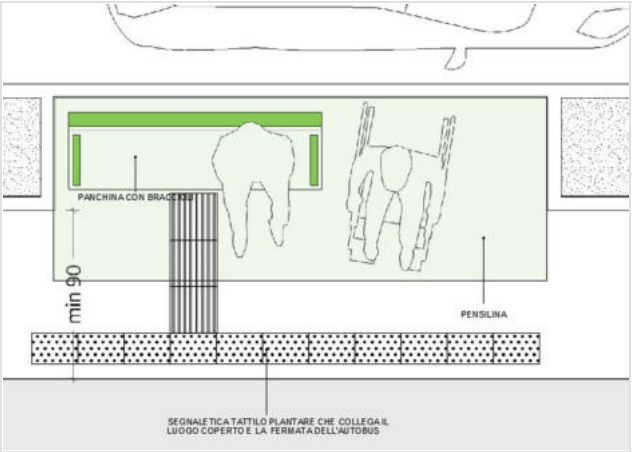

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02921**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

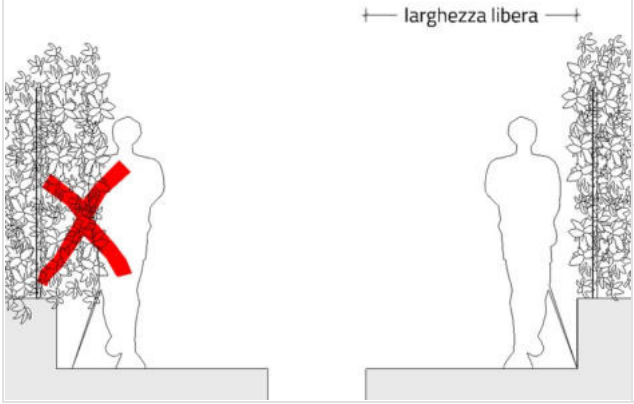

PS1700
Potatura della vegetazione

Potatura delle fronde che valicano l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

16 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02922**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 256,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02923	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

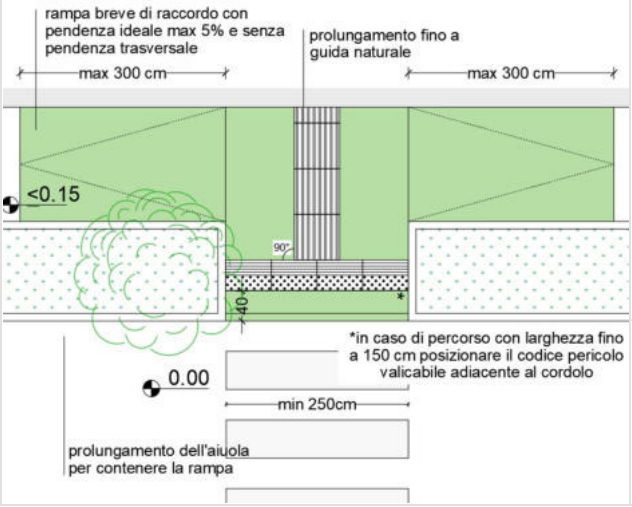

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.999 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02923**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 256,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02922	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	**4999 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

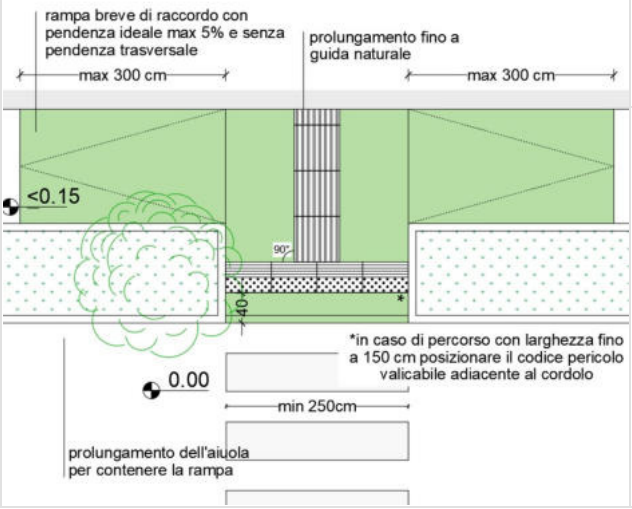

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02922.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02924**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	20	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2060,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

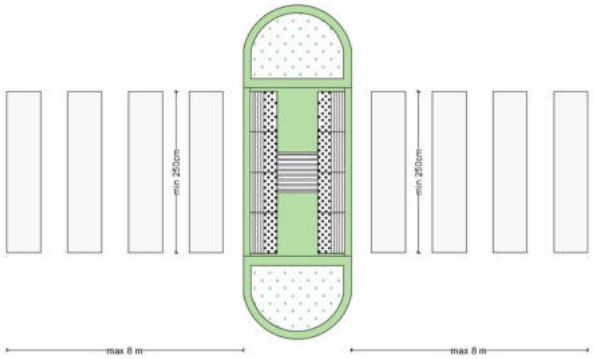

PS2055 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale

8.668 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02925**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 185,00 cm
Materiale	Pietra	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02926	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Forni di Sotto 75, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

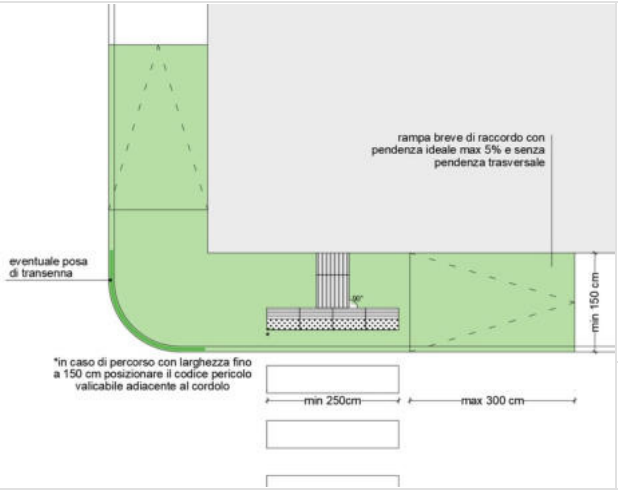

(modificato)
Rifacimento del tratto percorso con realizzazione di area in piano antistante l'attraversamento

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ad attraversamento pedonale mediante allineamento in piano alla quota stradale e realizzazione di breve rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

11.876 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02926**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02925	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	**11876 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

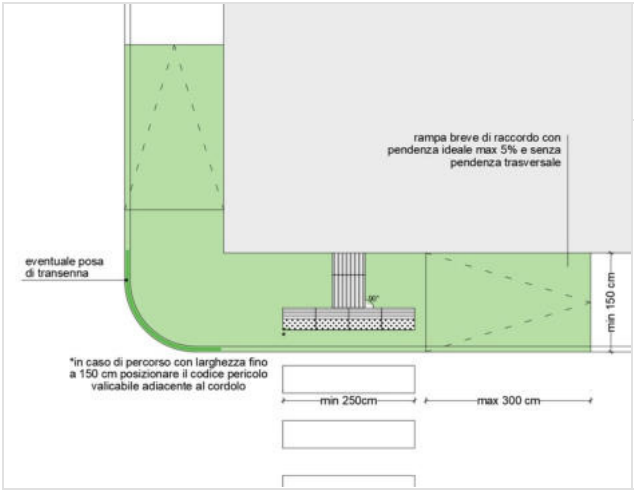

PS1850 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02925.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02927**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 1680,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

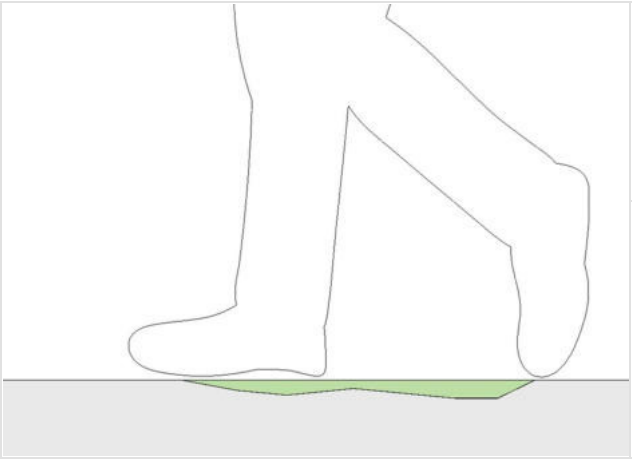

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

7.155 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02928**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02929	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Forni di Sotto 75, Udine	**5665 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

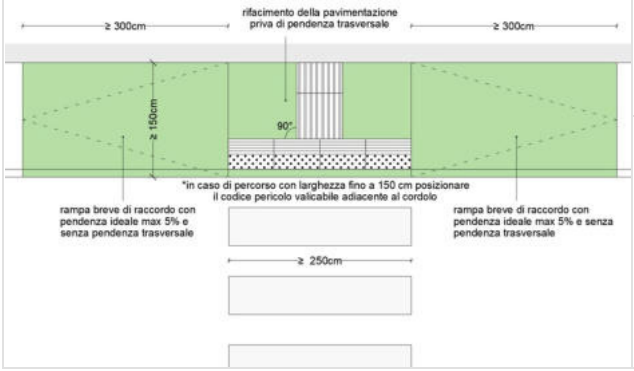

PS1735 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02929.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Forni di Sotto

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Forni di Sotto 75, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02929**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02928	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Forni di Sotto 75, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

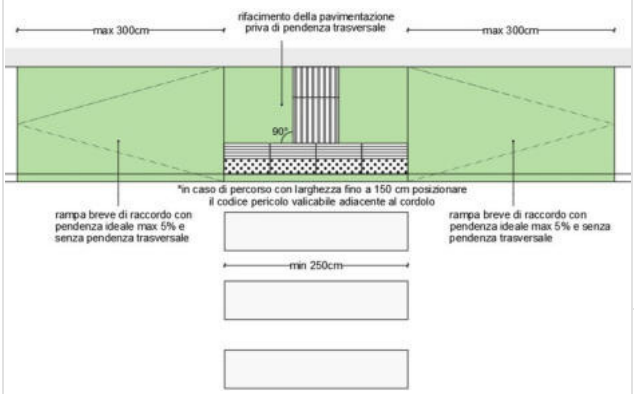

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.665 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02823**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 3900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

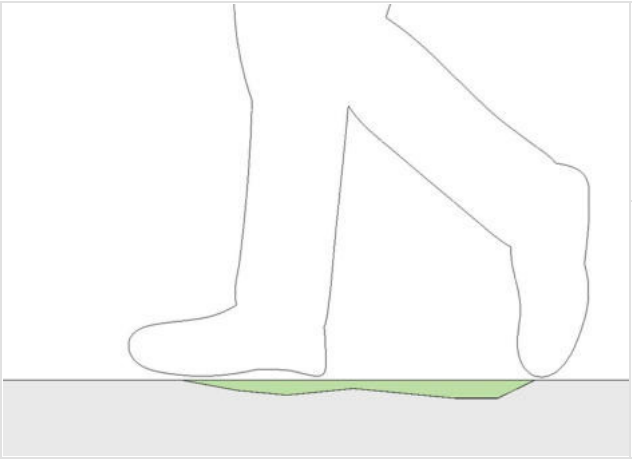

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **16.294 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02824**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

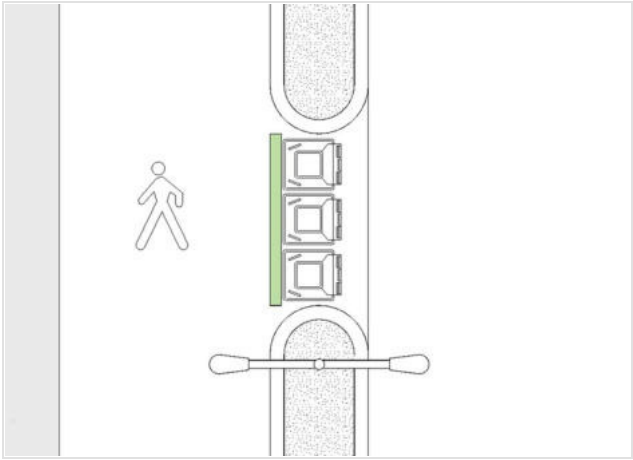

PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02825**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 40,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02826**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02827	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Volontari della Libertà 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

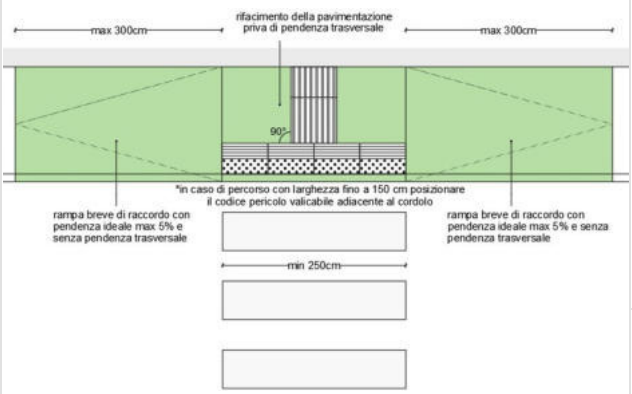

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.303 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02827**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02826	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Volontari della Libertà 6, Udine	Costo stimato **5303 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

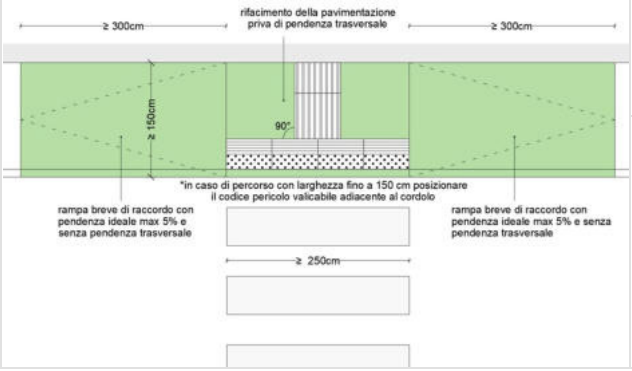

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02826.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02828**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **30 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025

Indirizzo
Viale Volontari della Libertà 6, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02829

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 255,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

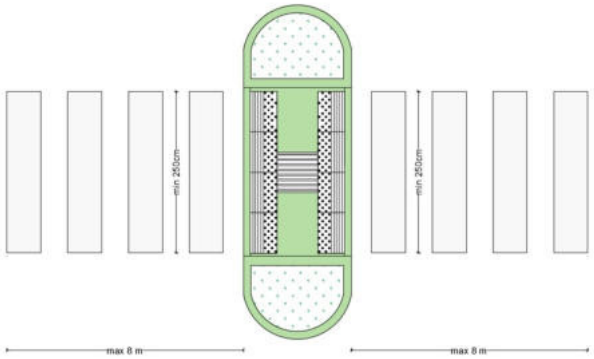

P0882 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare su isola pedonale

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare su isola pedonale **842 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02831**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | IMPIANTO SEMAFORICO

Segnale acustico assente/insufficiente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1926
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico per permettere agli utenti con disabilità visiva di riconoscere il momento di passaggio sull'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Installazione di dispositivo di chiamata con avvisatore acustico

1.958 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02832**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02834	LIV. **1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Viale Volontari della Libertà 6, Udine	Costo stimato **612 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

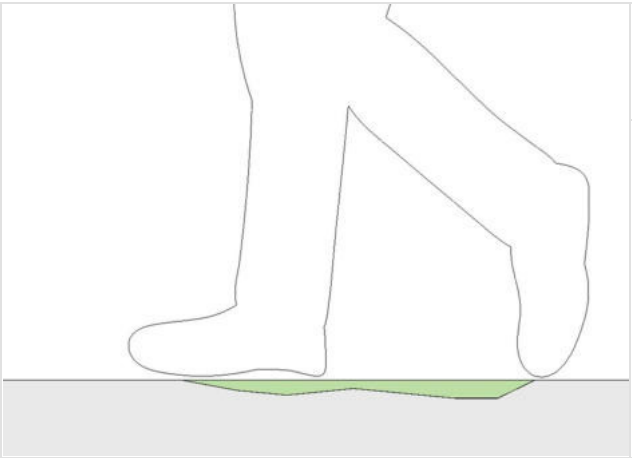

PS1690 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02834.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 64, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02833**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 270,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02835	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Volontari della Libertà 64, Udine	Costo stimato **6465 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

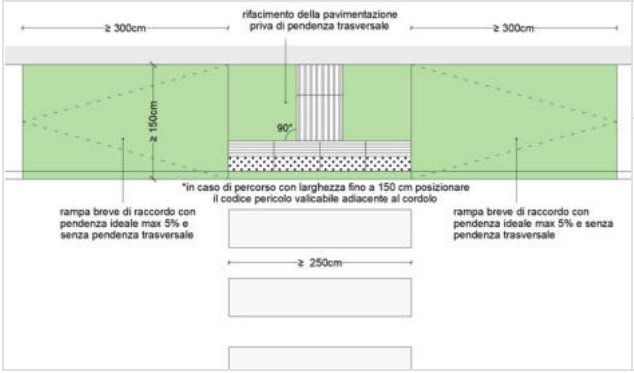

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02835.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02834**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02832	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Volontari della Libertà 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

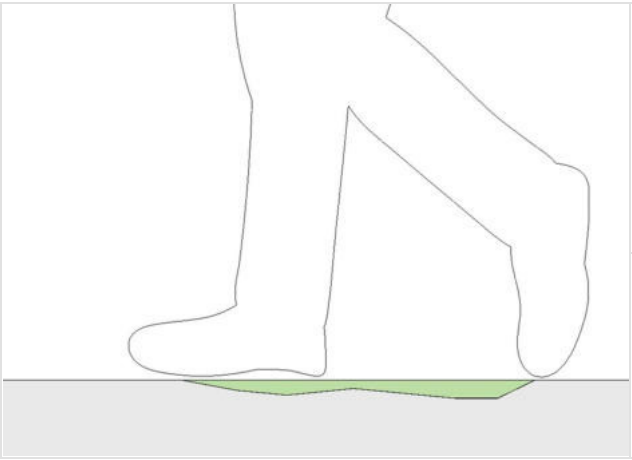

PS1845 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

612 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Volontari della Libertà

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Volontari della Libertà 64, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02835**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02833	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Volontari della Libertà 64, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.465 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02836**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 176,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02837	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazzale Chiavris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

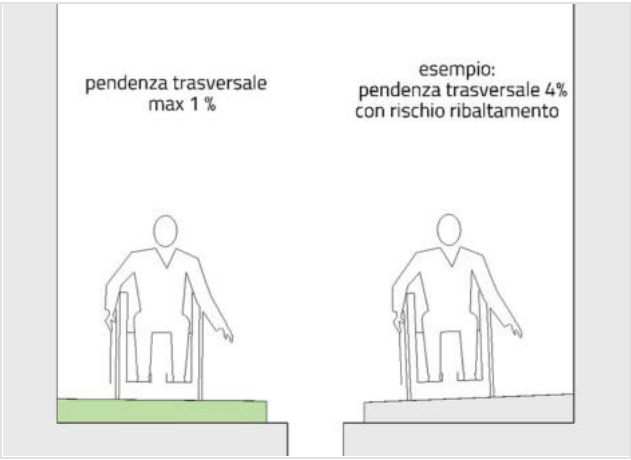

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.644 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02837**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 176,00 cm	Y 2100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02836	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazzale Chiavris, Udine	5644 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

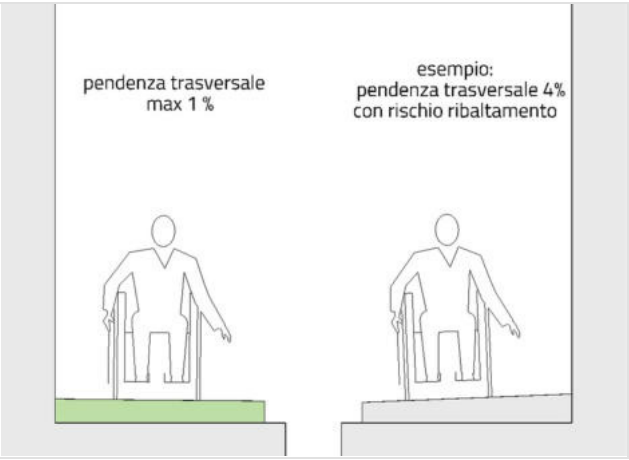

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02836.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02838**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02845	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Piazzale Chiavris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

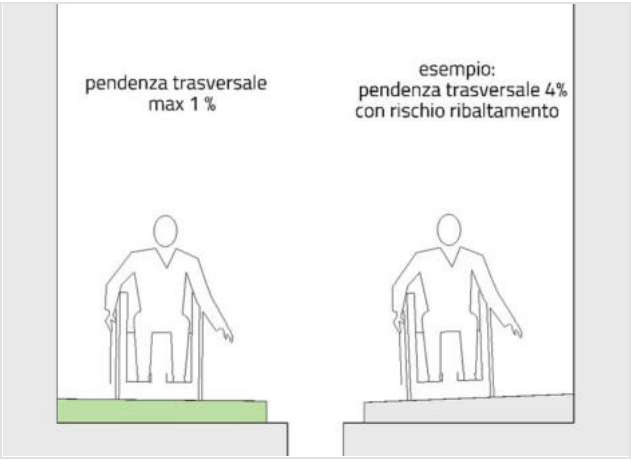

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

34.893 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	1	E **00FF5-02839**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

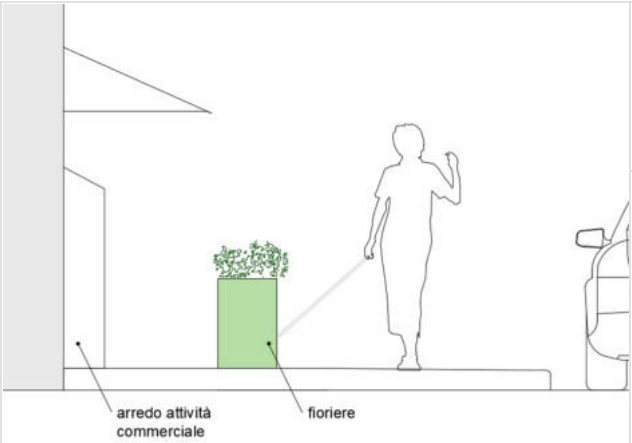

(modificato)
Posa di elementi di arredo con funzione di separazione e guida naturale tra l'area privata e il percorso pedonale

Posa di elementi di arredo con funzione di separazione e guida naturale tra l'area privata e il percorso pedonale.

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo

8.750 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02840**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Seduta priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

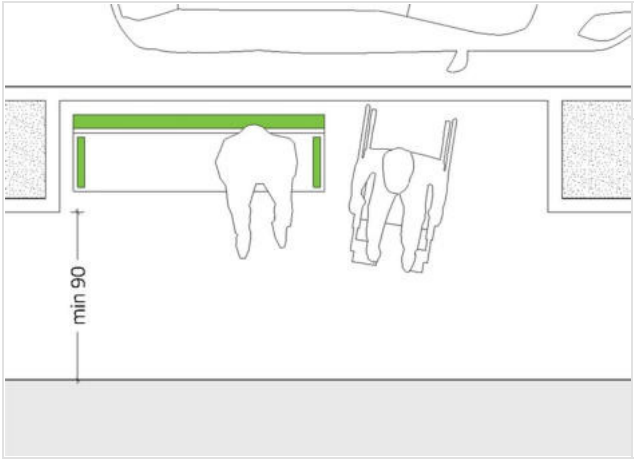

PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina **582 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02841**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Seduta priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

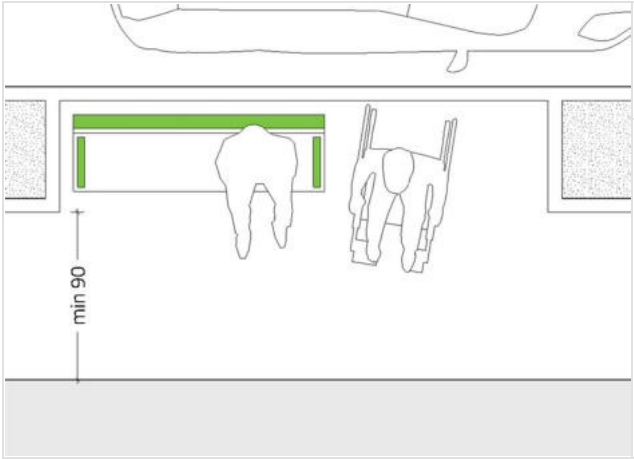

PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina **582 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02842**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Seduta priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

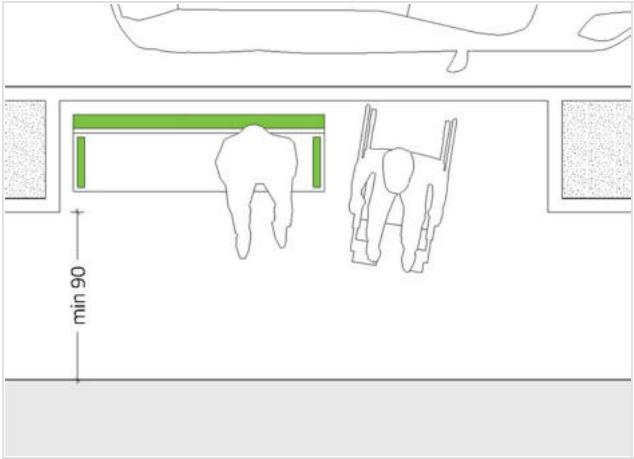

PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina

582 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02843**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Seduta priva di braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

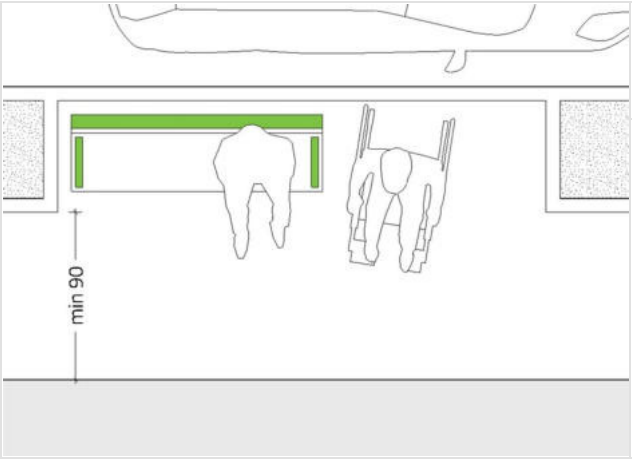

PS1899
Sostituzione di panchina con una dotata di schienale e braccioli

Sostituzione di panchina con nuova, provvista di schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina **582 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02844**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

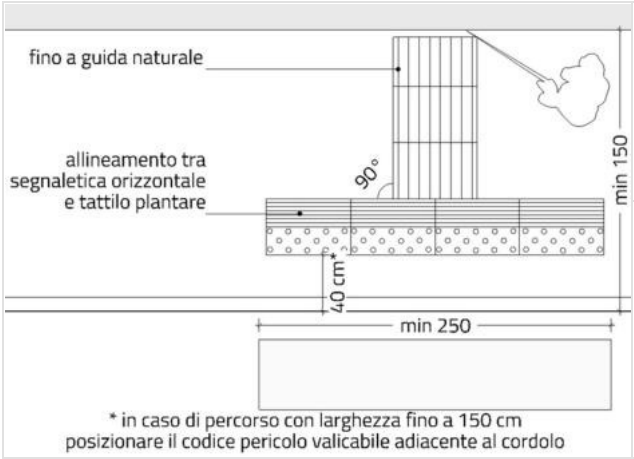

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo plantare **468 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Piazzale Chiavris, Udine	1	E 00FF5-02845

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 4000,00 cm
Materiale	Pietra in lastre	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02838	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazzale Chiavris, Udine	34893 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

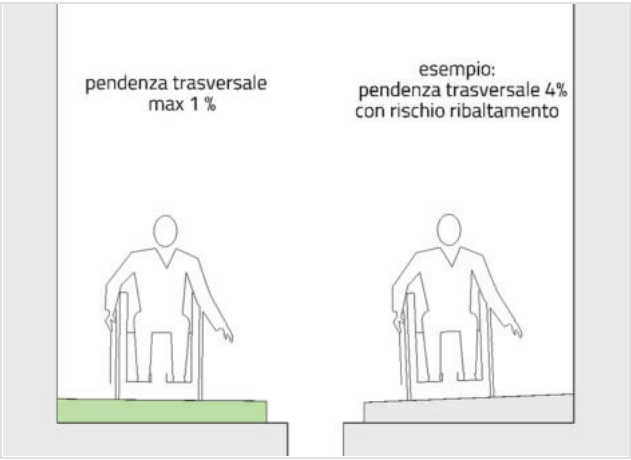

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02838.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02846**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 11,00 cm	Y 11,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Paletti parapedonali non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1790
Eliminazione dell'elemento

Rimozione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02848**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 580,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

62 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02849**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02850	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Piazzale Chiavris, Udine	**4268 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

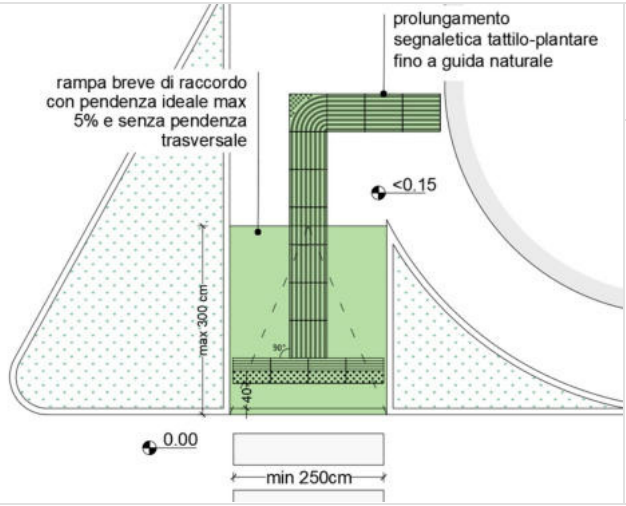

PS1736 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n.00FF5-02850.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02850**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	**6**	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	**X 300,00 cm**	**Y 180,00 cm**
Materiale	**Porfido a cubetti**	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02849	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazzale Chiavris, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

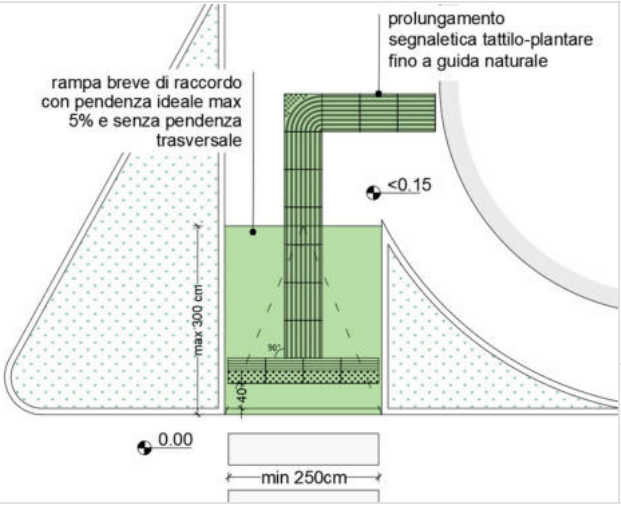

(modificato)
Rifacimento della rampa di raccordo e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento della rampa di raccordo e posa di segnaletica tattilo-plantare

4.268 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02869**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 3300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

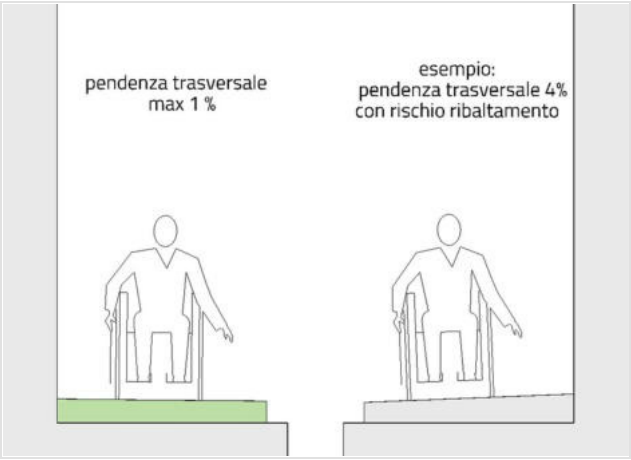

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

9.855 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 71, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02878**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

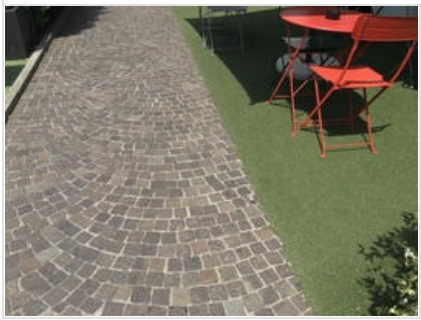

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

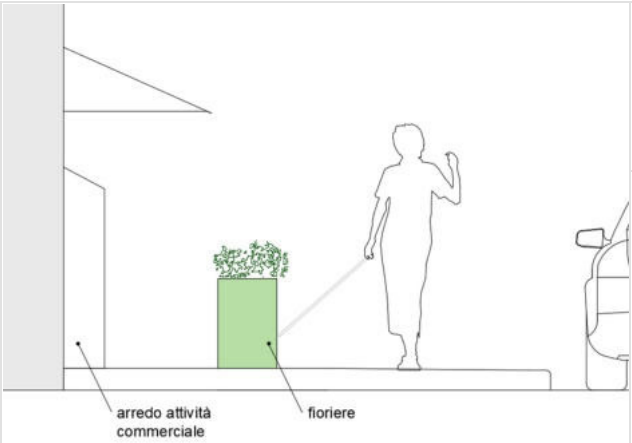

PS1930 (modificato)
Posa di elementi di arredo con funzione di separazione e guida naturale tra l'area privata e il percorso pedonale

Posa di elementi di arredo con funzione di separazione e guida naturale tra l'area privata e il percorso pedonale

STIMA DEL COSTO
Posa di elementi di arredo urbano

1.250 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 68, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02879**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di collegamento al percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

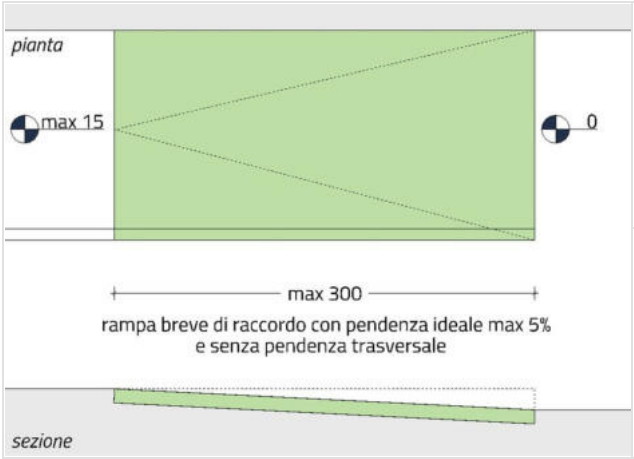

PS1931 (modificato)
Demolizione del dislivello e costruzione di breve rampa di raccordo

Demolizione di marciapiede e realizzazione di rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.902 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Piazzale Chiavris 68, Udine	1	E 00FF5-02880

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 48,00 cm	Y 48,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0657
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che, occupando parte del percorso pedonale, costituisce ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 68, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02881**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

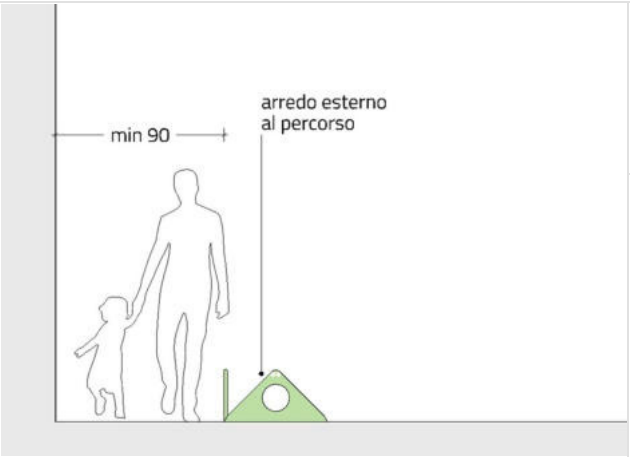

PS1971
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento della rastrelliera in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 68, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02882**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 145,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

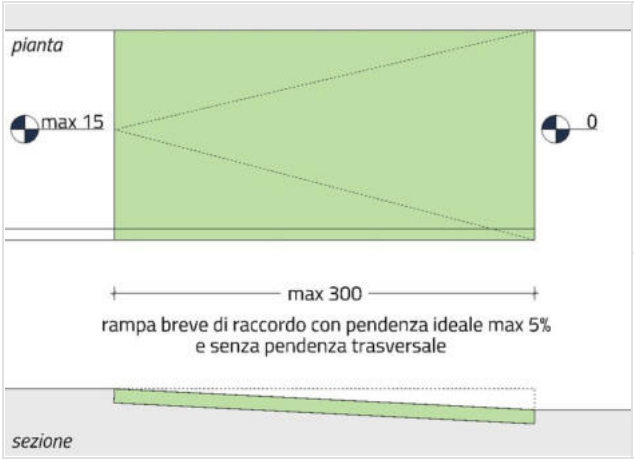

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.902 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02891**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02892	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02893	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

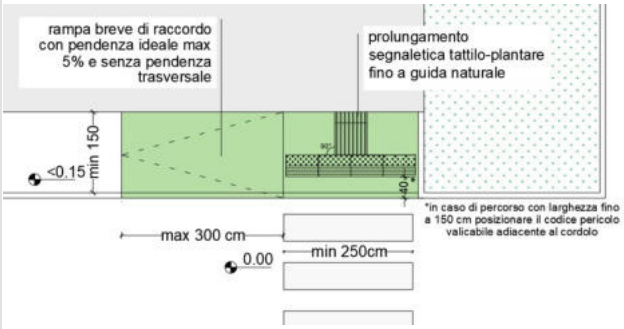

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.303 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02892**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 205,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02891	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazzale Chiavris 22, Udine	3303 €
E 00FF5-02893	1	**Altezza Dislivello** Piazzale Chiavris 22, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

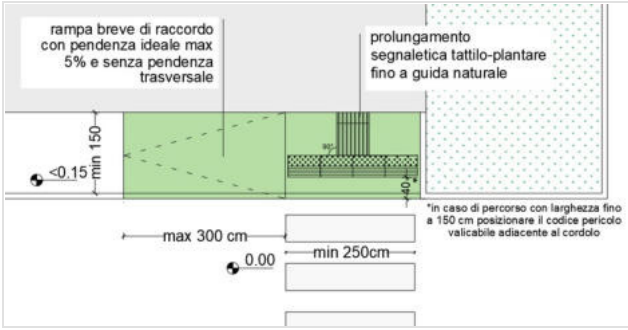

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02891.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02893**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 290,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02891	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato **3303 €**
E 00FF5-02892	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

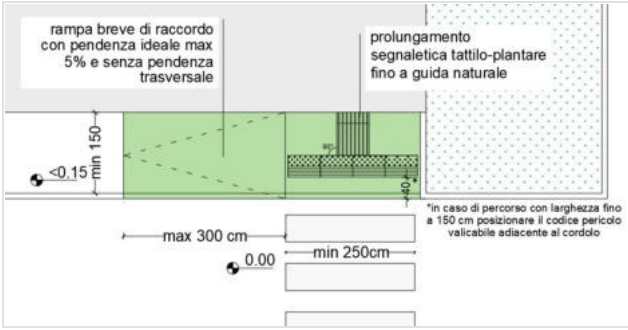

PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02891.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02894**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

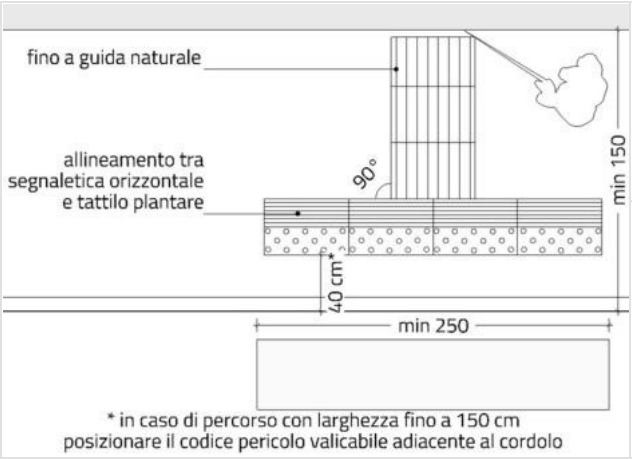

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **748 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02895**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

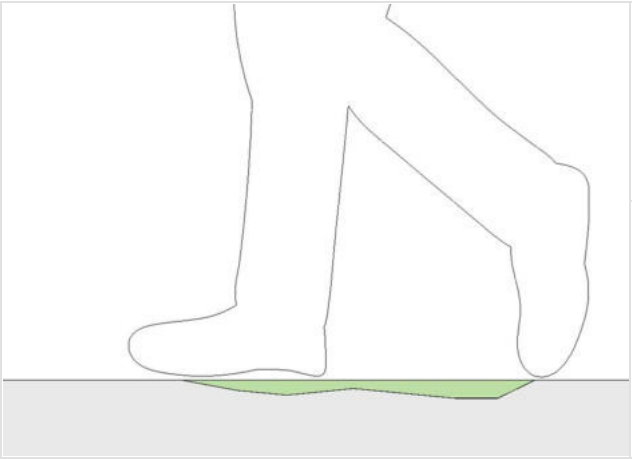

PS1739 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **108 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 25, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02896**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

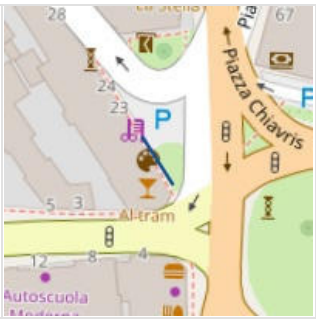

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2058
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02897**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Lunghezza	440	cm
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02898	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02899	LIV. **1**	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato **974 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

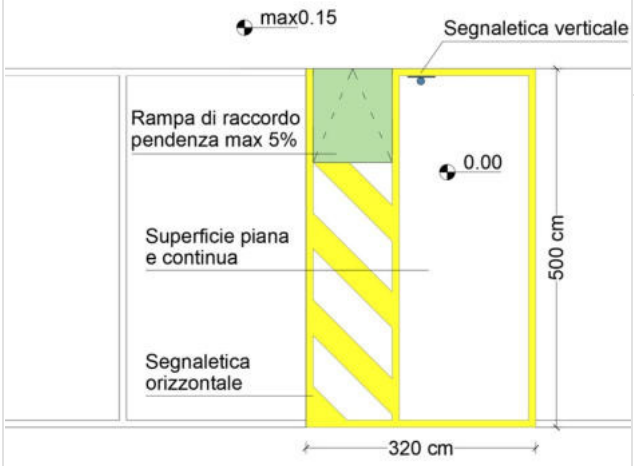

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02899.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02898**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02897	LIV. 1	**Lunghezza Stallo riservato** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02899	LIV. 1	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato 974 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

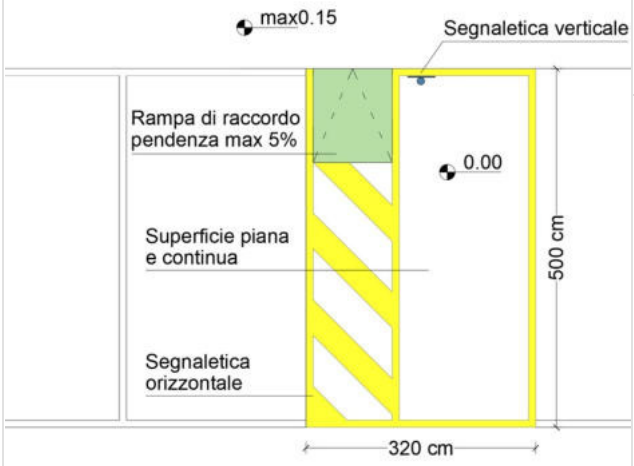

PS1798 (modificato)
Soluzione già valutata

Soluzione già valutata nella scheda n. 00FF5-02899.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Piazzale Chiavris

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 22, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02899**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 440,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02898	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02897	LIV. 1	**Lunghezza Stallo riservato** Piazzale Chiavris 22, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

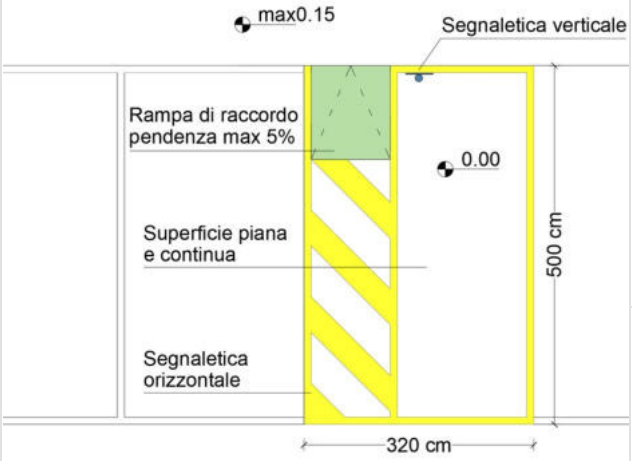

PS1891 (modificato)
Realizzazione di breve rampa di raccordo su zebratura laterale e rifacimento segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento. Valutare spostamento dello stallo in posizione adatta a garantire le dimensioni minime dello stallo. Realizzazione di rampa con cordolo laterale e larghezza minima di 90 cm, di lunghezza utile a raggiungere il primo percorso pedonale disponibile. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza e rifacimento della segnaletica orizzontale

974 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02851**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 510,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02852	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02853	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

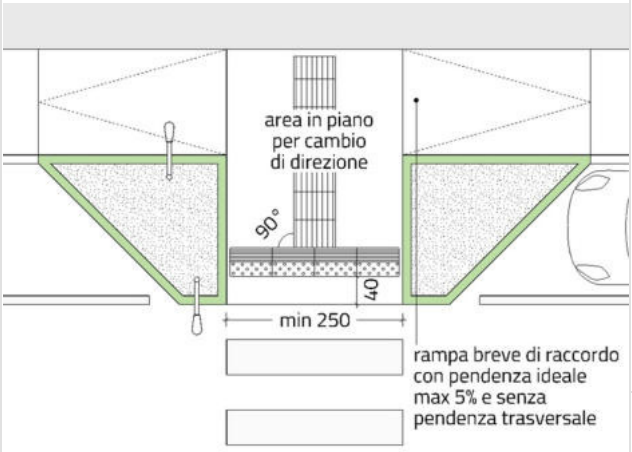

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio (solo da un lato), con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale.
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.
Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare

7.073 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02852**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02851	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato **7073 €**
E 00FF5-02853	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

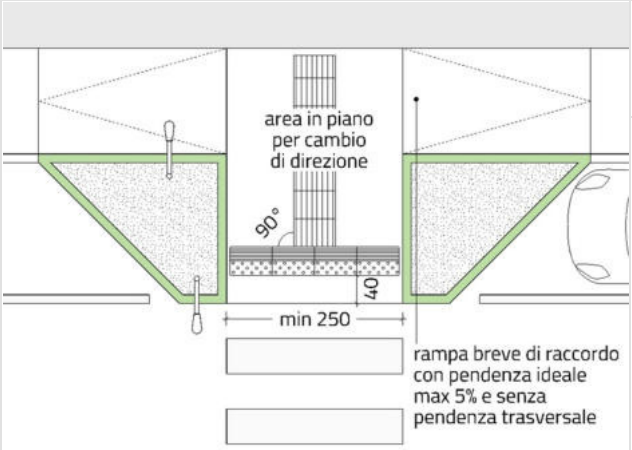

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02851.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02853**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 860,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02851	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato **7073 €**
E 00FF5-02852	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Monte Grappa 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

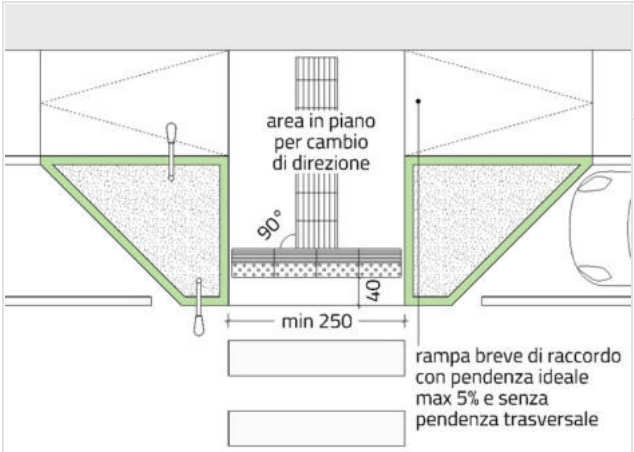

P0773 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02851.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02854**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 860,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

92 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Monte Grappa 10-5, Udine	2	E 00FF5-02855

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 455,00 cm	Y 10200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

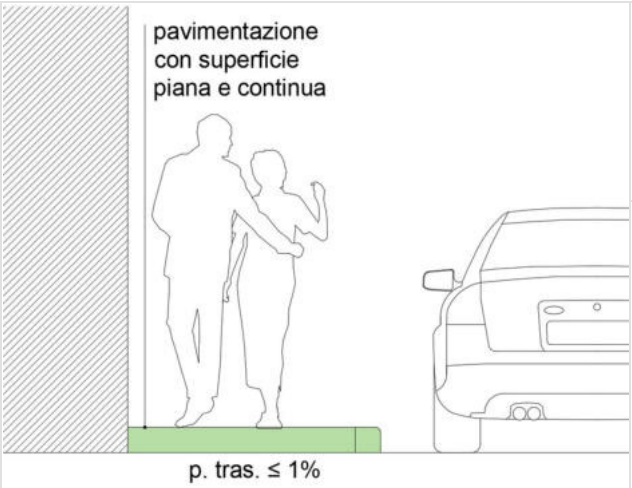

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **69.326 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Monte Grappa 5, Udine	3	E 00FF5-02856

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

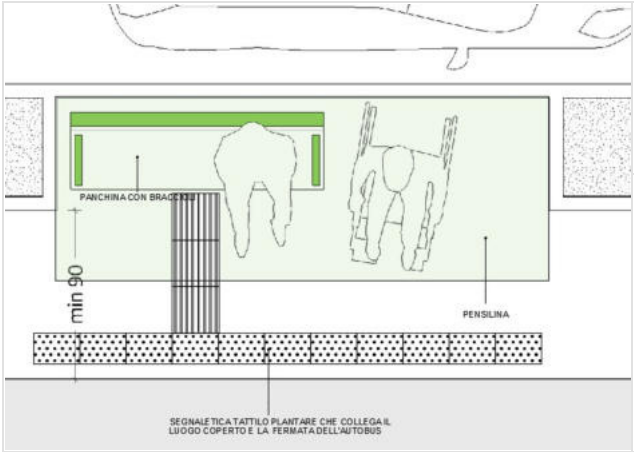

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02857**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Transenna	Si	
Dimensioni	X --	Y 220,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenna parapedonale in posizione centrale rispetto al percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0661
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **48 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02858**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Transenna	Si	
Dimensioni	X --	Y 100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenna parapedonale in posizione centrale rispetto al percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2063
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **48 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02859**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

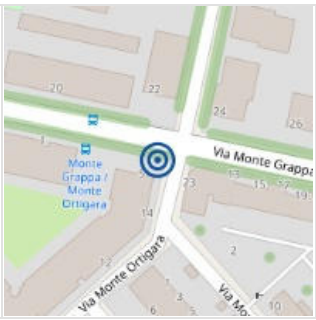

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 380,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02860	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Monte Grappa 5, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02861	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Monte Grappa 20, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

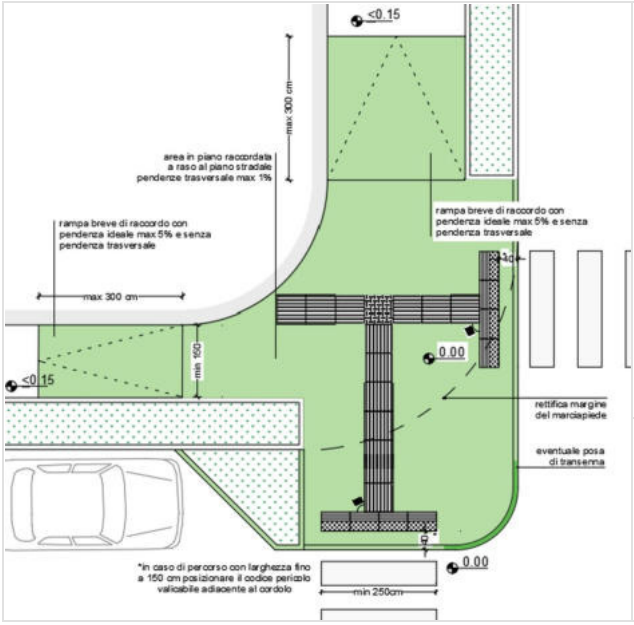

(modificato)
Prolungamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del marciapiede del tratto di percorso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, con prolungamento del percorso pedonale affiancato da stalli di parcheggio con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea", "pericolo valicabile" e "incrocio" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Prolungamento del marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

8.724 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **30 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Monte Grappa 5, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02860

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

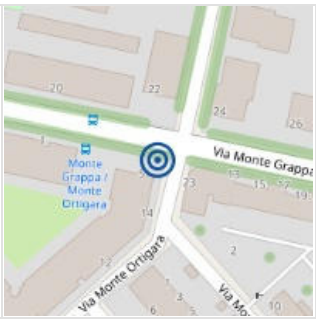

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 380,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02859	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Monte Grappa 5, Udine	Costo stimato **8724 €**
E 00FF5-02861	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Monte Grappa 20, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

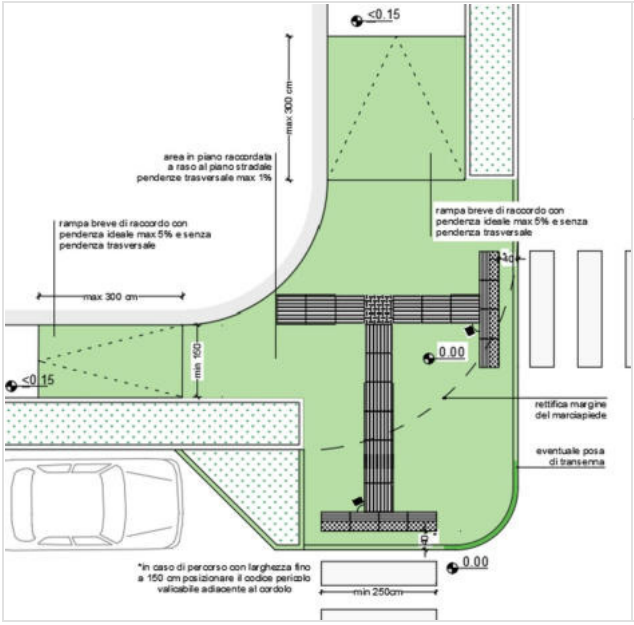

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02859.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Monte Grappa 20, Udine	1	E 00FF5-02861

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	12	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02859	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Monte Grappa 5, Udine	Costo stimato 8724 €
E 00FF5-02860	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Monte Grappa 5, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

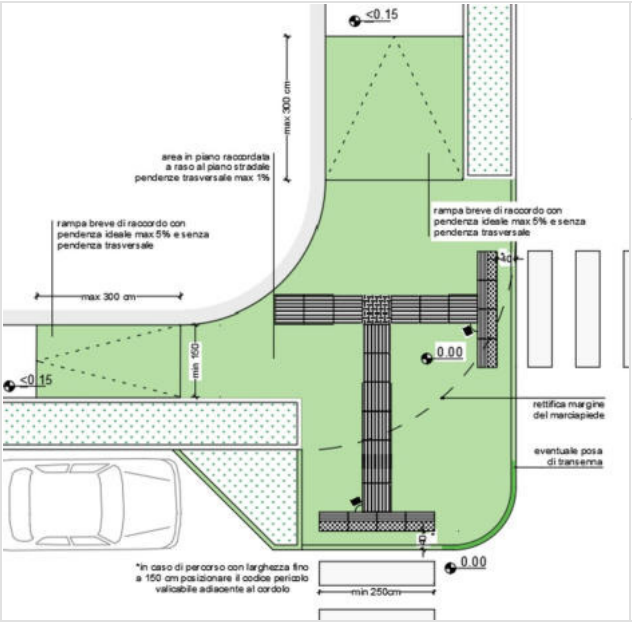

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02859.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 20, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02862**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

128 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 20, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02863**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	8	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 410,00 cm	Y 430,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

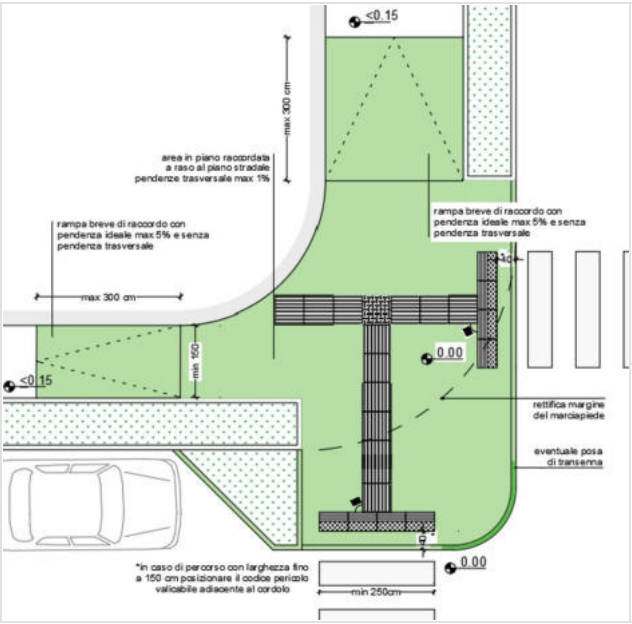

(modificato)
Rifacimento del marciapiede e della segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. In corrispondenza dell' attraversamento pedonale, posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del marciapiede e della segnaletica tattilo-plantare

6.637 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 20-2, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02864**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 460,00 cm	Y 11100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

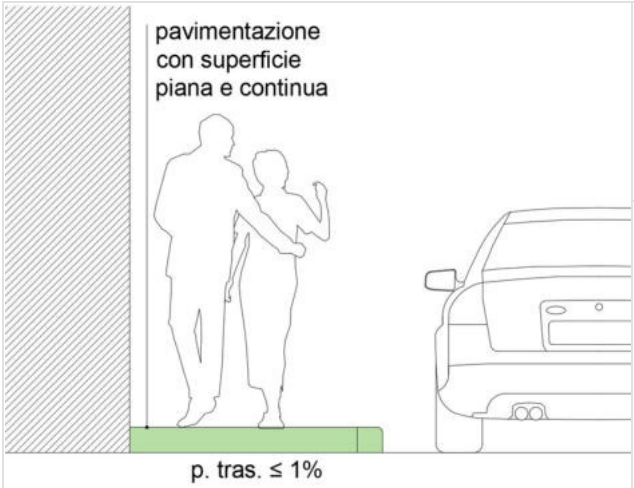

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

76.243 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Via Monte Grappa 22, Udine	3	E 00FF5-02865

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

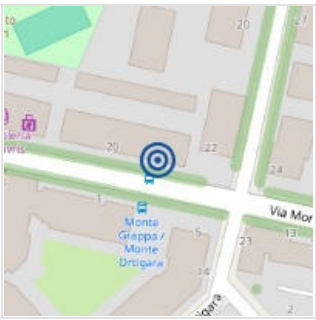

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

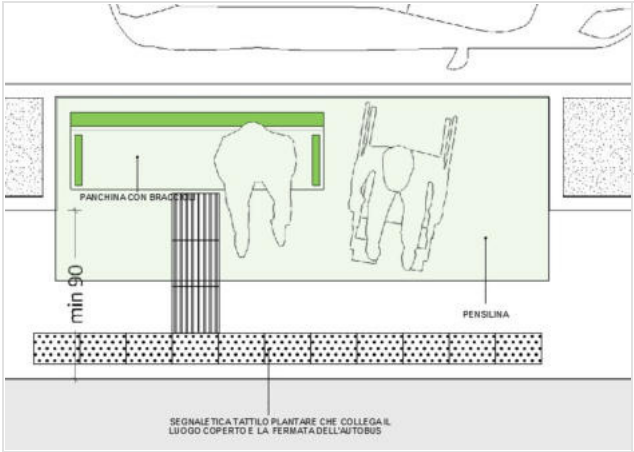

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **30 Giugno 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025

Indirizzo
Via Monte Grappa 18, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-02866

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Transenna	Si	
Dimensioni	X --	Y 100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenna parapedonale in posizione centrale rispetto al percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2063
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento
182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte Grappa 18, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02867**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Transenna	Si	
Dimensioni	X --	Y 100,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenna parapedonale in posizione centrale rispetto al percorso pedonale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2063
Eliminazione dell'elemento

Eliminazione dell'elemento che costituisce ostacolo.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'elemento **182 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte Grappa

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 25 Settembre 2025	Via Monte Grappa 6, Udine	1	E 00FF5-02868

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

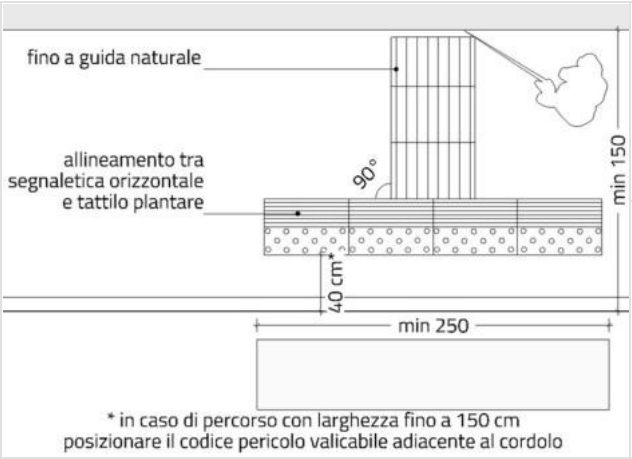

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **748 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02871**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02872	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02873	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02874	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02875	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02876	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

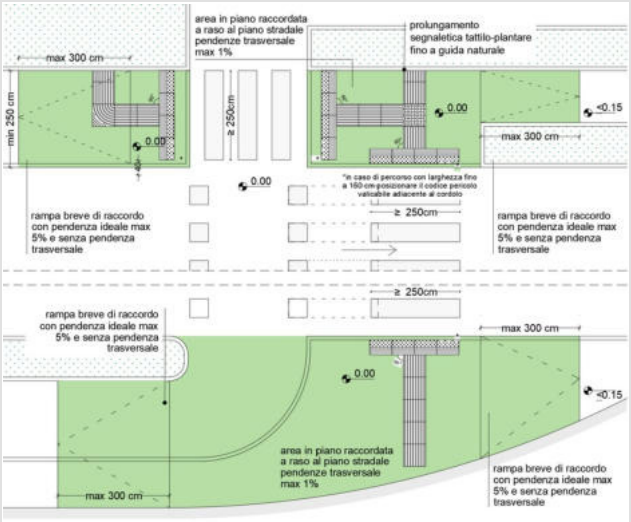

PS2014 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, spostamento dell'attraversamento e posa di segnaletica tattilo-plantare

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Intervento da eseguire su entrambi i lati dell'attraversamento secondo lo schema.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, spostamento dell'attraversamento e posa di segnaletica tattilo-plantare **21.620 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02872**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02871	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato **21620 €**
E 00FF5-02876	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02875	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02874	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02873	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

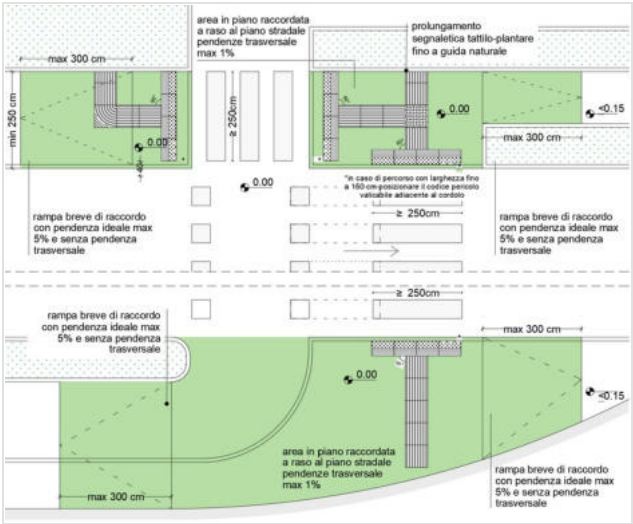

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02871.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02873**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 680,00 cm
Materiale	Asfalto	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02871	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato **21620 €**
E 00FF5-02872	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02874	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02875	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02876	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02871.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02874**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02871	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato **21620 €**
E 00FF5-02872	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02873	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02875	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02876	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

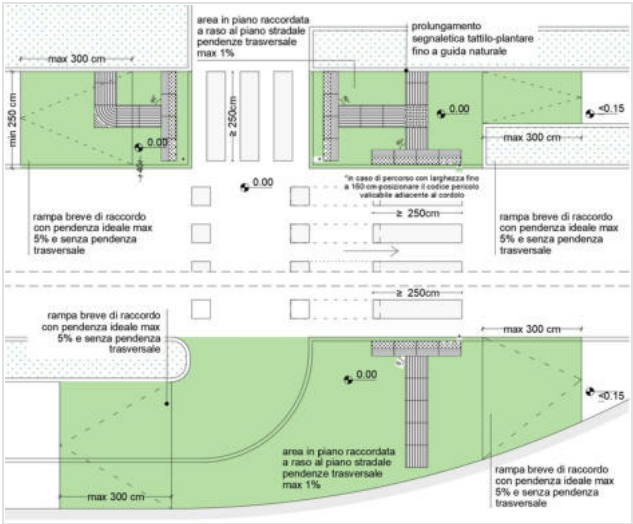

PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n.00FF5-02871.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	**Viale Vat 24, Udine**	**1**	**E 00FF5-02875**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02871	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato **21620 €**
E 00FF5-02872	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02873	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02874	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02876	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

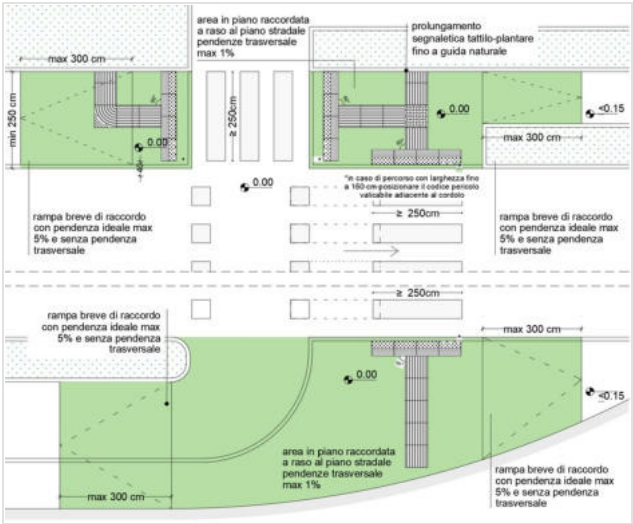

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02871.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02876**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02872	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02871	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato **21620 €**
E 00FF5-02873	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02874	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02875	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Viale Vat 24, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

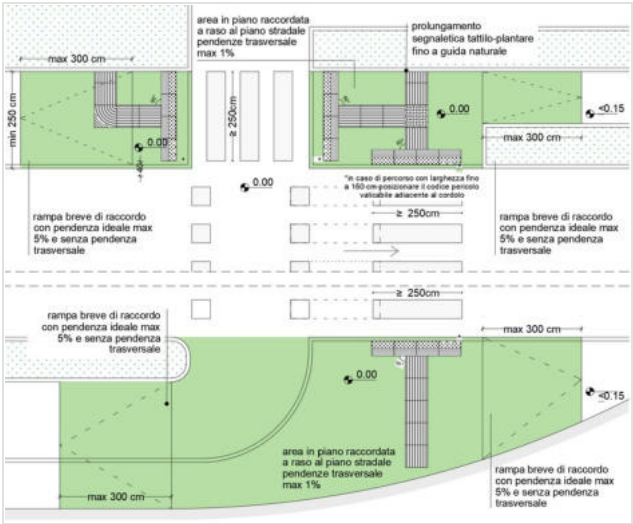

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02871.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Viale Vat

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Viale Vat 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02877**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

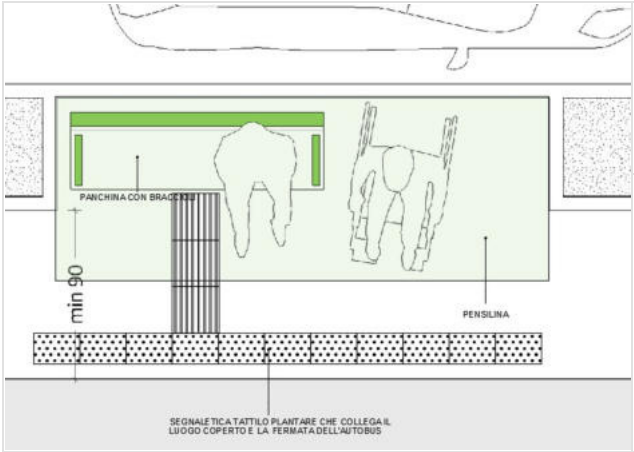

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte San Michele

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte San Michele, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02883**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	10	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 3900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e pietra in lastre	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

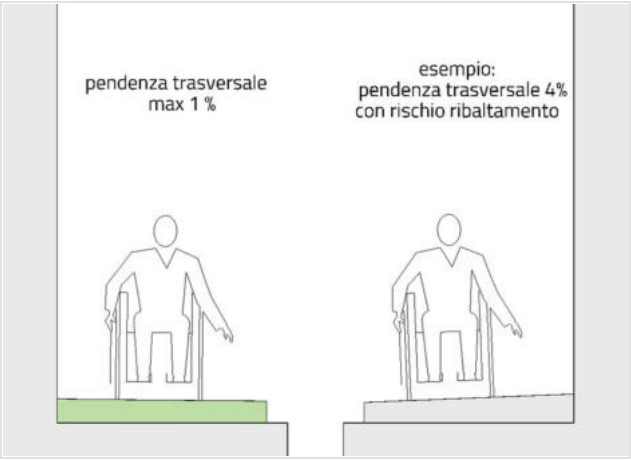

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.735 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Monte San Michele

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monte San Michele, Udine**	3	E **00FF5-02884**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 135 cm. Larghezza totale del marciapiede di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

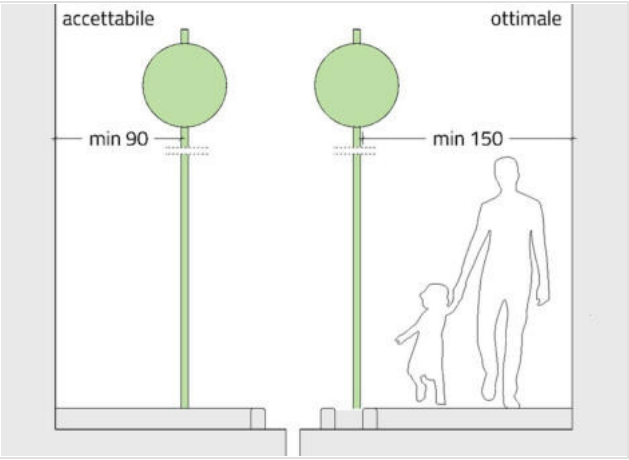

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Tricesimo 63, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02885**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1180,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 1180 cm (tra marciapiede e marciapiede). Larghezza del marciapiede di 300 cm. Dislivello di 15 cm. Larghezza dell'area destinata a parcheggio di 230 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

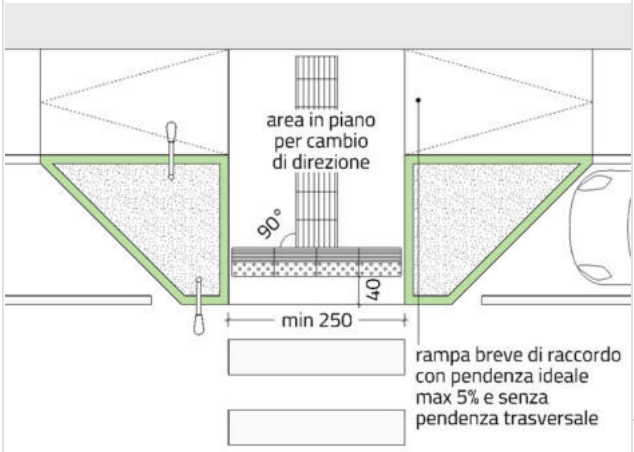

PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso con prolungamento del percorso pedonale e isola pedonale spartitraffico.

Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale con prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale rispetto all'attraversamento pedonale in modo da rendere quest'ultimo di lunghezza inferiore a 8 m.
(Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02886).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso e isola pedonale

8.962 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Piazzale Chiavris 50, Udine	1	E 00FF5-02886

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 1180,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

Larghezza della sede stradale di 1180 cm (tra marciapiede e marciapiede). Larghezza del marciapiede di 300 cm. Dislivello di 16 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02885).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.203 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 50, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02887**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 280 cm. Larghezza totale del marciapiede di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2009
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **163 €**

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 49, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02888**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 175,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
Zerbino alto 3 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1978 (modificato)
Eliminazione del risalto/incasso

Eliminazione degli elementi che costituiscono ostacolo e ripristino della planarità della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione del risalto

182 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 22 Settembre 2025	Piazzale Chiavris 49, Udine	1	E 00FF5-02889

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

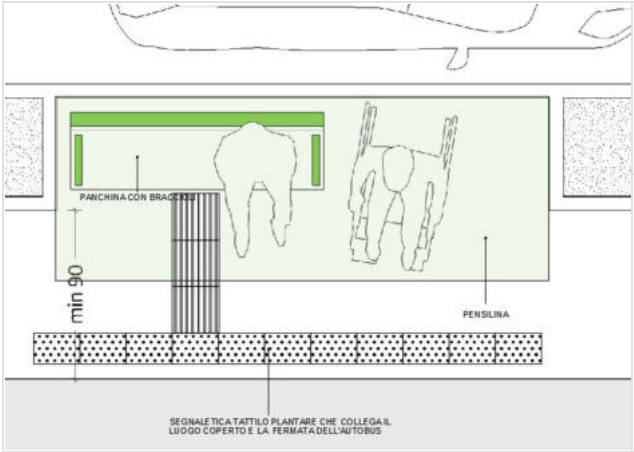

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > CHIAVRIS > Via Tricesimo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **30 Giugno 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 24 Settembre 2025	Indirizzo **Piazzale Chiavris 49, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02890**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 5400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

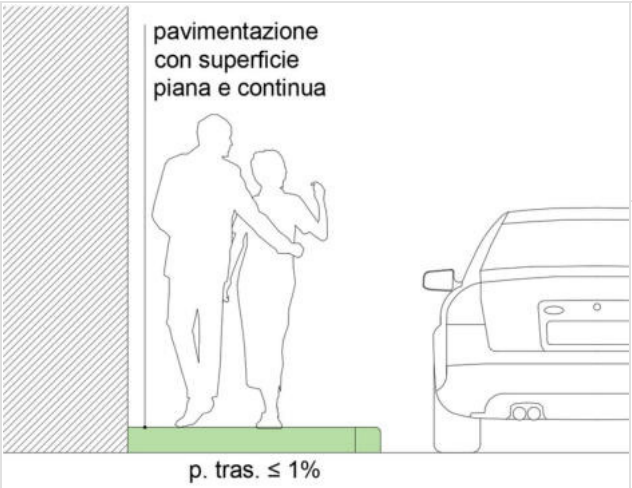

PS1882 (modificato)
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

24.584 €

15

BALDASSERIA

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02930**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02931	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 23, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

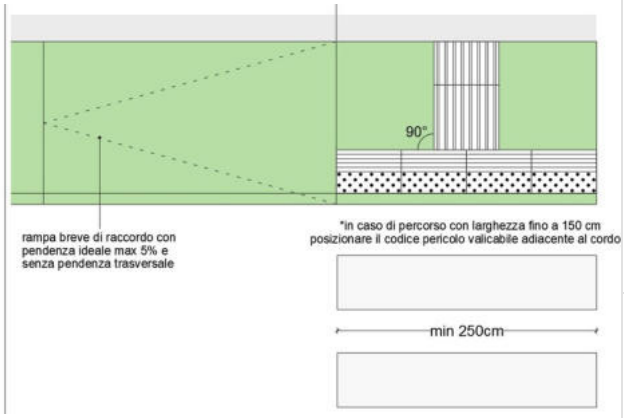

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso in piano privo di pendenza trasversale, con realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

2.272 €

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02931**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 195,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02930	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 23, Udine	**2272 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

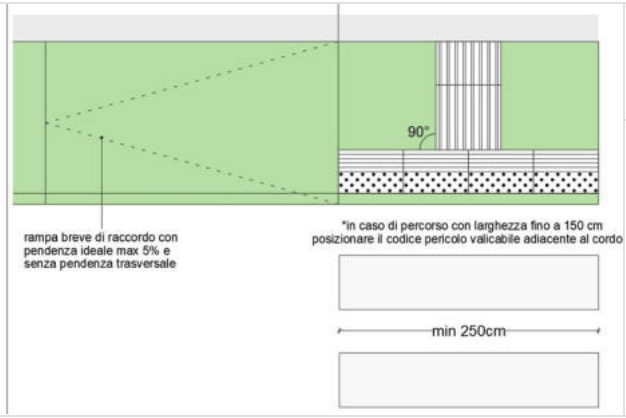

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02930.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 23, Udine	3	E 00FF5-02932

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02933**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

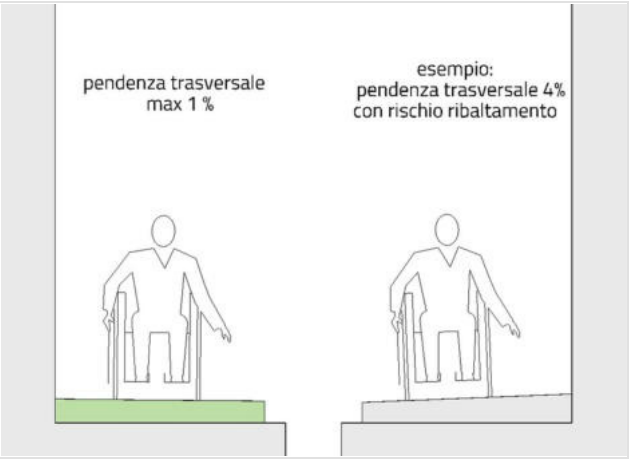

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

847 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02934**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

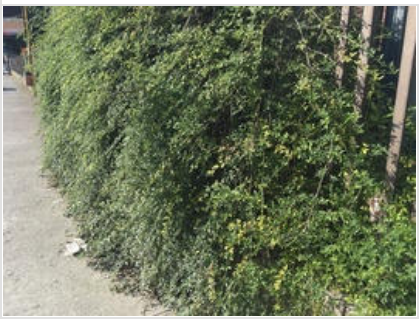

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

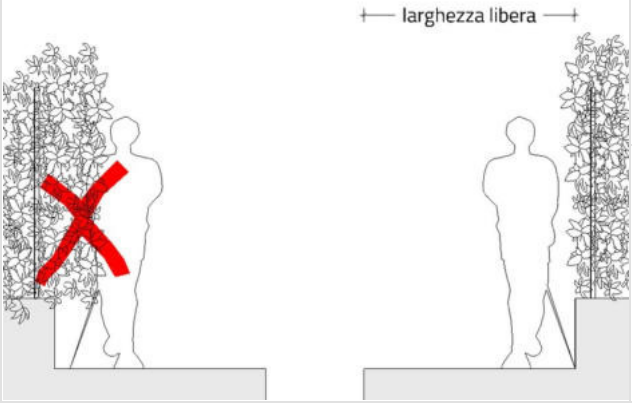

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

74 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02935**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 920,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

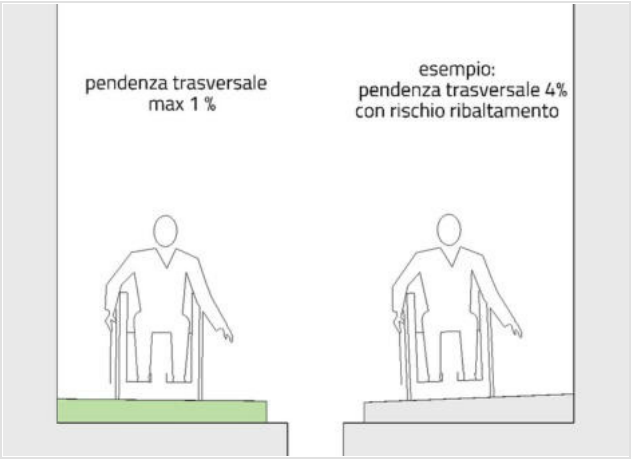

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.478 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02936**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 375 cm. Larghezza totale del marciapiede di 390 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

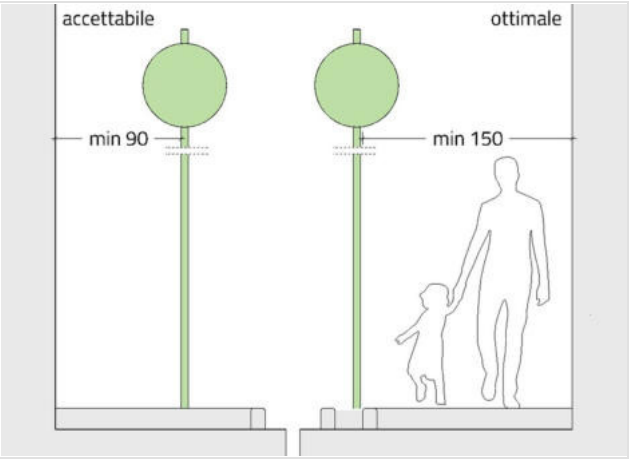

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 21, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02937**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo non adeguata e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

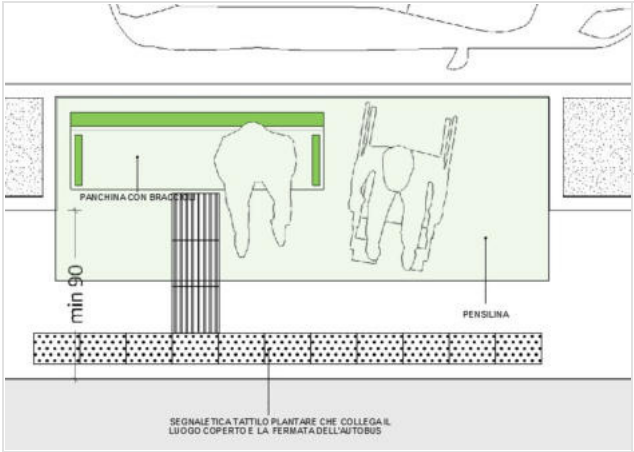

PS1751 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02938**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo

Palo segnaletica con cestino che ostacola il passaggio per persone con disabilità visiva. Altezza libera da terra di 39 cm. Altezza del cestino di 50 cm ingombro totale di 30 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

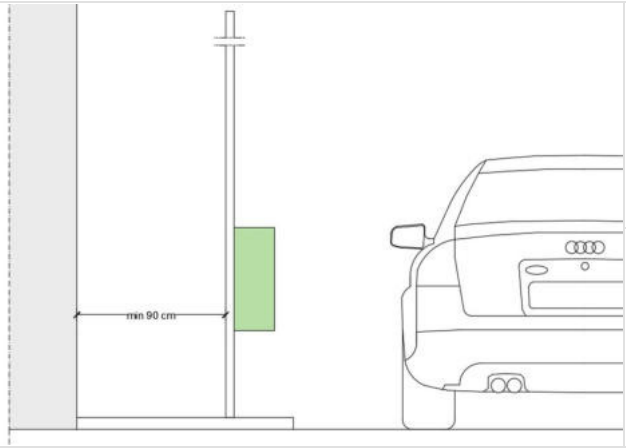

PS2012 (modificato)
Spostamento in area esterna e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del palo con cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 21, Udine	2	E 00FF5-02939

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 390,00 cm	Y 360,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

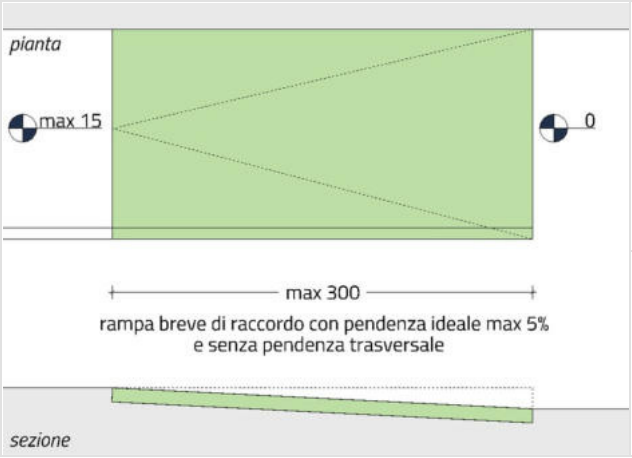

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

2.677 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 21, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02940**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

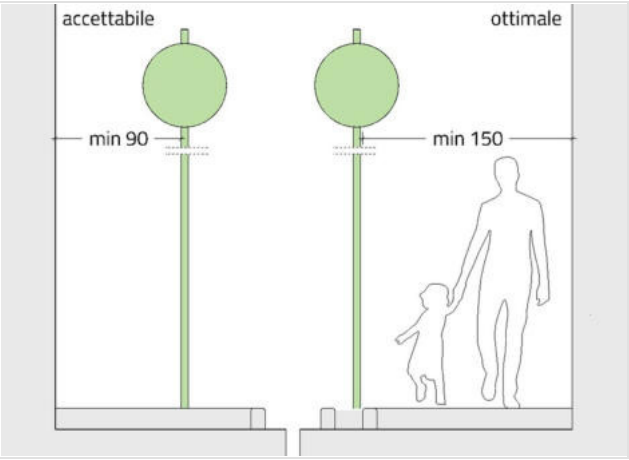

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 21, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02941**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Interazione con ciclabilità	Si	
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 8000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

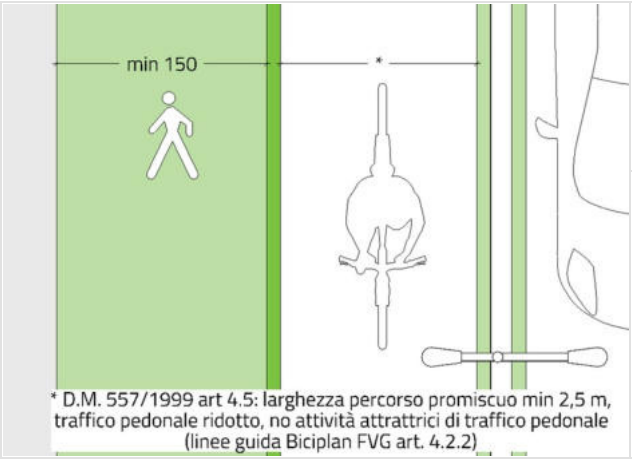

P1071 (modificato)
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

Eliminazione della promiscuità del percorso tramite realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di segnaletica orizzontale per separare percorso pedonale e pista ciclabile

52 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 23, Udine	1	E 00FF5-02942

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02943	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 23, Udine	3200 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02943.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02943**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 550 cm. Dislivello di 5 cm. Larghezza del marciapiede di 240 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02942	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 23, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02944)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.200 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 23, Udine	1	E 00FF5-02944

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 550 cm. Dislivello di 5 cm. Collegamento della segnaletica tattilo plantare con altri attraversamenti di 880 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02945	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 25A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02946	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 25A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

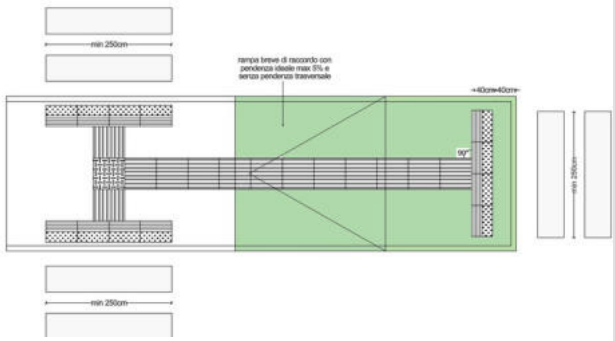

PS1889 (modificato)
Realizzazione di breve rampa, posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-02943) La segnaletica tattilo-plantare si collega alla segnaletica degli attraversamenti vicini già presenti. (ID Scheda 00FF5-02945)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.612 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 25A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02945**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02944	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 23, Udine	Costo stimato **6612 €**
E 00FF5-02946	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 25A, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

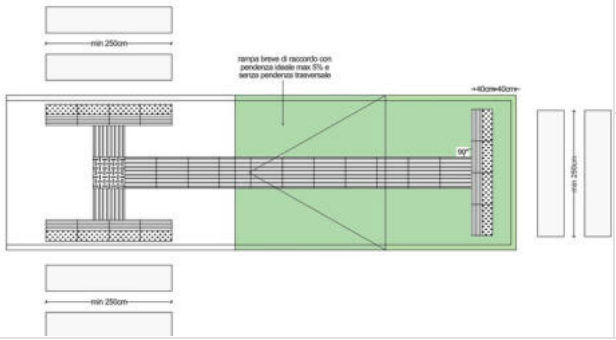

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02944.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 25A, Udine	1	E 00FF5-02946

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02945	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 25A, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02944	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 23, Udine	Costo stimato 6612 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

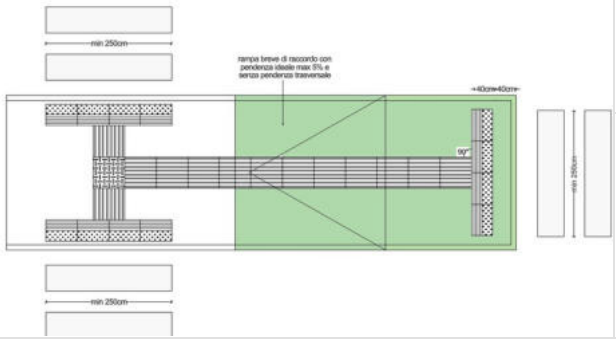

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02944.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 25A, Udine	2	E 00FF5-02947

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

2.745 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 25A, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02948

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Acciottolato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02949	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Pradamano 25A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

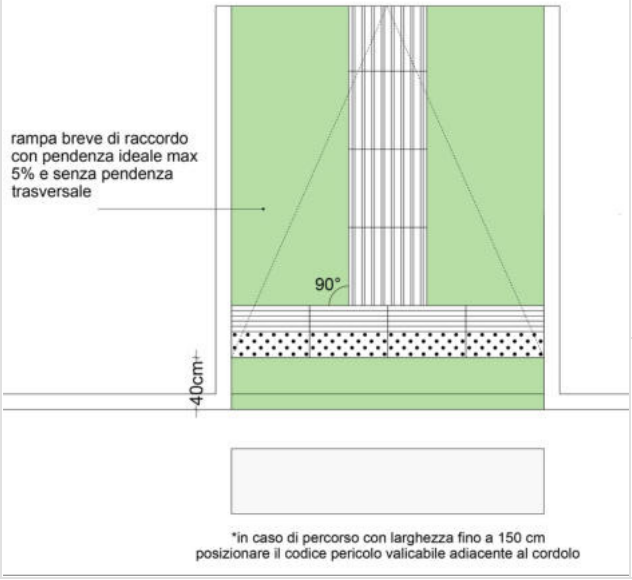

PS1850 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione e posa di segnaletica tattilo-plantare

6.625 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 25A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02949**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 500,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Acciottolato	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02948	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 25A, Udine	**6625 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

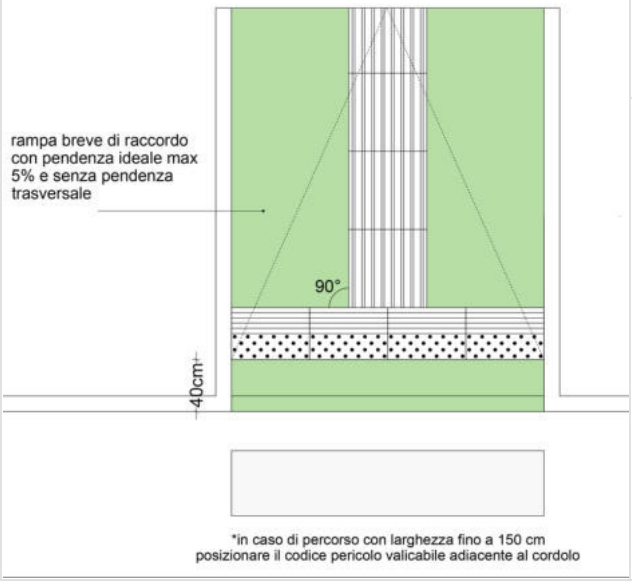

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02948.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 25A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02953**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

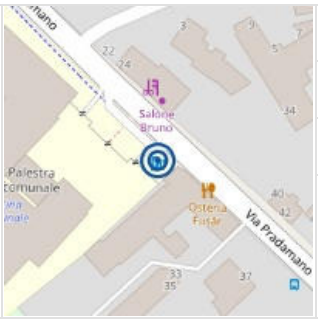

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 950,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Moduli autobloccanti in cls	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

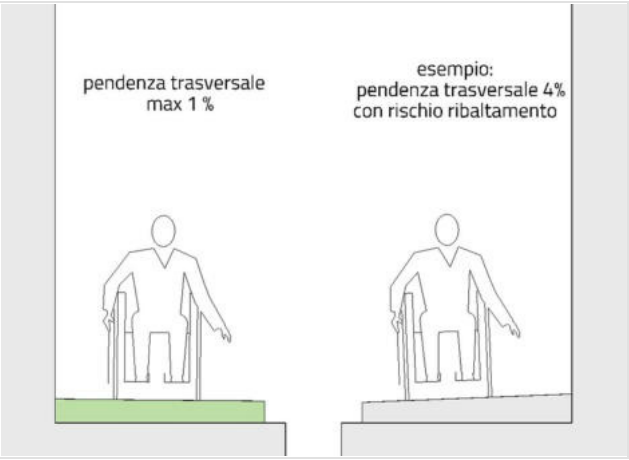

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.256 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 25A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02955**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2780,00 cm
Materiale	Acciottolato e calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

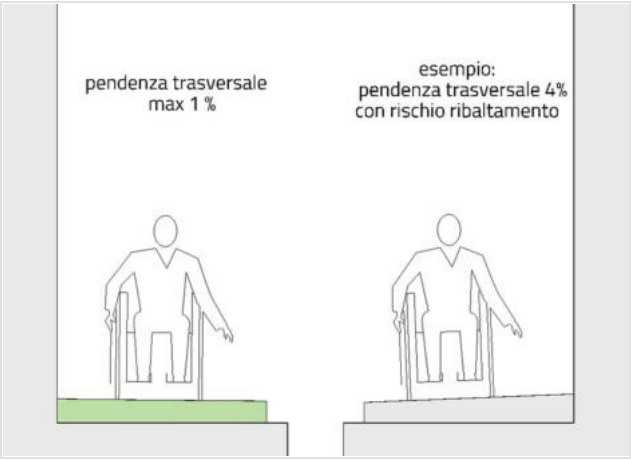

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.966 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 25, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-02956**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

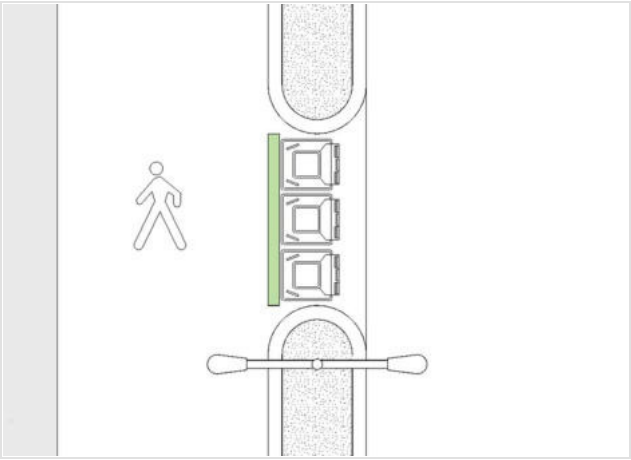

PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 29, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02957**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 175,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

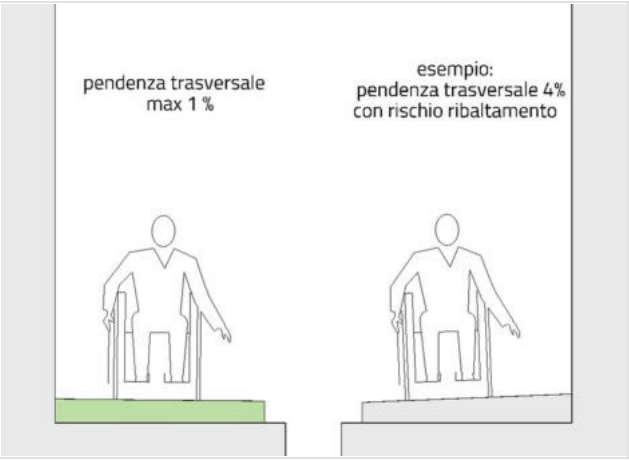

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.779 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 29, Udine	2	E 00FF5-02958

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 6100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02959	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 29, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

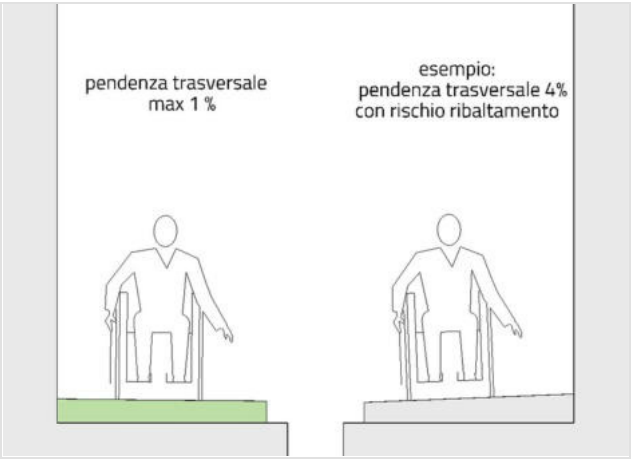

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

32.074 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 29, Udine	2	E 00FF5-02959

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 350,00 cm	Y 6100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02958	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 29, Udine	32074 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

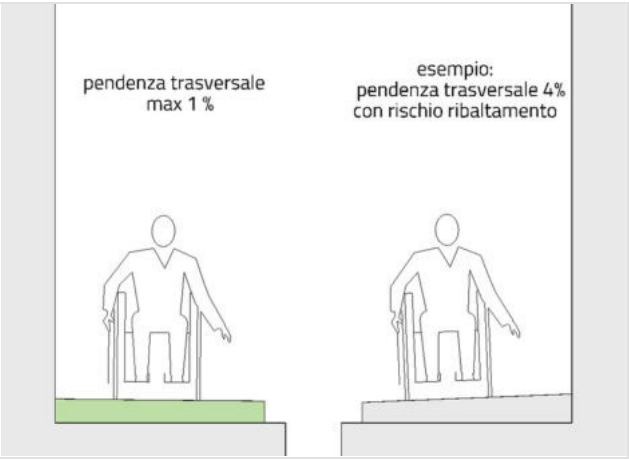

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02958.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 37, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02960

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | **OSTACOLO VERTICALE**

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Si suggerisce la rotazione del cestino di 180 gradi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

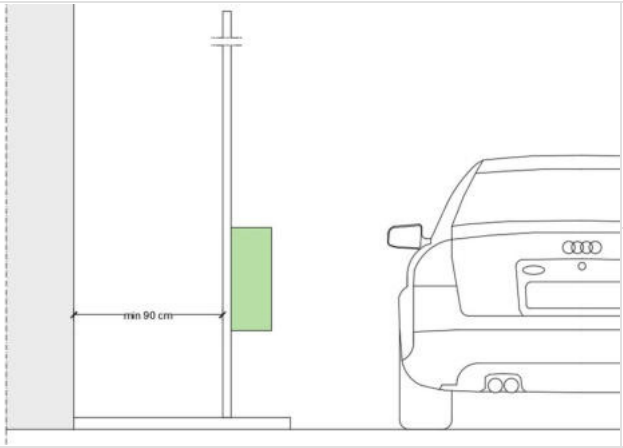

PS2012
Spostamento in area esterna e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo con cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 37, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-02961

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

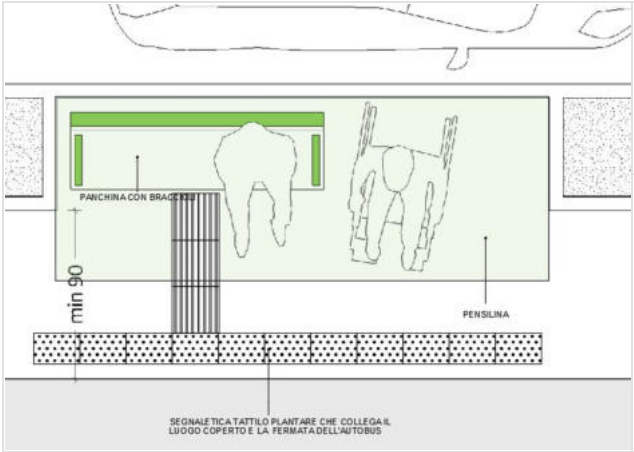

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 39A, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02962

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 470,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02963	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 39A, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

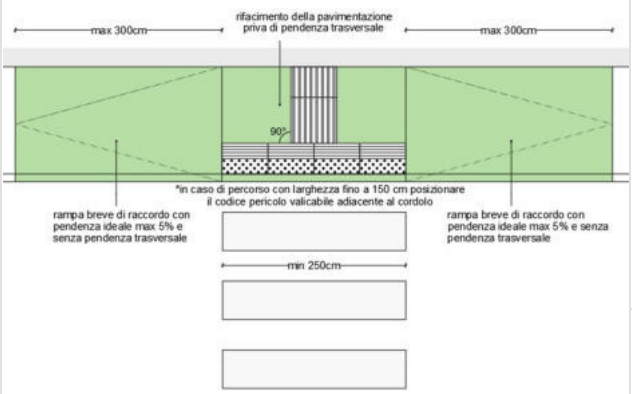

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.248 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 39A, Udine	1	E 00FF5-02963

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02962	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 39A, Udine	4248 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

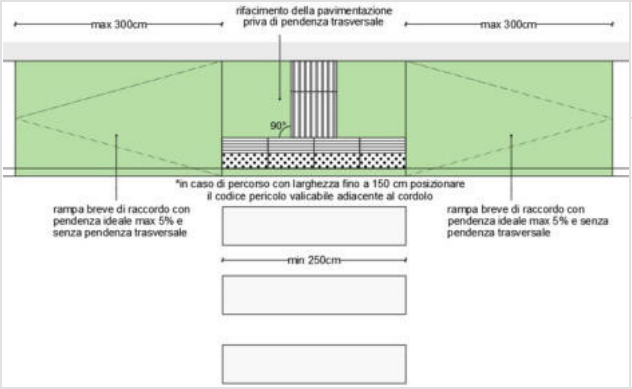

PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02962.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 39A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02964**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-02981

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

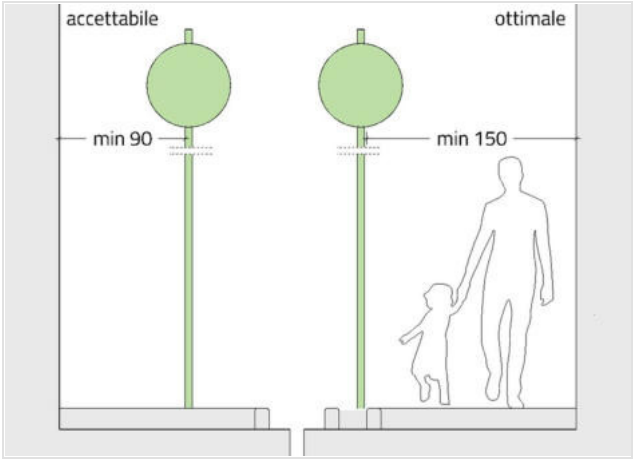

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano, Udine	2	E 00FF5-02982

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02983	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

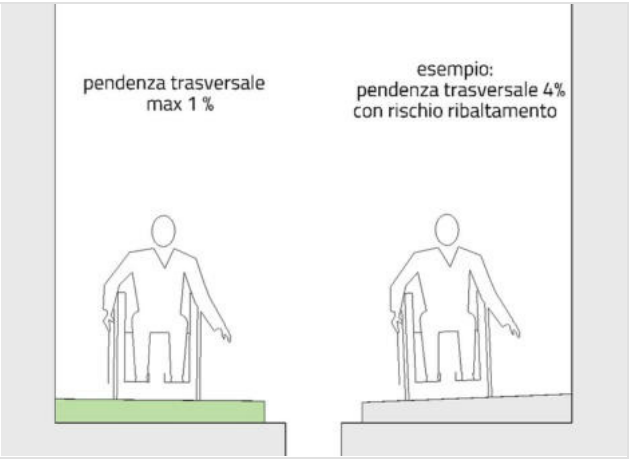

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.888 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano, Udine	2	E 00FF5-02983

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02982	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano, Udine	4888 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

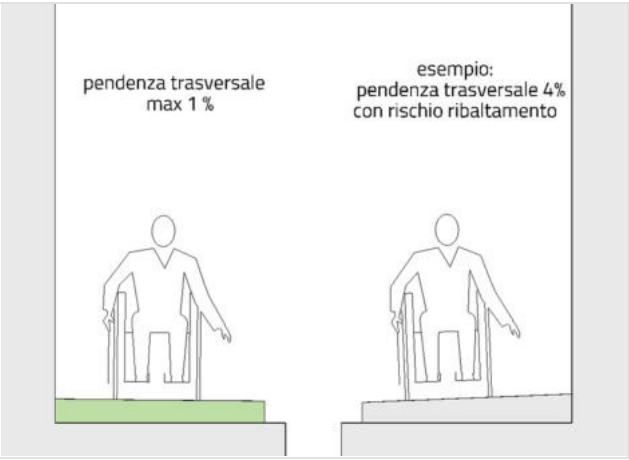

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 000FF5-02982.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02984**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 40,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

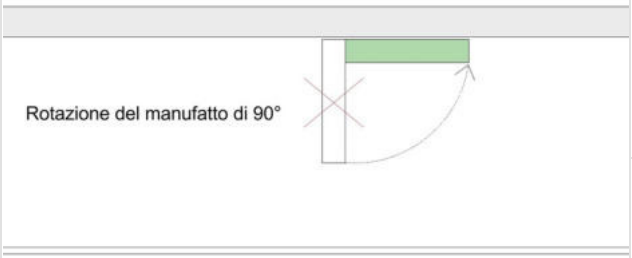

(modificato)
Rotazione del manufatto di 90°

Rotazione del contenitore per la raccolta differenziata di 90° e suo riposizionamento a contatto con il muro per non creare ostacolo alle persone con disabilità visiva e creare continuità con la guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Rotazione del manufatto di 90°

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 13-11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02985**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 5200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

Percorso pendente e con sconnessioni. Presenza lungo il percorso di ingressi carrai con pendenze più accentuate. Risolvere la criticità tenendo conto degli accessi carrai (tutti alti).

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02986	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 13-11, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

11.515 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 13-11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02986**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 5200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo

Percorso pendente e con sconnessioni. Presenza lungo il percorso di ingressi carrai con pendenze più accentuate. Risolvere la criticità tenendo conto degli accessi carrai (tutti alti).

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02985	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 13-11, Udine	Costo stimato **11515 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02985.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02987**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02988	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02989	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02990	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

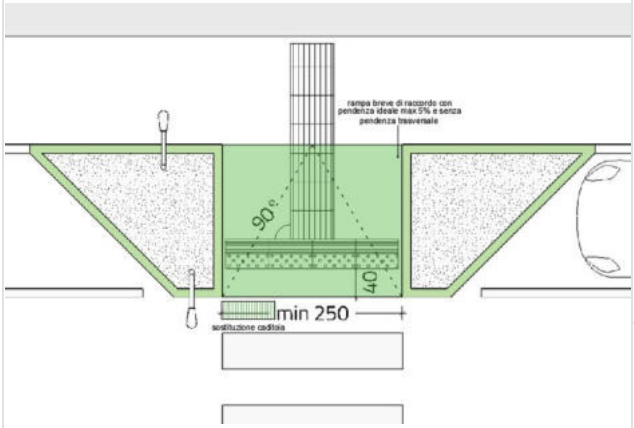

(modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, posa di segnaletica tattilo plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sistemazione dell’attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo plantare
5.063 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02988**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02987	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato **5063 €**
E 00FF5-02990	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02989	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

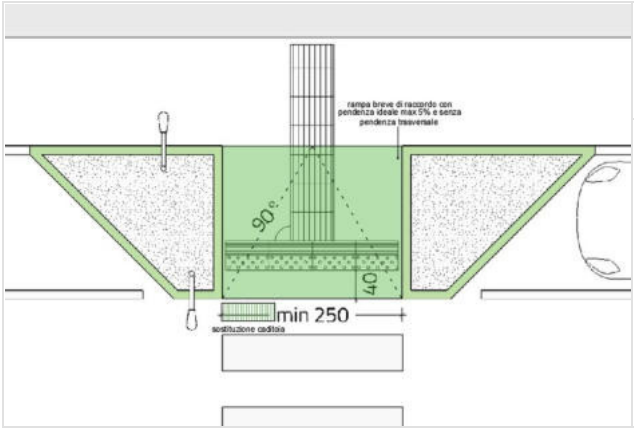

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02987.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02989**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	12	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Sede stradale affiancata in entrambi i lati da stalli di parcheggio in linea di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02987	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato **5063 €**
E 00FF5-02990	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02988	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

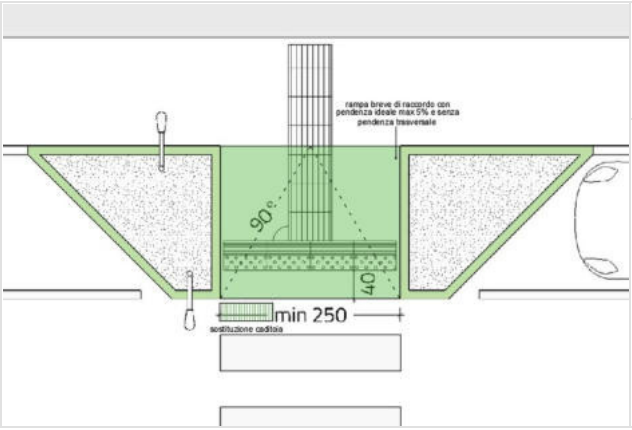

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02987.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02990**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Sede stradale affiancata in entrambi i lati da stalli di parcheggio in linea di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02987	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato **5063 €**
E 00FF5-02989	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-02988	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 12, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

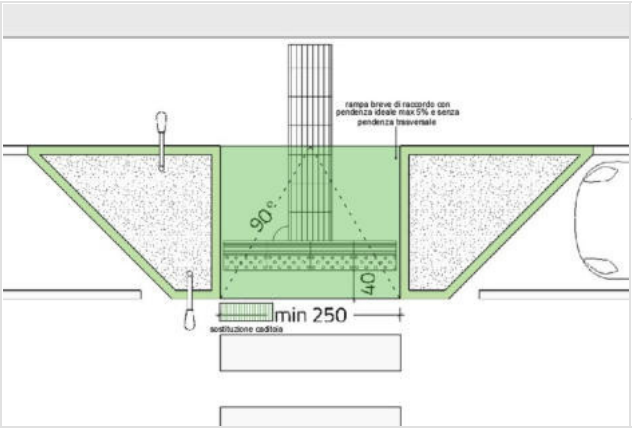

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02987.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 11, Udine	1	E 00FF5-02991

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02992	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

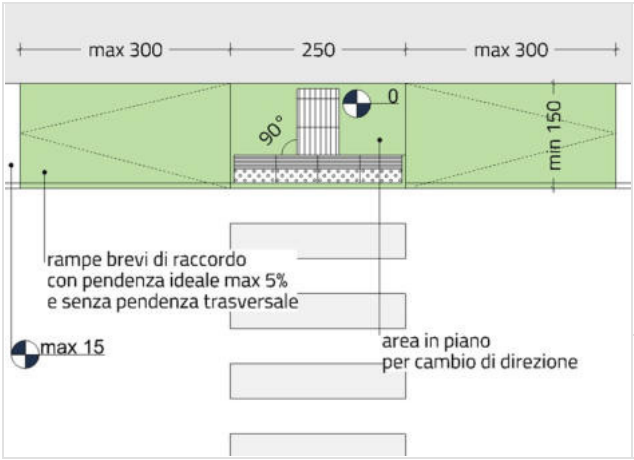

P0822 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.640 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	**Via Pradamano 11, Udine**	**1**	**E 00FF5-02992**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02991	1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 11, Udine	4640 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

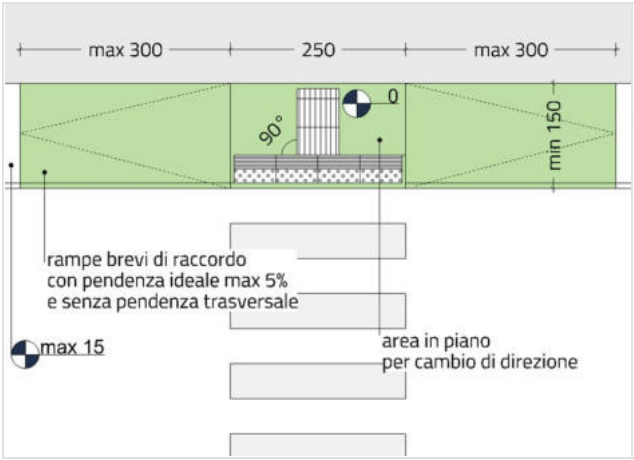

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02991.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 11, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02993**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	23	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

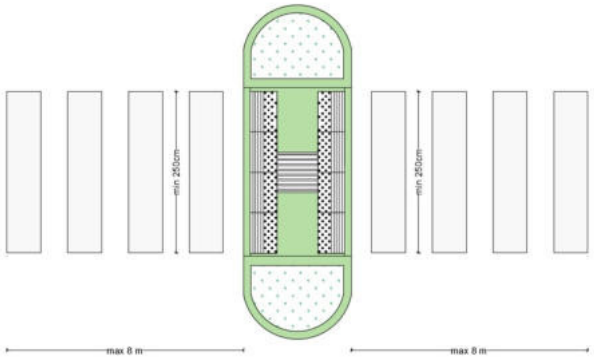

P0770 (modificato)
Realizzazione di isola pedonale

Realizzazione di isola pedonale in posizione centrale all'attraversamento, operazione facilitata dalla presenza di aiuola spartitraffico al centro dell'incrocio con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di isola pedonale

6.659 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 11, Udine	2	E 00FF5-02994

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02995	2	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 11, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

245 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 11, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02995**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02994	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 11, Udine	**245 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02994.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 41, Udine	1	E 00FF5-03115

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03116	1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 41, Udine	--
E 00FF5-03117	1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pradamano 41, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

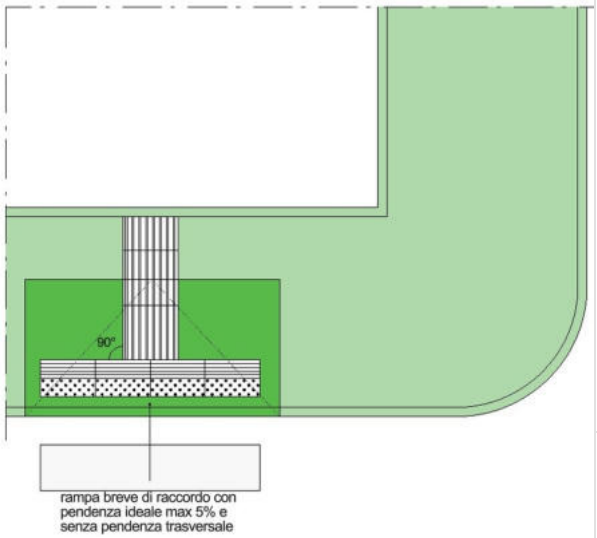

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, posa segnaletica tattilo plantare

Spostamento dell'attraversamento verso il civico 41/b per renderlo ortogonale. Rifacimento della pavimentazione con porzione in piano di almeno 150 cm per permettere la rotazione della carrozzina. Demolizione e rifacimento della rampa in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e ricostruzione e posa segnaletica tattilo plantare

7.177 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 41, Udine	1	E 00FF5-03116

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03115	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato **7177 €**
E 00FF5-03117	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

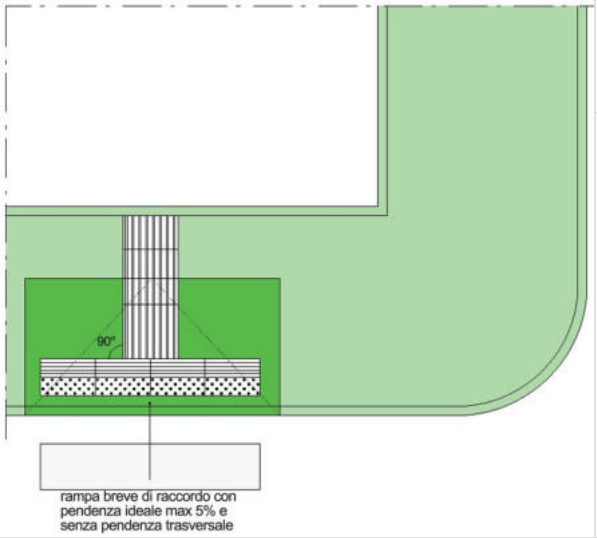

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03115.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 41, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03117**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03115	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato **7177 €**
E 00FF5-03116	LIV. 1	**Danneggiato Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

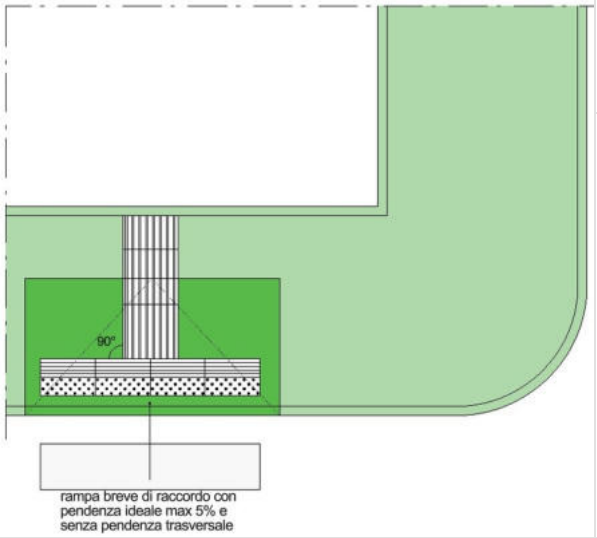

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03115.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03118**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03119	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato **704 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03117.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 41, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03119**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03118	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 41, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1964 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Spostamento della segnaletica in posizione ortogonale rispetto alla sede stradale secondo schema della criticità n 00FF5-03115. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

704 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	1	E 00FF5-03120

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03121	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03123	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

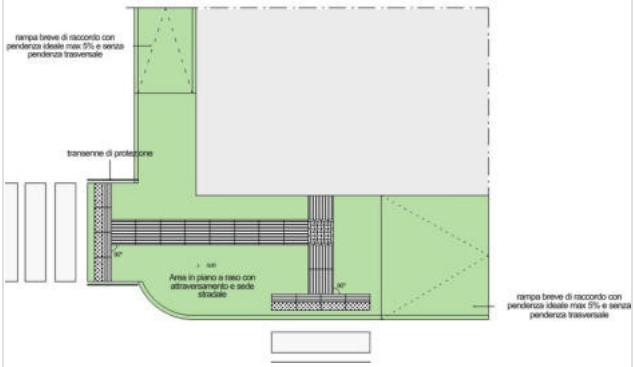

(modificato)
Rifacimento della pavimentazione, rifacimento delle rampe laterali e riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione in prossimità dell'attraversamento in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di transenne parapedonali. Rifacimento delle rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

10.385 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03121**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03120	LIV. **1**	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **10385 €**
E 00FF5-03123	LIV. **1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

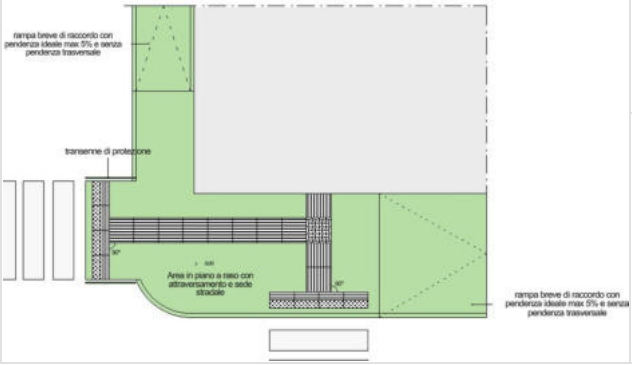

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03120.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03122**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03124	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	**880 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03124.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03123**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	10	≤ 8 m
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03120	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **10385 €**
E 00FF5-03121	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

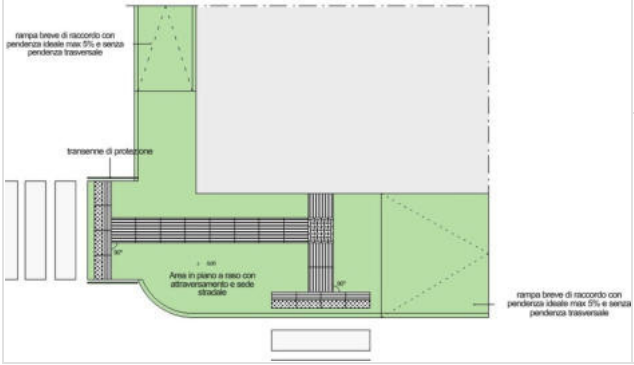

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03120.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03124**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03122	LIV. **2**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1964
Sistemazione della pavimentazione e della segnaletica dell'attraversamento pedonale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Compreso rifacimento della segnaletica orizzontale. Sistemazione dell'attraversamento pedonale con anche il rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale e della pavimentazione dell'attraversamento pedonale

880 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	1	E 00FF5-03125

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

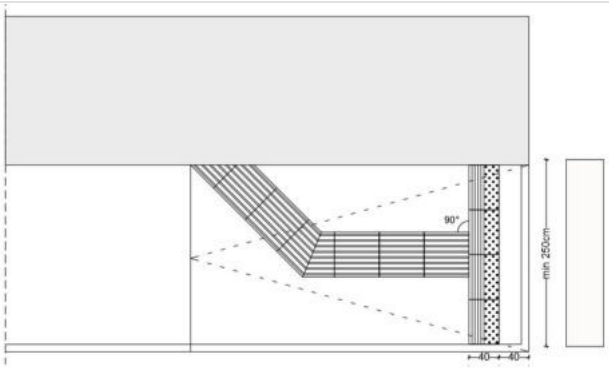

PS1897 (modificato)
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare

Sostituzione dei moduli tattilo-plantari non coerenti, realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della segnaletica tattilo-plantare **3.885 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03127**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03128	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

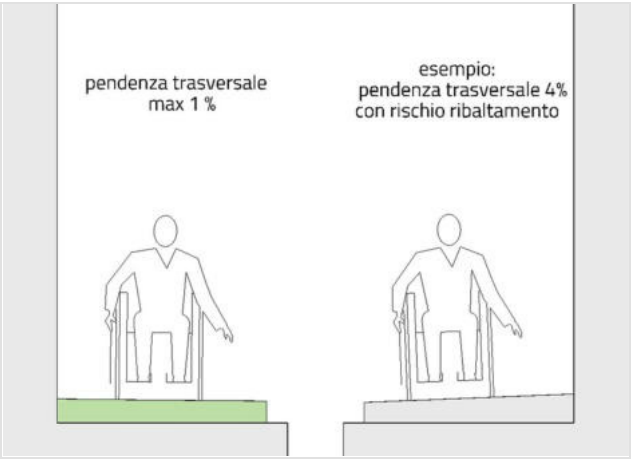

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

11.431 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	2	E 00FF5-03128

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03127	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 62, Udine	11431 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

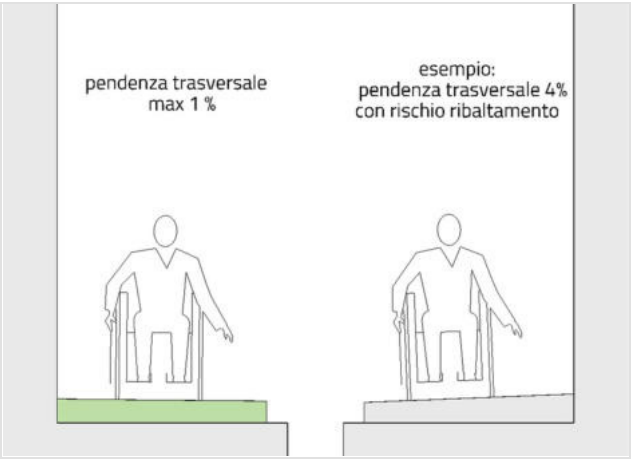

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03127.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	3	E 00FF5-03129

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 220 cm. Larghezza totale del marciapiede di 235 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

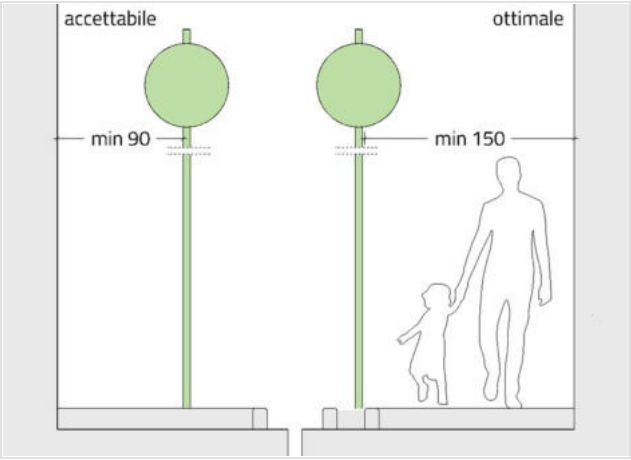

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	2	E 00FF5-03130

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
La pensilina riduce la larghezza di passaggio a 80 cm.
Assenza di panchina con braccioli e schienale e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

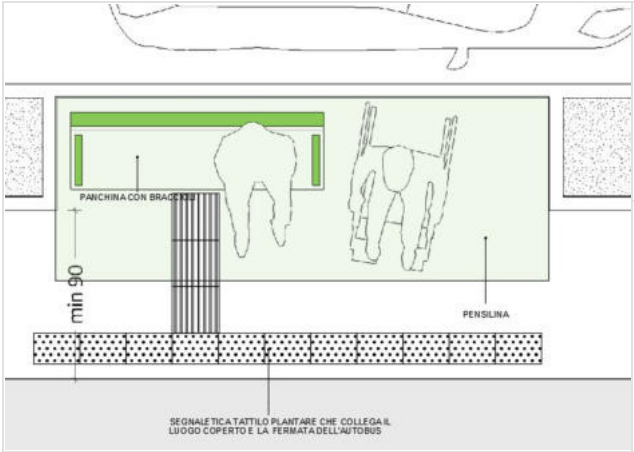

PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, panchina con schienale e braccioli e riduzione della profondità della pensilina in modo da garantire un passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.015 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03131**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	**10**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 410,00 cm**	**Y --**
Materiale	**Asfalto**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03132	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

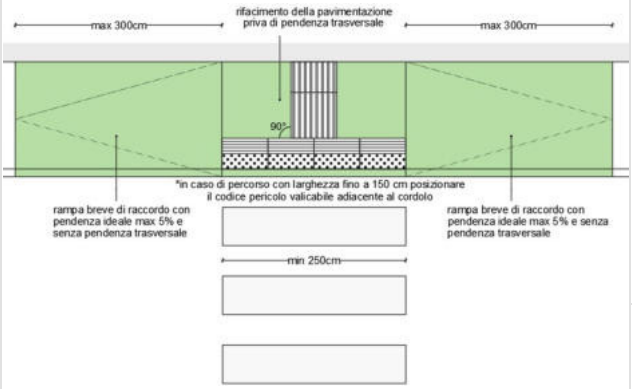

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.468 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	1	E 00FF5-03132

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 410,00 cm	Y 215,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03131	1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 62, Udine	4468 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

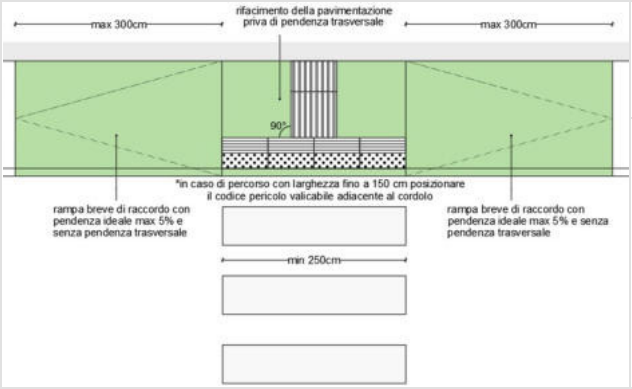

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03131.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	1	E 00FF5-03133

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2009
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo o eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 62, Udine	1	E 00FF5-03134

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03135	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	--
E 00FF5-03136	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	--
E 00FF5-03137	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	--
E 00FF5-03138	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	--
E 00FF5-03139	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 62, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

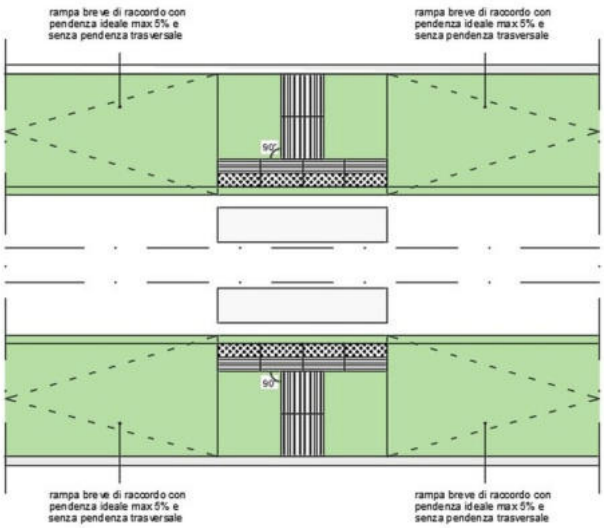

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso su via Giovanni Battista Grassi . Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza della rampa esistente, rifacimento della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale, rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale e rifacimento del tratto di percorso con rampe di raccordo

12.689 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03135**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento pedonale su Via Giovanni Battista Grassi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03134	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **12689 €**
E 00FF5-03136	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03137	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03138	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03139	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

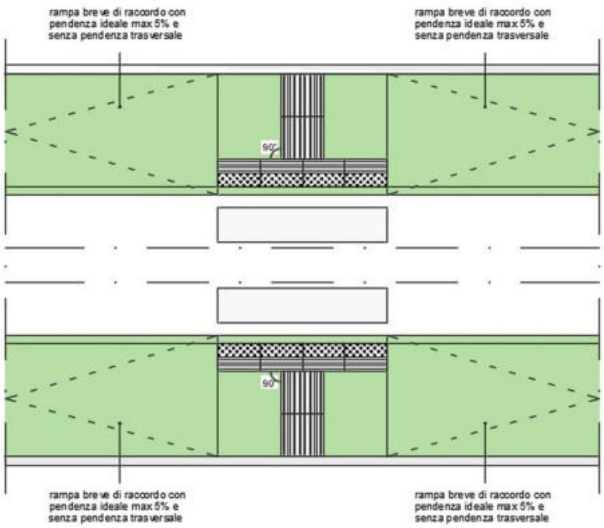

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03136**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento pedonale su Via Giovanni Battista Grassi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03134	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **12689 €**
E 00FF5-03135	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03137	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03138	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03139	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

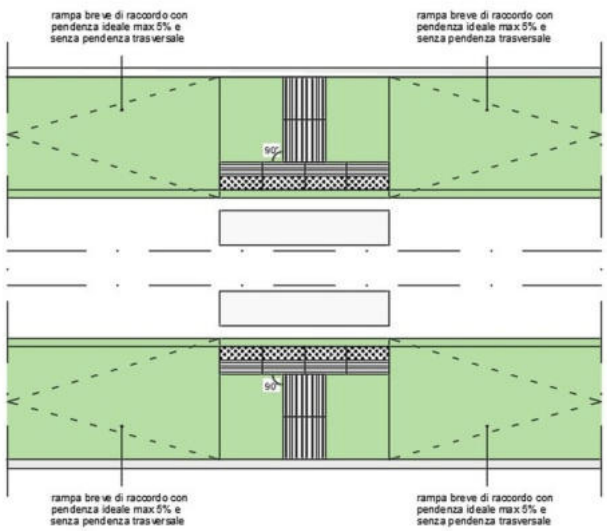

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03137**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Si consiglia lo spostamento dell'attraversamento pedonale su Via Giovanni Battista Grassi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03134	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **12689 €**
E 00FF5-03135	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03136	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03138	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03139	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

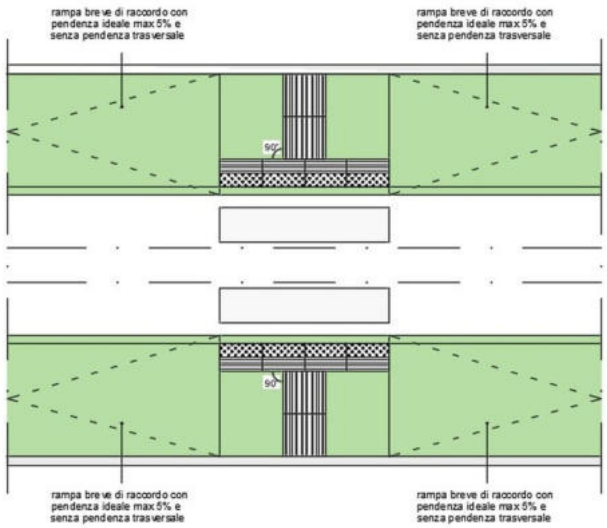

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 62, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03138

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si
Dimensioni	X 190,00 cm Y 190,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti
Note relative al rilievo	--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03134	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **12689 €**
E 00FF5-03135	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03136	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03137	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03139	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

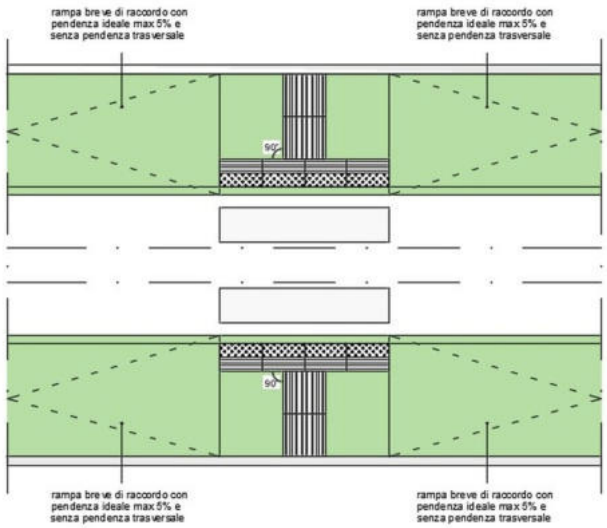

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03139**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03134	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato **12689 €**
E 00FF5-03135	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03136	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03137	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03138	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 62, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

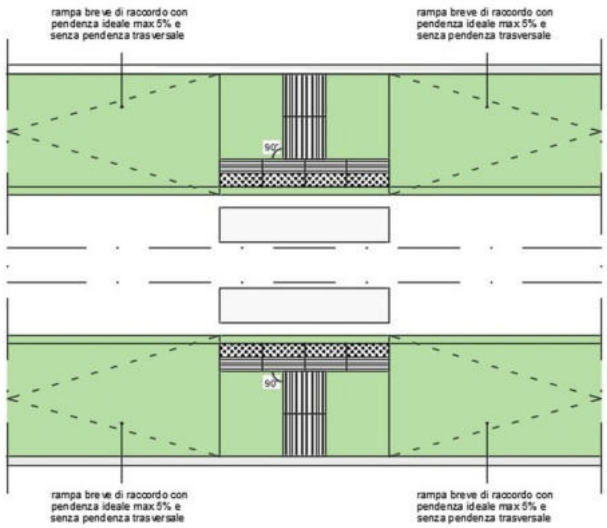

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03134.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 07 Ottobre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03140**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 28,00 cm	Y 28,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 55 cm. Altezza del cestino di 50 cm. Si suggerisce la rotazione del cestino di 90 gradi verso la sede stradale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

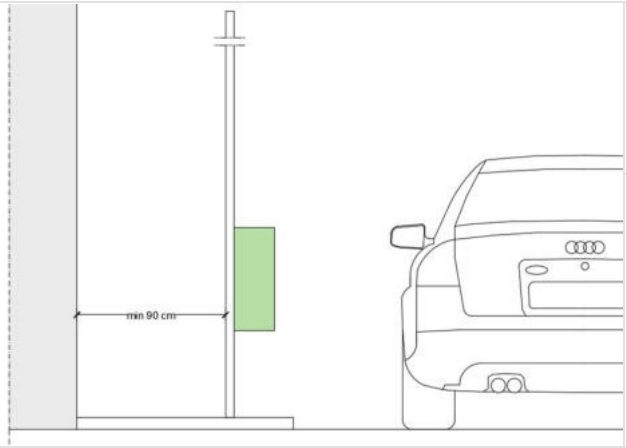

PS1737
Rotazione del cestino di 90°

Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dello lungo il percorso da persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Rotazione del cestino di 90°

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03141**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 345,00 cm	Y 4900,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

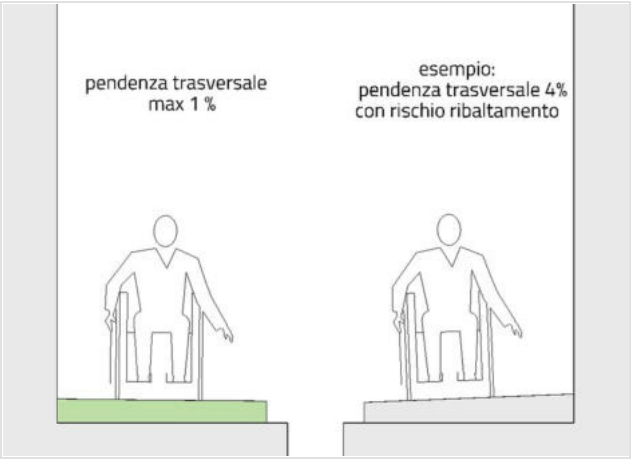

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

25.636 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 62, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03142**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

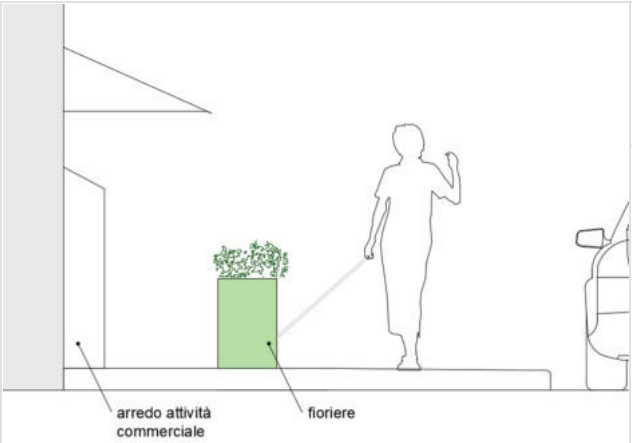

PS1969 (modificato)
Delimitazione dell'area

Delimitazione dell'area antistante il supermercato con fioriere o elementi di arredo urbano per separare la proprietà pubblica da quella privata.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione dell'area

1.500 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03143**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	**15**	≤ 2,5 cm
Dimensioni	**X 300,00 cm**	**Y --**
Materiale	**Porfido a cubetti**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03144	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 56, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

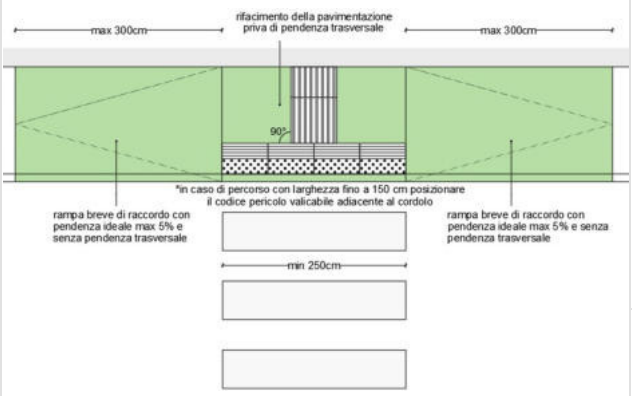

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.526 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 56, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03144

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03143	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 56, Udine	Costo stimato **5526 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

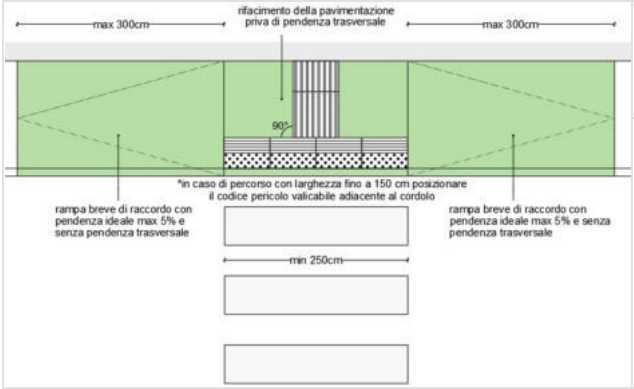

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03143.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03145**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

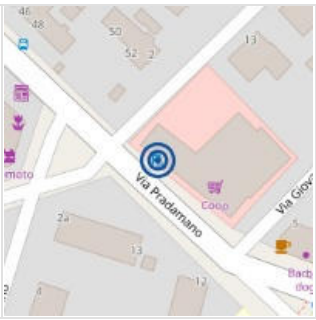

Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 1150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Porta biciclette. Dimensioni comprese di bicicletta posteggiate.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0633 (modificato)
Interlocuzione con soggetto privato interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto privato per sostituzione rastrelliere esistenti al fine di posizionarle altre che costituiscano elemento di guida naturale atto a delimitare la proprietà pubblica dalla privata e non creare ostacolo alla mobilità sul suolo pubblico.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione rastrelliere esistenti **182 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03146**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Assenza di stallo riservato. Dislivello del marciapiede di 15 cm per collegamento.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

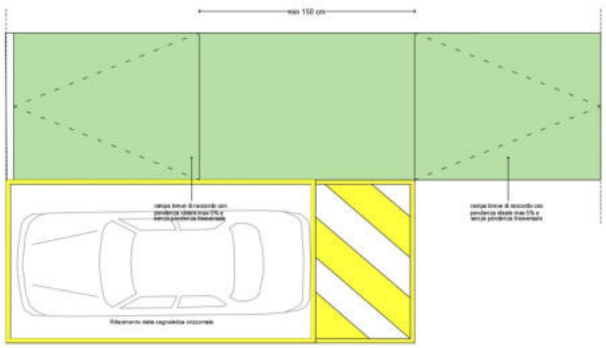

PS1840 (modificato)
Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità (in linea)

Realizzazione di stallo riservato a persone con disabilità con pavimentazione piana e continua, segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante brevi rampe di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

3.588 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03147**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03148	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 56, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

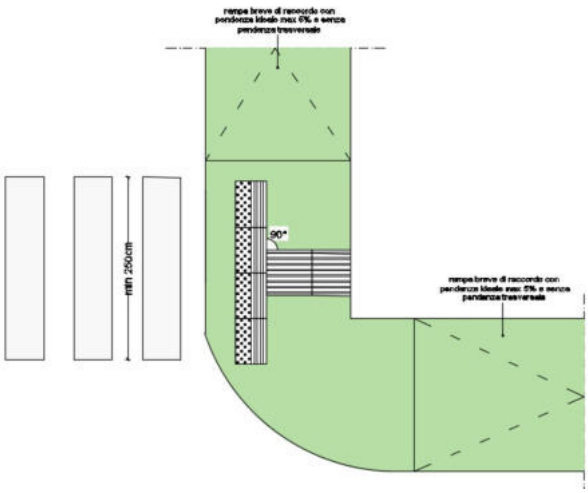

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento della porzione di pavimentazione più prossima all'attraversamento in piano e rifacimento delle rampe di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.222 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 56, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03148**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03147	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 56, Udine	**5222 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

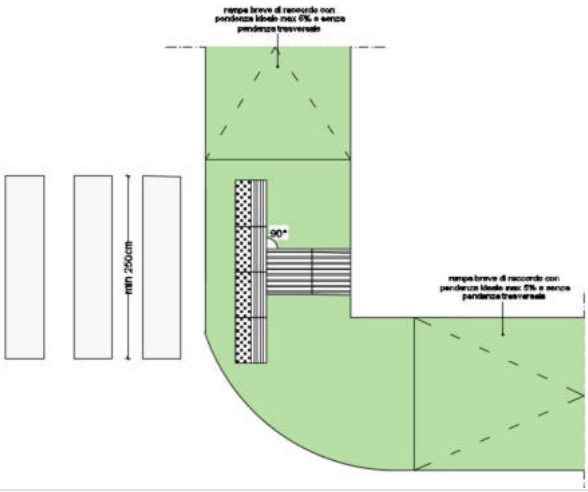

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03147.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03149**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03150	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 52, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante realizzazione di marciapiede in continuità con il livello della sede stradale. Realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO **Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare**	**5.243 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 52, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03150**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03149	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Pradamano 52, Udine	Costo stimato **5243 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03149.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 52-34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03151**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 9300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Percorso intervallato da ingressi carrai alti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03152	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 52-34, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

24.508 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 52-34, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03152**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 9300,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Percorso intervallato da ingressi carrai alti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03151	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 52-34, Udine	Costo stimato **24508 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03151.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 39A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03153**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03154	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 39A, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

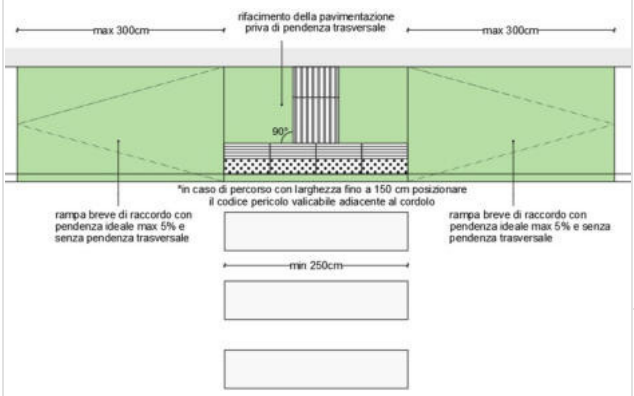

PS1216 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.978 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 39A, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03154**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03153	**1**	**Altezza Dislivello** Via Pradamano 39A, Udine	**4978 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

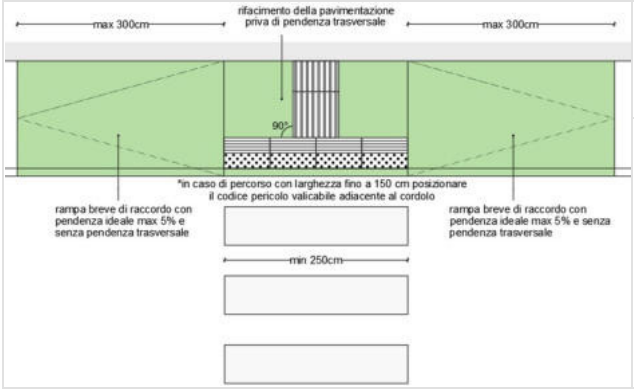

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03153.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 48A, Udine	2	E 00FF5-03155

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
La pensilina riduce la larghezza di passaggio a 85 cm.
Assenza di panchina con braccioli e schienale e segnaletica tattilo plantare.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

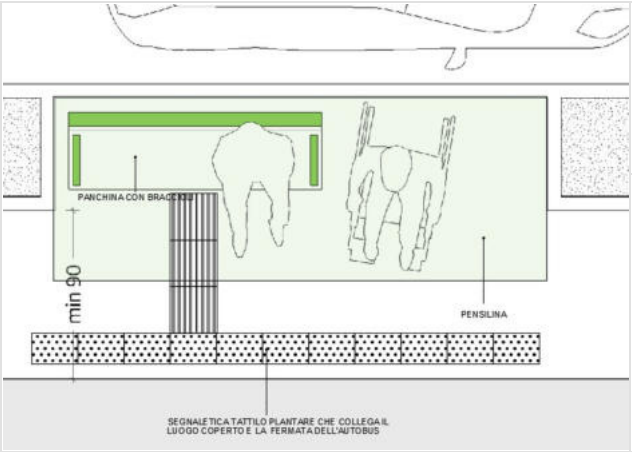

PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, panchina con schienale e braccioli e sostituzione di pensilina.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.196 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 48A, Udine	3	E 00FF5-03156

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo

Palo con cestino. Distanza di 23 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 200 cm. Larghezza totale del marciapiede di 230 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

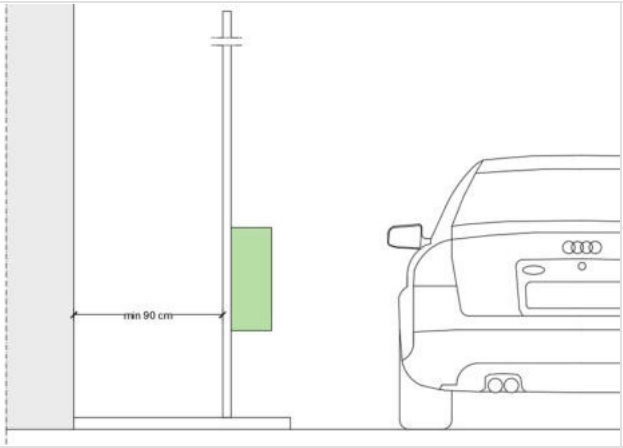

(modificato)
Spostamento in area esterna e rotazione del cestino di 90°

Spostamento del palo con cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato. Rotazione del cestino di 90° verso la sede stradale per garantire il passaggio minimo di 90 cm ed evitare l'intercettazione dell'elemento lungo il percorso da parte di persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo in area esterna al percorso pedonale e rotazione del cestino di 90°

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 42, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03157

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 9 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 203 cm. Larghezza totale del marciapiede di 215 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

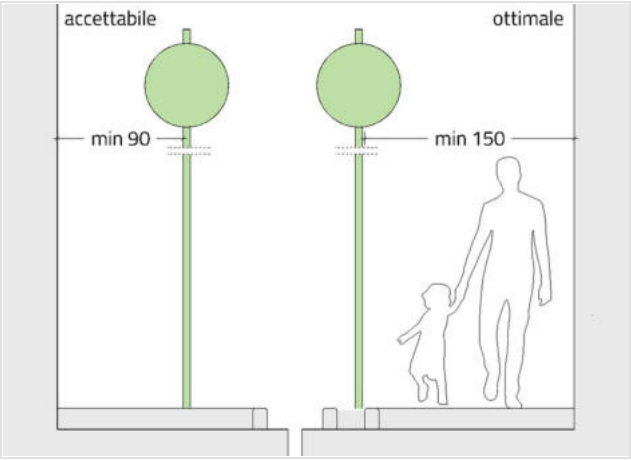

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 30-24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03158**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03159	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 30-24, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1973
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute ai passi carrai e realizzazione di rampe carrabili

11.912 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 30-24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03159**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 3700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03158	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 30-24, Udine	Costo stimato **11912 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03158.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 26, Udine	1	E 00FF5-03161

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 230,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

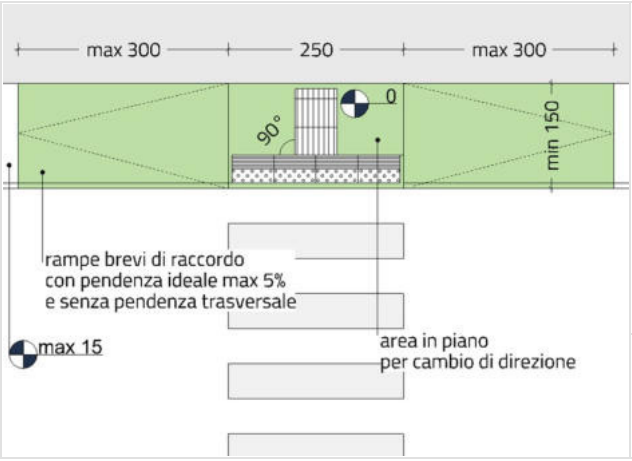

P0871 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

5.501 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 24, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03162**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 780. Dislivello di 11 cm. Larghezza del marciapiede 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

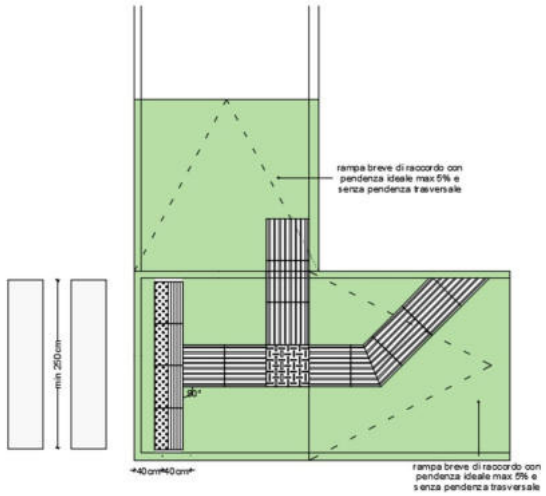

PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03163)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.726 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pradamano 24, Udine	1	E 00FF5-03163

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 780,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 780. Dislivello di 10 cm. Larghezza del marciapiede 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con parte in piano e realizzazione di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03162)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.023 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pradamano 24-12, Udine	2	E 00FF5-03164

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 4850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Percorso intervallato da accessi carrai alti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03165	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 24-12, Udine	9843 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

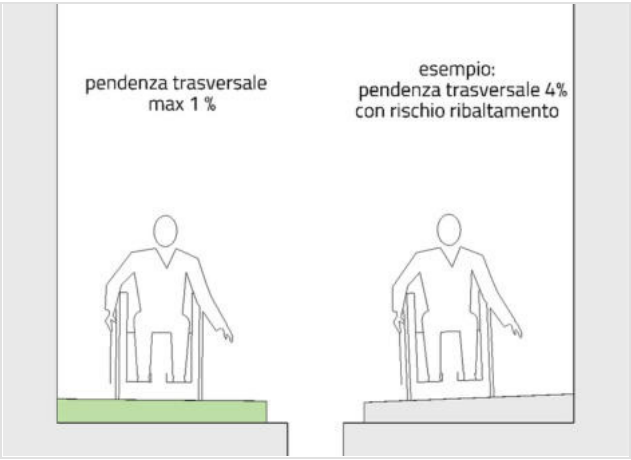

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03165.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 24-12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03165**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 4850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Percorso intervallato da accessi carrai alti.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03164	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pradamano 24-12, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

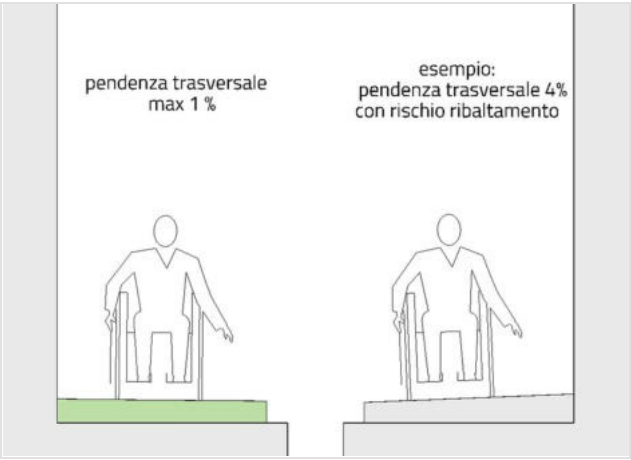

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

9.843 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 24, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03166**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

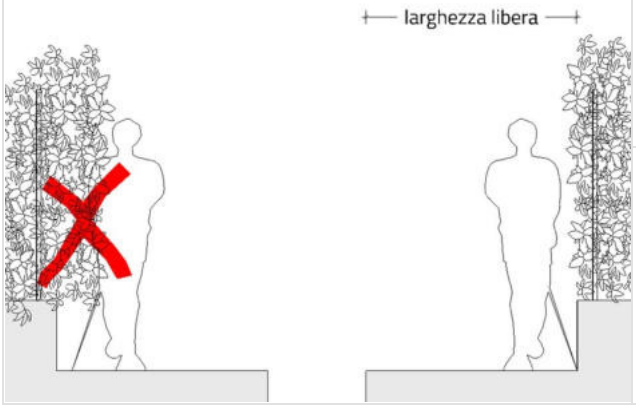

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

280 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 18, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03167**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo e panchina con braccioli e schienale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa della ridotta larghezza del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03168**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03169	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pradamano 12, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

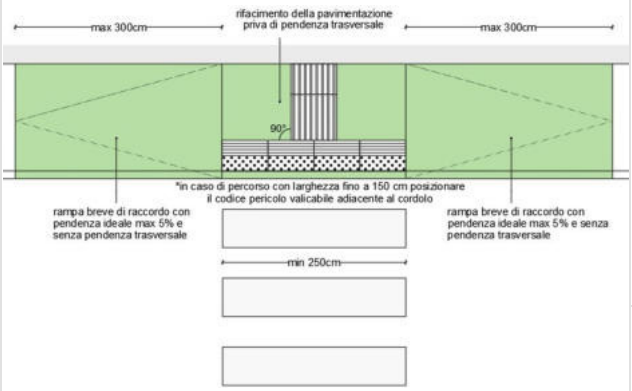

PS2014
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.656 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pradamano 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03169**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03168	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pradamano 12, Udine	**3656 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

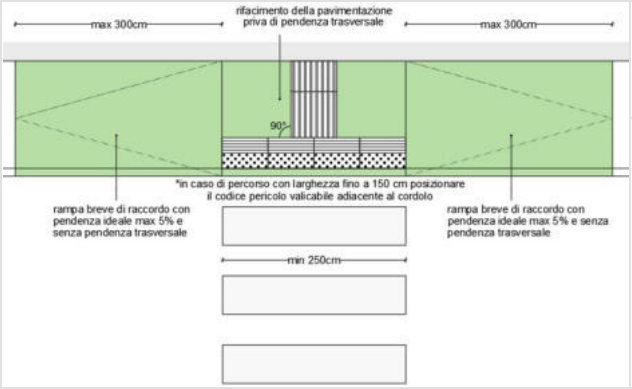

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03168.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pradamano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pradamano 12, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03170

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

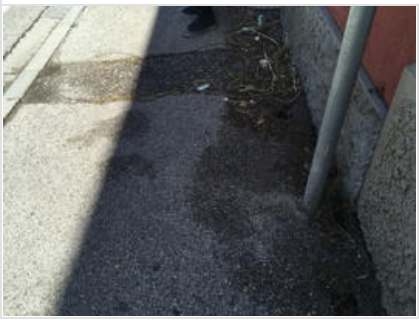

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 180 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

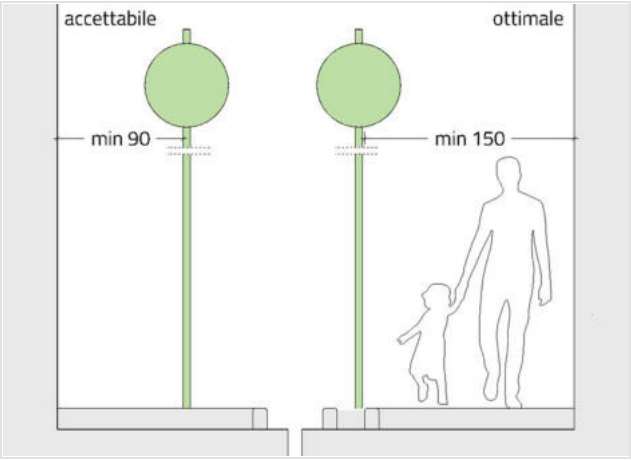

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzá 1, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02966**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

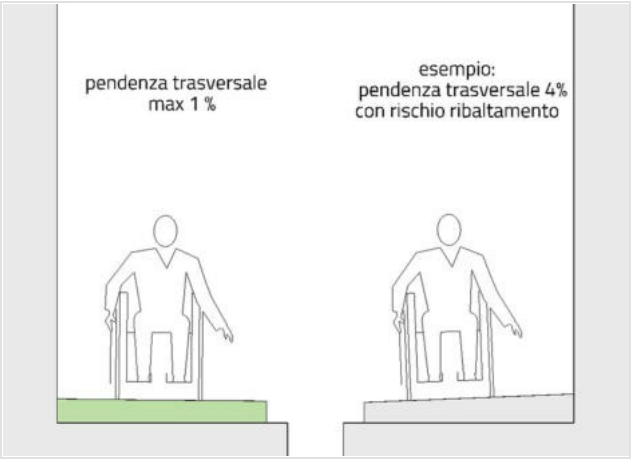

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

14.167 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzà 26, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02967**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02968	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02969	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02976	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02977	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

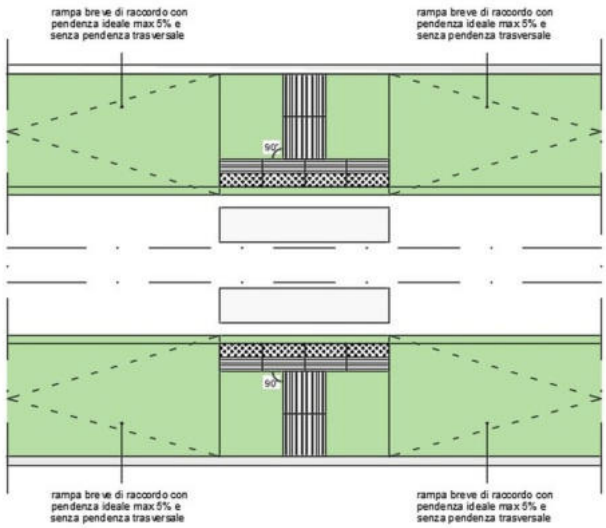

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso verso il civico 14 per permettere una migliore gestione delle rampe di discesa e risalita, che non intralcino gli accessi carrai. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale a raso **8.749 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzà 26, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02968**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	14	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02967	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato **8749 €**
E 00FF5-02977	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02976	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02969	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

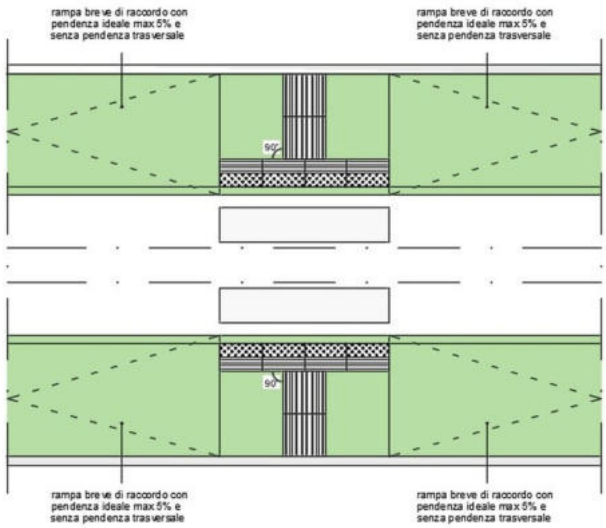

PS1259 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pietro di Brazzà 26, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-02969

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

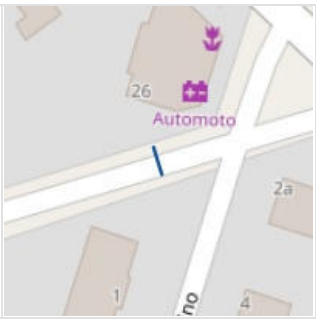

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02967	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato **8749 €**
E 00FF5-02977	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02976	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02968	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

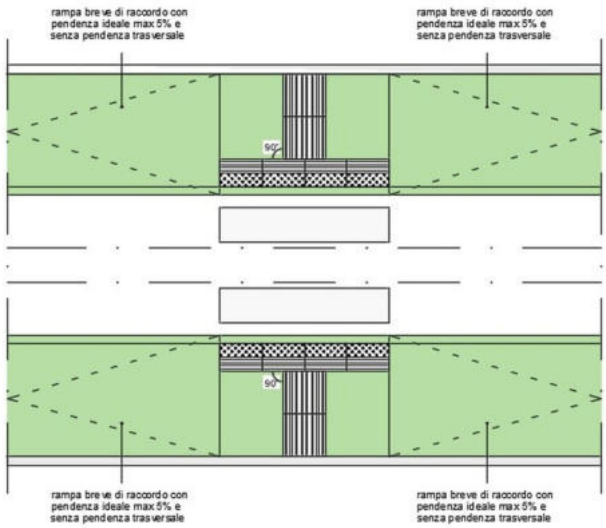

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzá 26-12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02970**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e calcestruzzo	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02971	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pietro di Brazzá 26-12, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

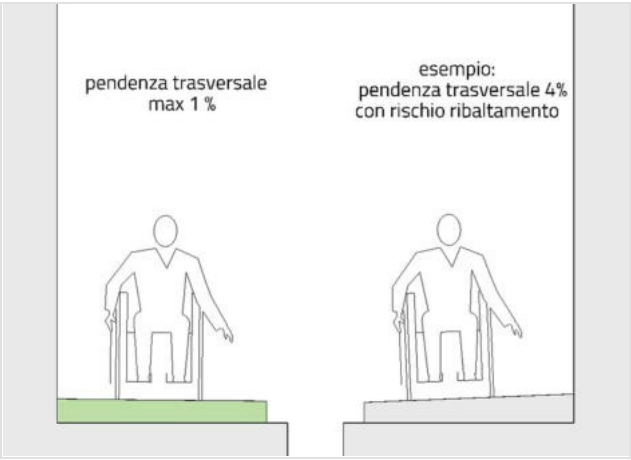

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

17.964 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzá 26-12, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02971**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti e calcestruzzo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02970	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pietro di Brazzá 26-12, Udine	**17964 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

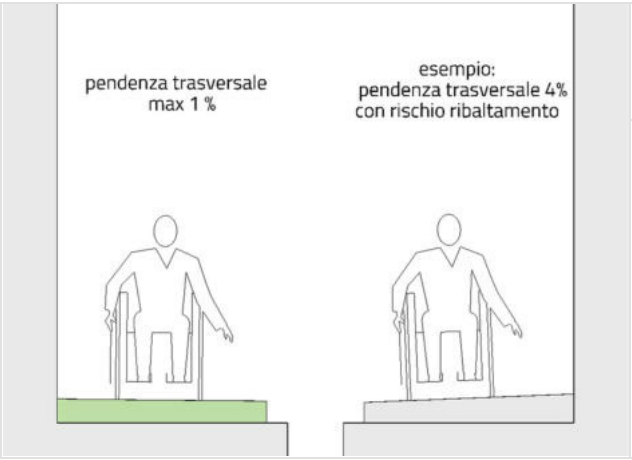

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02970.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzá 12, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02972**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 750 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02973)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.967 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pietro di Brazzà 15, Udine	1	E 00FF5-02973

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale 750 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02972)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.884 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pietro di Brazzà 15, Udine	2	E 00FF5-02974

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02975	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

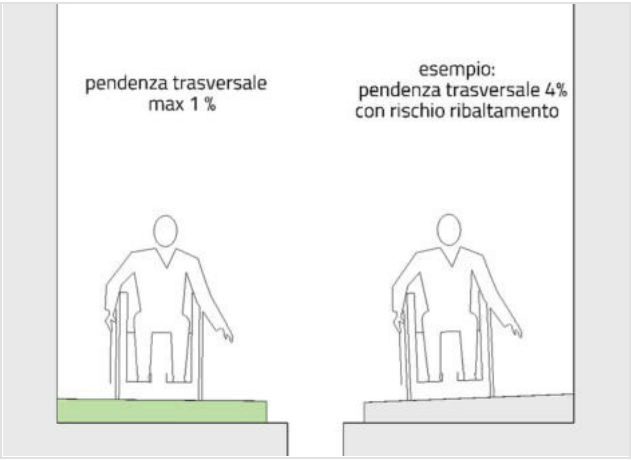

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

16.082 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzà 15, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02975**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 7600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02974	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	**16082 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

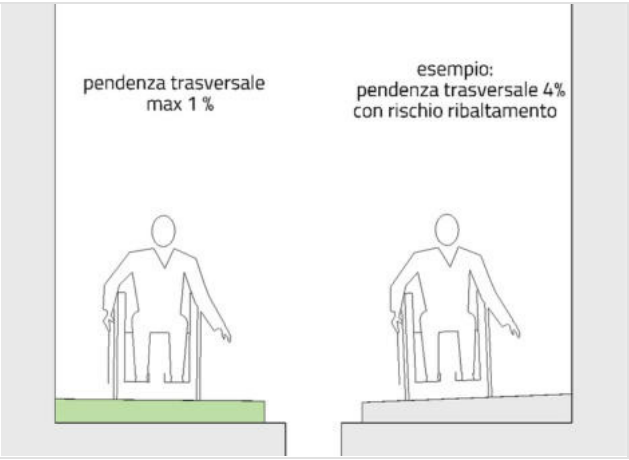

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02974.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzà 15, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02976**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02967	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato **8749 €**
E 00FF5-02977	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02969	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02968	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

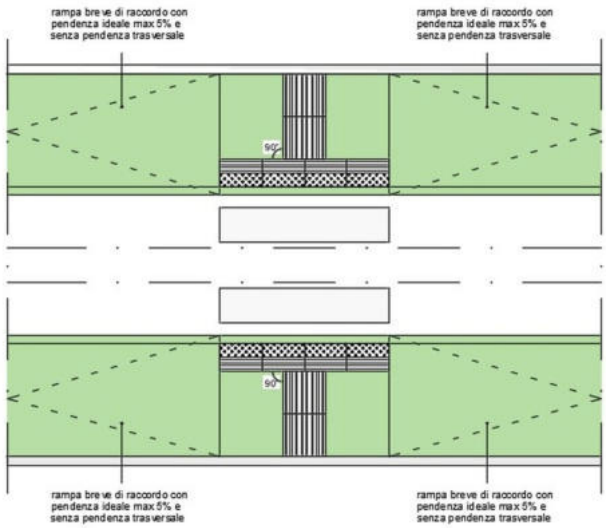

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pietro di Brazzá

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pietro di Brazzà 15, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02977**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02967	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato **8749 €**
E 00FF5-02976	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pietro di Brazzà 15, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02969	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-02968	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pietro di Brazzà 26, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

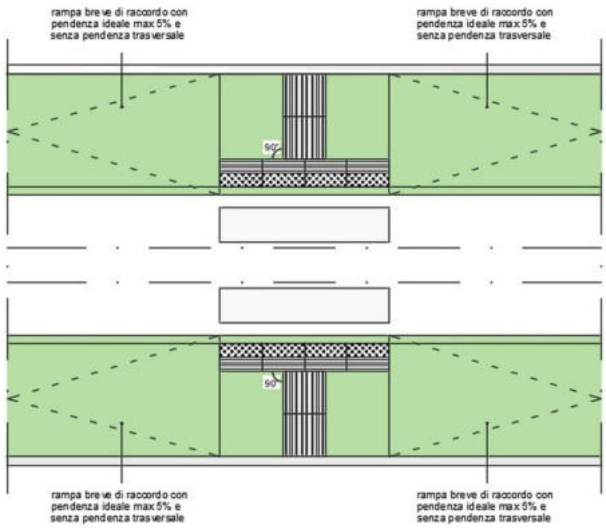

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02967.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Eustachio Celebrino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Eustachio Celebrino 1, Udine	1	E 00FF5-02978

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

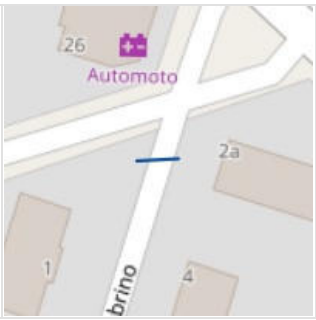

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02979)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.104 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Eustachio Celebrino

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Eustachio Celebrino 2A, Udine	1	E 00FF5-02979

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

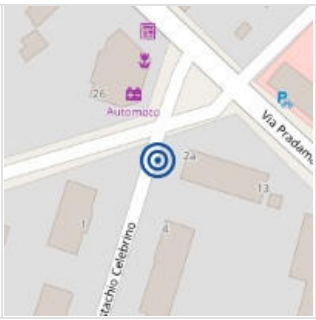

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-02978)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.016 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Eustachio Celebrino

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Eustachio Celebrino 2A, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02980**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

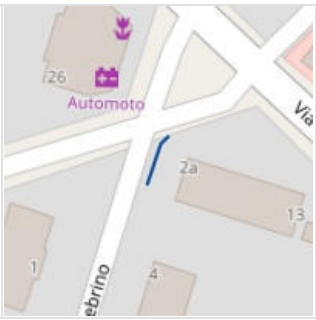

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1570,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

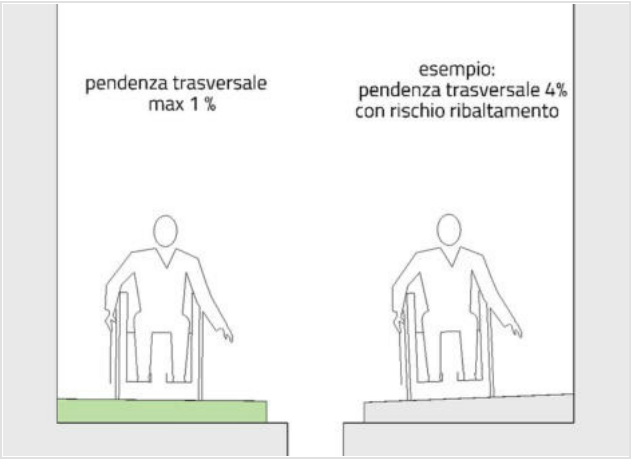

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.171 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-02996**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 1400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

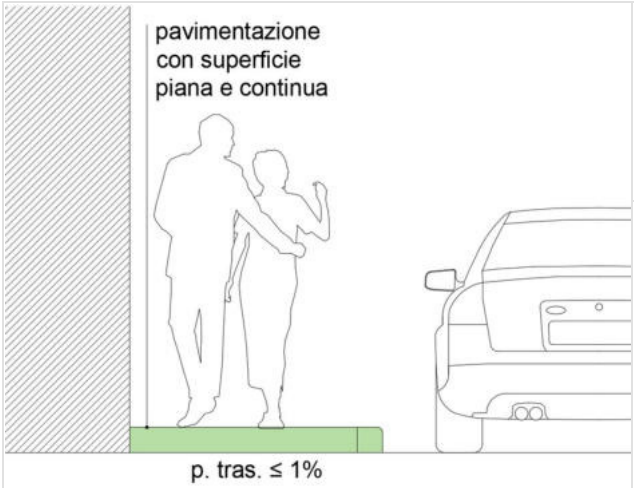

PS1882
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

3.075 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02997**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali nn percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

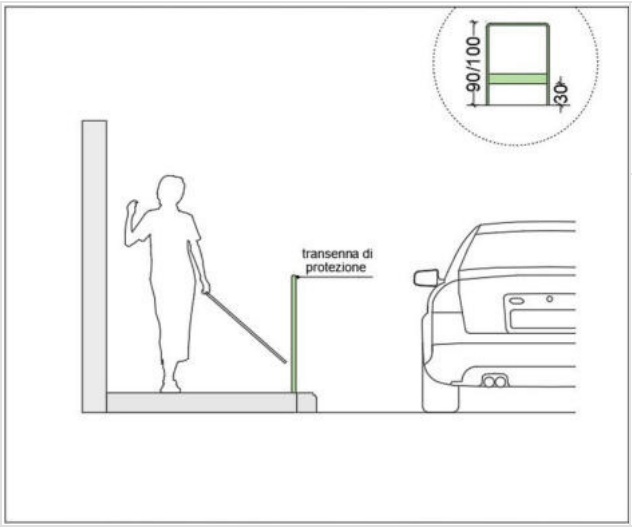

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne **1.861 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02998**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 206,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02999	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03000	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03001	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03002	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03037	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

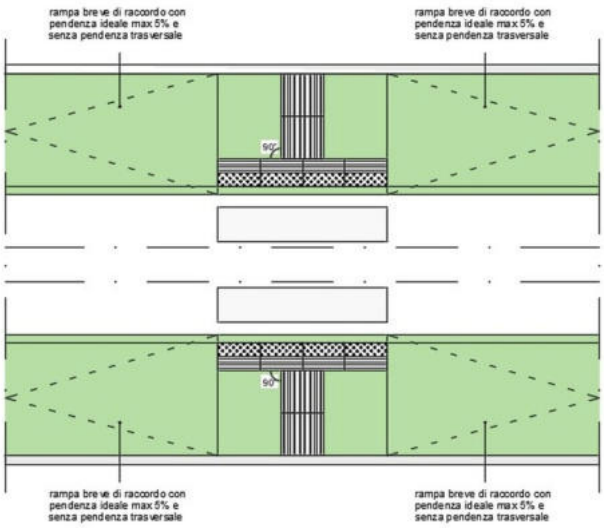

(modificato)
Spostamento di attraversamento pedonale a raso

Spostamento dell'attraversamento pedonale a raso verso il civico n 3. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. In corrispondenza della rampa esistente, rifacimento della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale. Contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento e suo posizionamento ortogonale rispetto alla sede stradale

STIMA DEL COSTO
Spostamento di attraversamento pedonale e rifacimento del tratto di percorso con rampe di raccordo

8.225 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-02999**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare non conforme perché curva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02998	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato **8225 €**
E 00FF5-03000	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03001	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03002	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03037	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

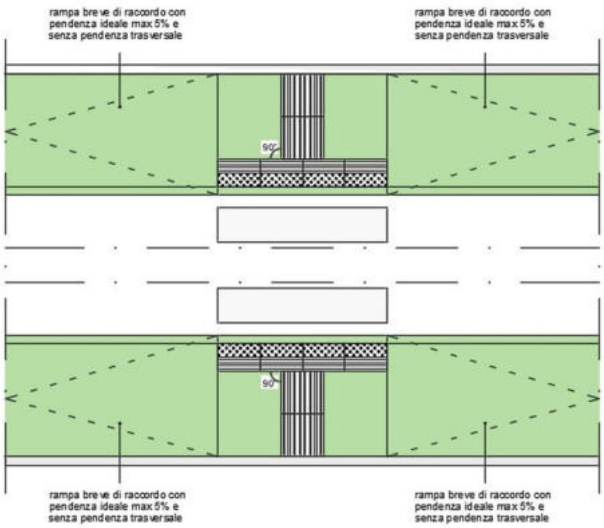

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02998.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03000**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 970,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02998	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato **8225 €**
E 00FF5-02999	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03001	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03002	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03037	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

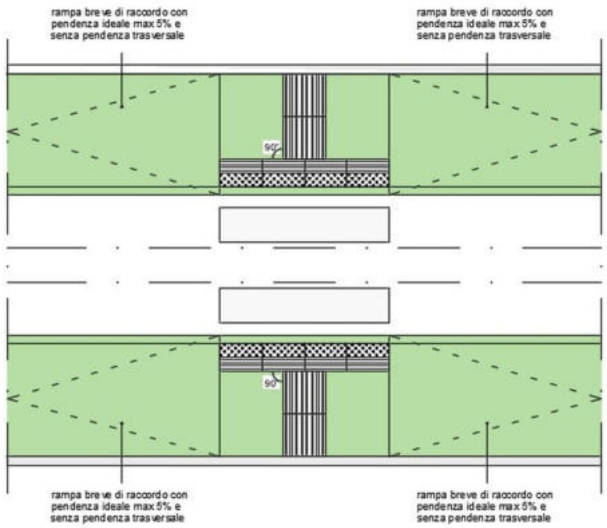

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02998.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03001**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Lunghezza	10	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 970,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02998	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato **8225 €**
E 00FF5-02999	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03000	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03002	LIV. 1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03037	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

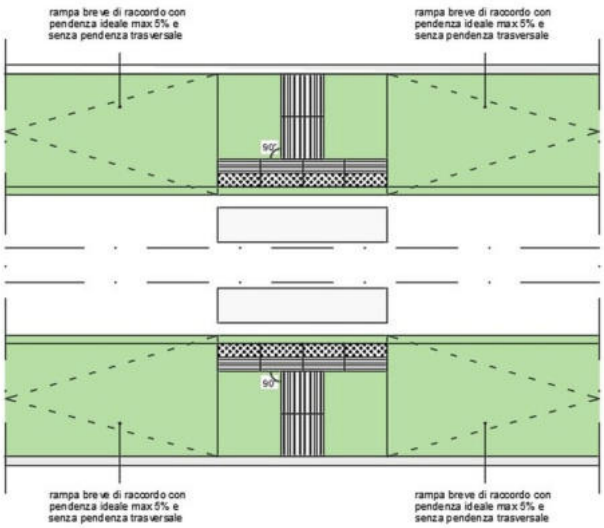

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02998.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03002**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 970,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-02998	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato **8225 €**
E 00FF5-02999	LIV. 1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03000	LIV. 1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03001	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03037	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

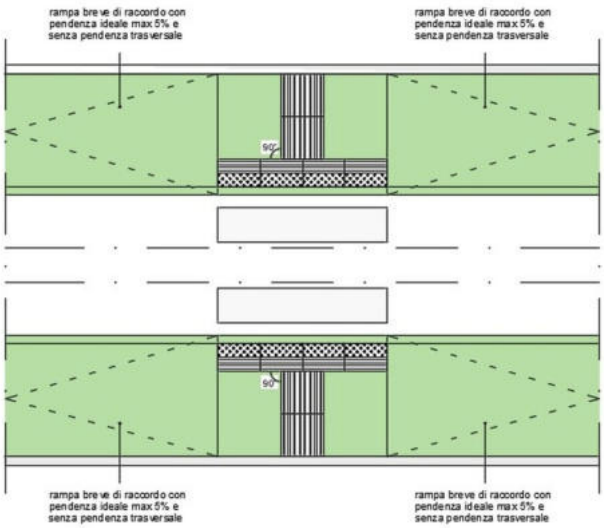

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02998.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 4, Udine	1	E 00FF5-03003

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali nn percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

Eliminazione delle transenne

Eliminazione delle transenne esistente in quanto non svolgono alcuna funzione.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione delle transenne **558 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03004**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

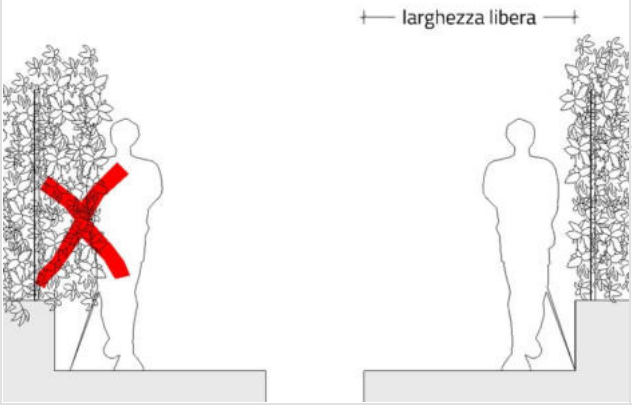

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

53 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03005**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

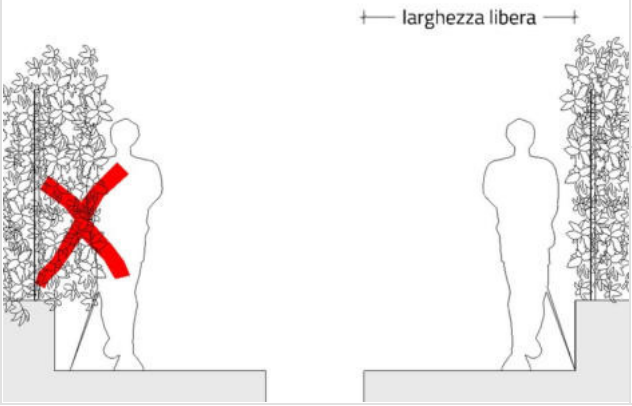

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

66 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03006**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

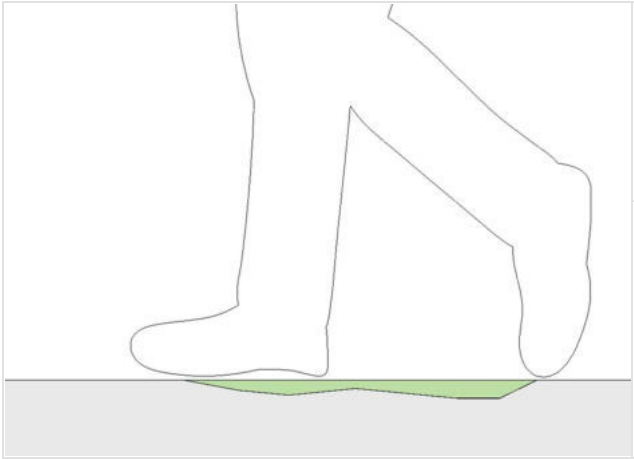

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso

1.427 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03007**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

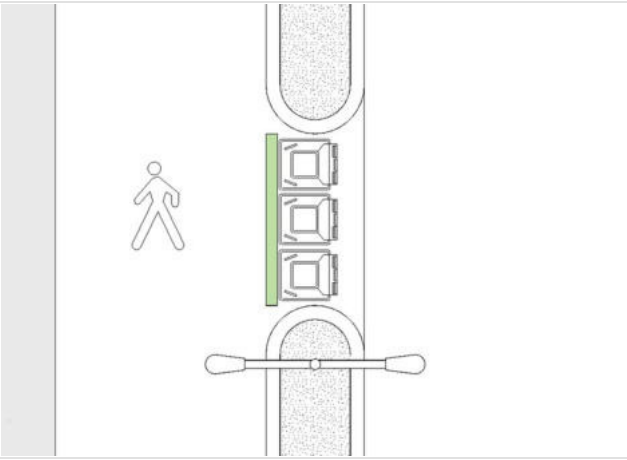

PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03008**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

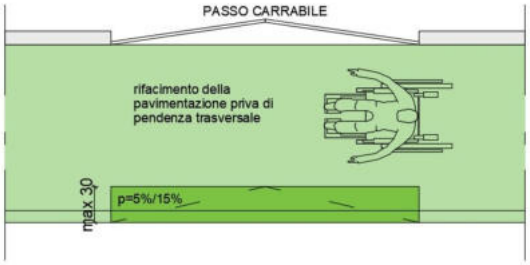

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.451 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pomponio Amalteo 5, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03009

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

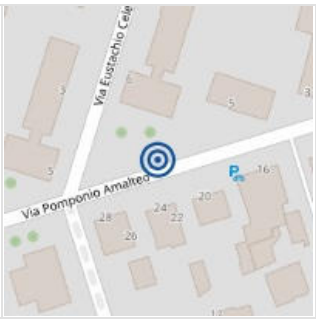

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 33,00 cm	Y 53,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 60 cm. Altezza della cassetta postale di 84 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

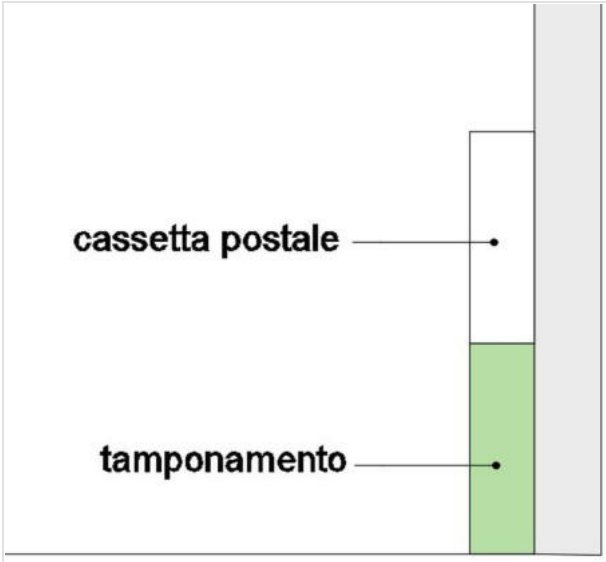

PS1911
Tamponamento fino a terra per delimitazione

Tamponamento dell'area sottostante la cassetta postale per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Tamponamento dello spazio sottostante l'ostacolo sporgente **597 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03010**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2050,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

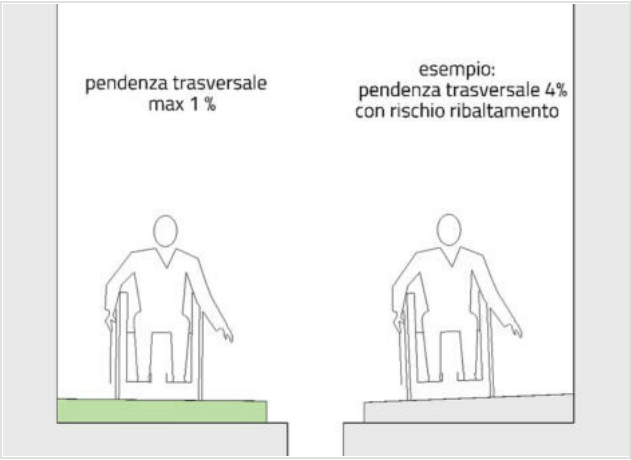

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.326 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03011**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03012	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03013	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

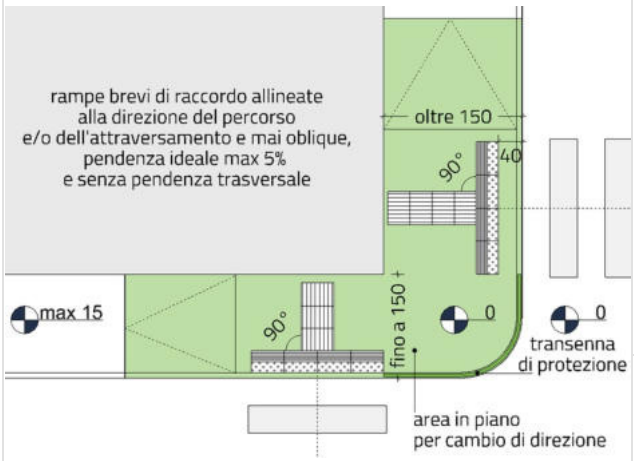

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale all'incrocio con Via Eustachio Celebrino. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03014)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

6.095 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03012**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

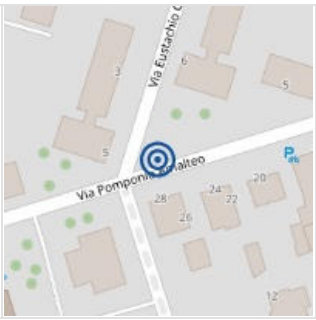

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03011	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato **6095 €**
E 00FF5-03013	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

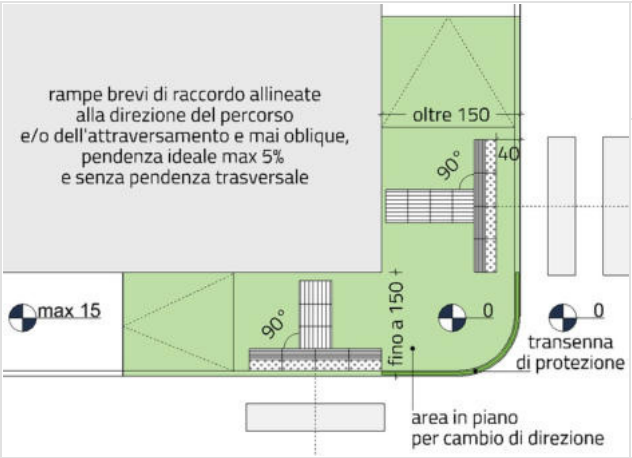

P0872 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03011.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03013**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03011	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato **6095 €**
E 00FF5-03012	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 5, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

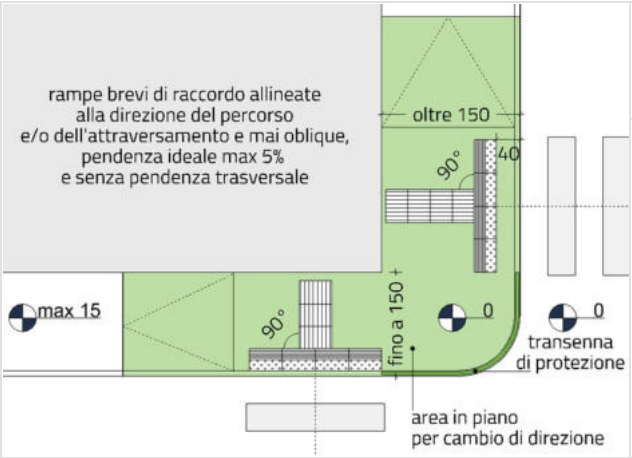

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03011.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03014**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

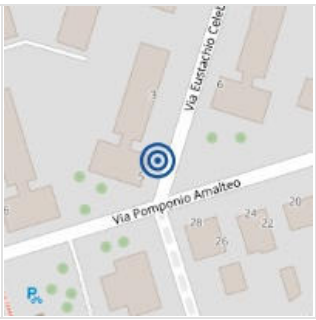

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03013)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.884 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03015**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 5400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

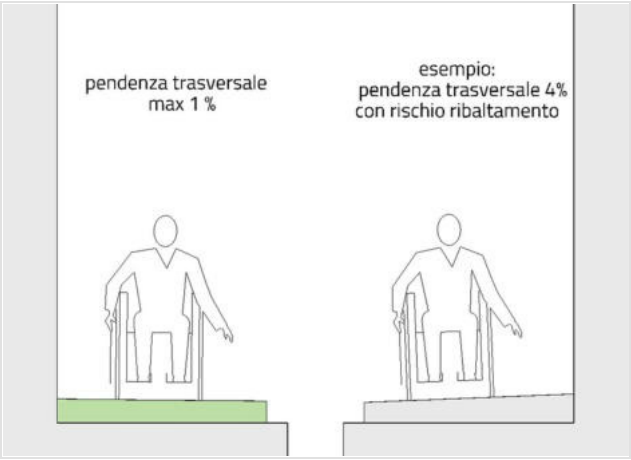

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

11.491 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pomponio Amalteo 28, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03016

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

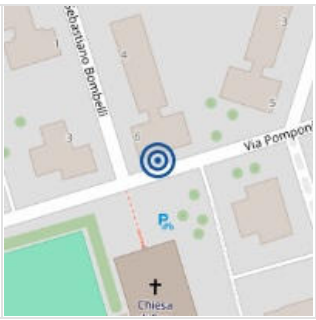

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03017	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

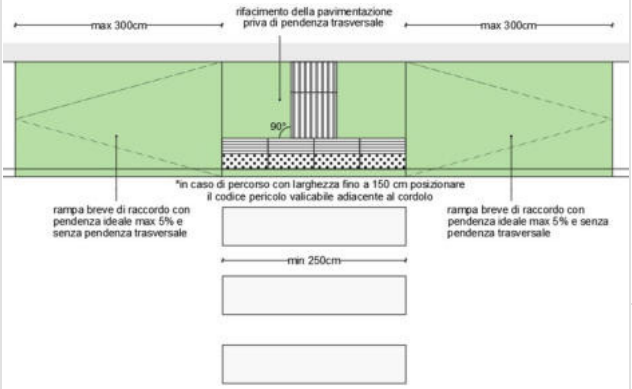

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.884 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03017**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

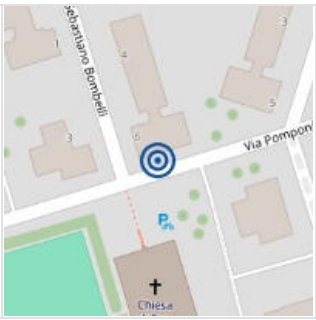

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03016	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	**3884 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

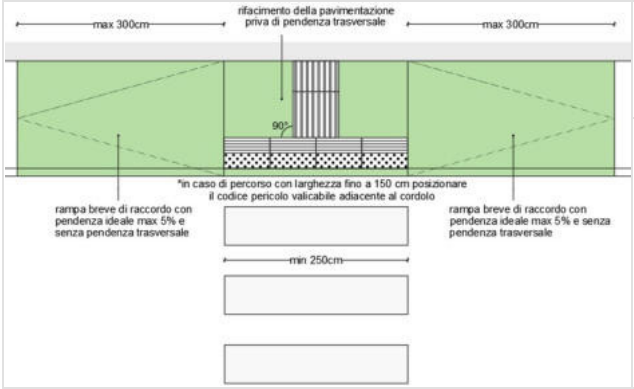

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03016.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03018**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 750,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

80 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03019**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **DISLIVELLO**

Altezza	4	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03020	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03461	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

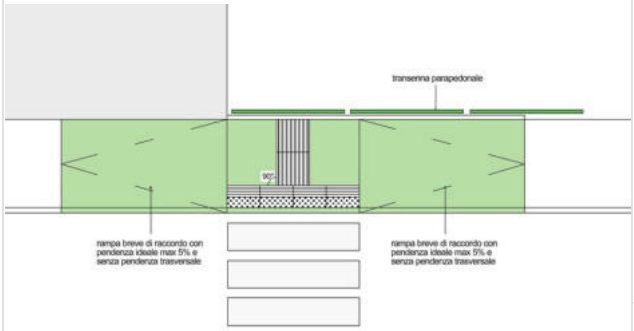

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.Posa di transenne o elementi di arredo urbano per delimitare la proprietà pubblica dalla privata e lasciare un varco non superiore agli 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.471 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03020**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	7	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 600,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03019	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato **4471 €**
E 00FF5-03461	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

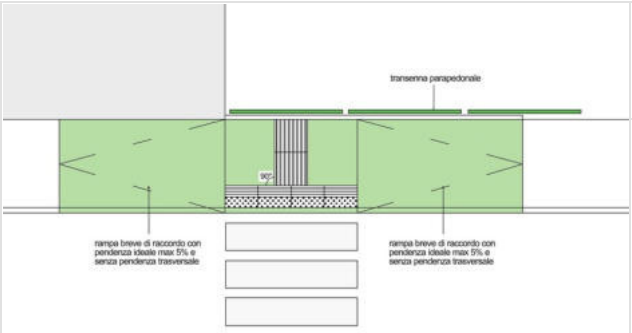

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03019.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03021**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 60,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

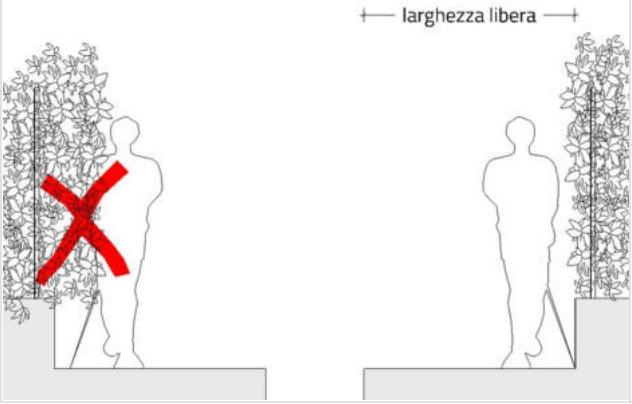

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

49 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 28, Udine	2	E 00FF5-03022

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

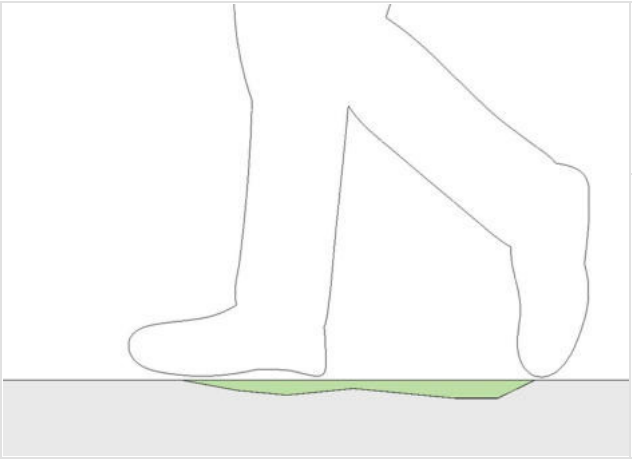

PS1738 (modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento della superficie circostante il chiusino esistente e sua messa in quota per il raccordo a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **230 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03023**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

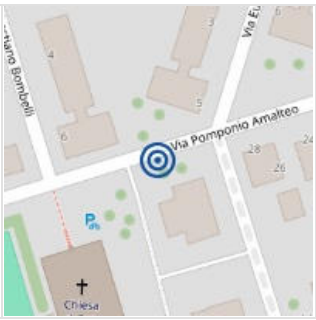

Altezza	2	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

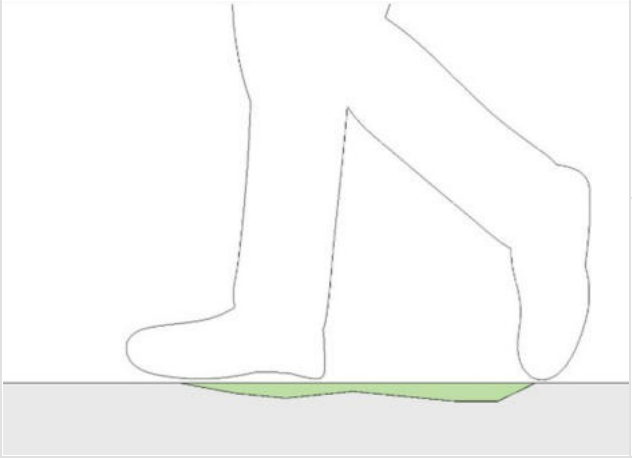

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **317 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03024**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

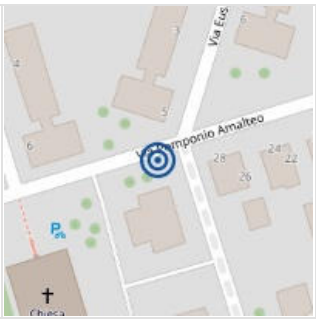

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03025	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato **4017 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03025.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 28, Udine	1	E 00FF5-03025

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 620 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03024	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03026)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **4.017 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 28, Udine	1	E 00FF5-03026

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

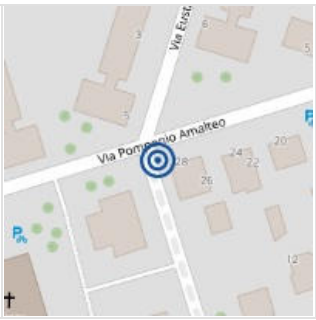

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 800 cm. Larghezza del marciapiede di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03027	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Rifacimento della rampa di raccordo, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03025)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, compresa rampa di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.260 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03027**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

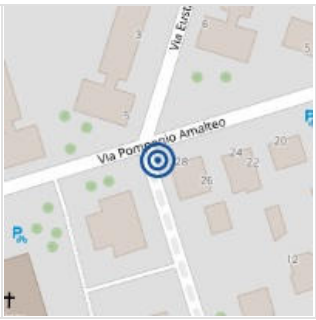

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03026	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	4260 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03026.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03028**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

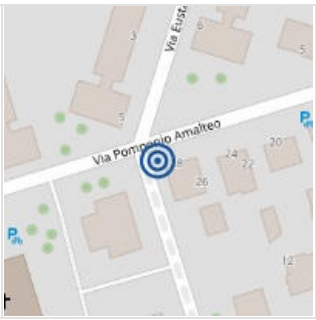

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 200 cm. Larghezza totale del marciapiede di 225 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

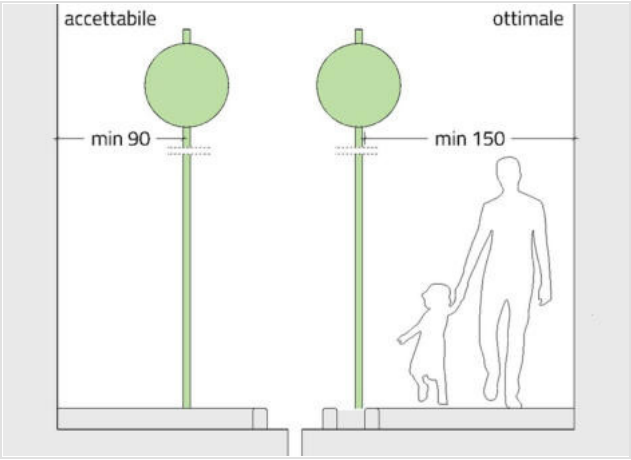

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03029**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

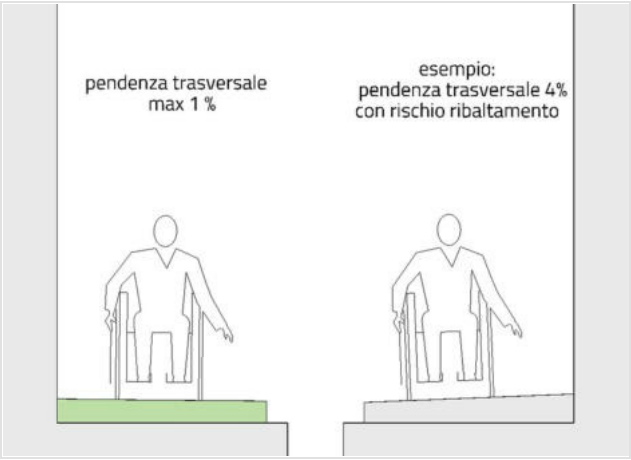

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.405 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03030**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03462	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

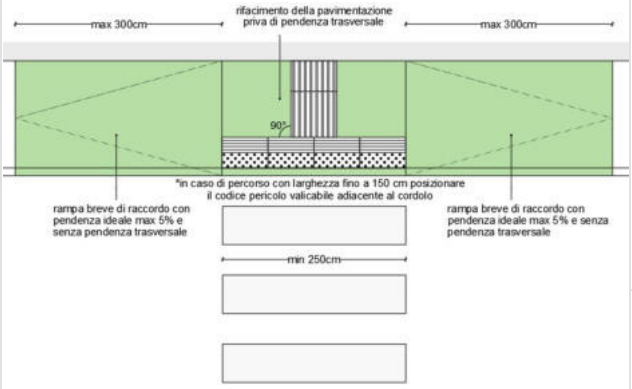

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.967 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 26, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03032**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

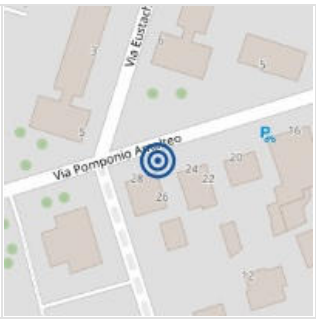

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 70,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

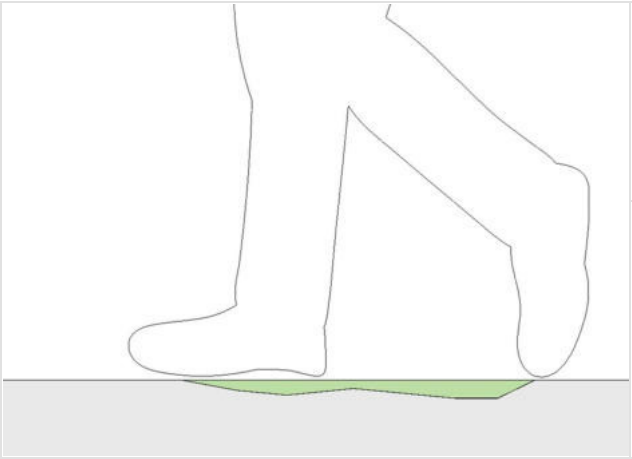

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **230 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03033**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

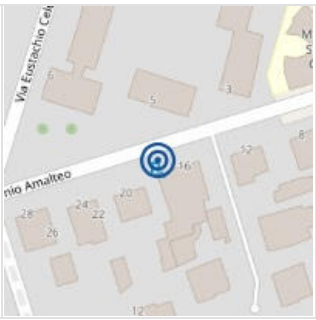

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

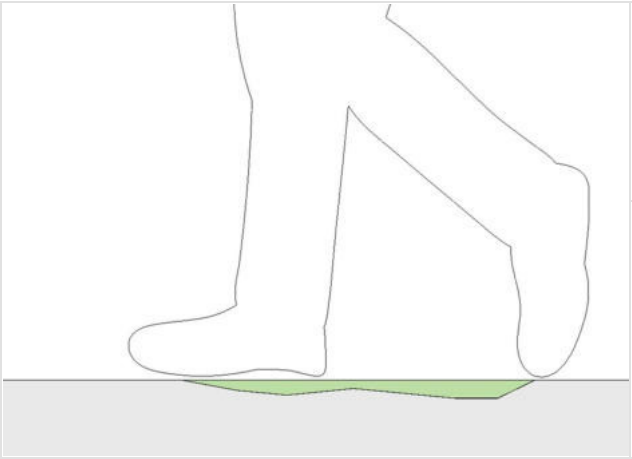

PS1738
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **143 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pomponio Amalteo 16, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03034

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

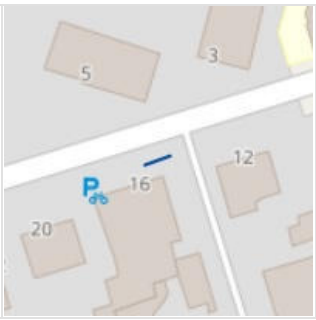

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 400,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate a costituire guida naturale. Non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

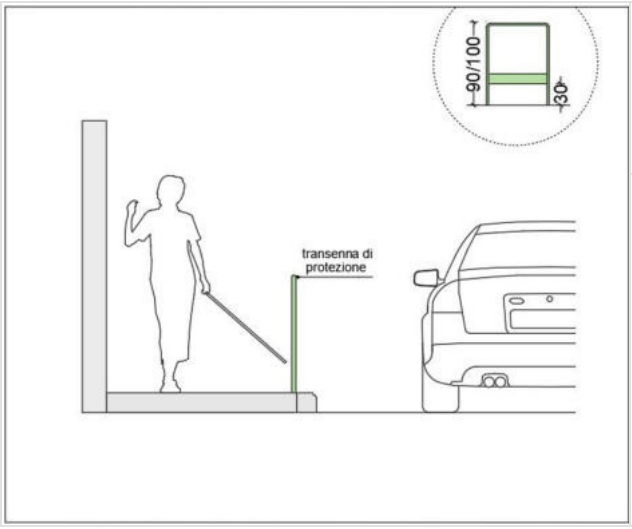

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

1.861 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 16, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03035**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 225,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

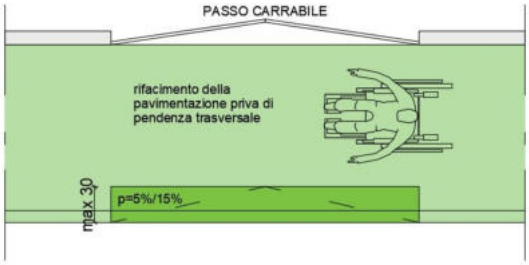

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.991 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03036**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**

Inadeguato	**Si**	
Dimensioni	**X --**	**Y 550,00 cm**
Materiale	**Metallo**	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

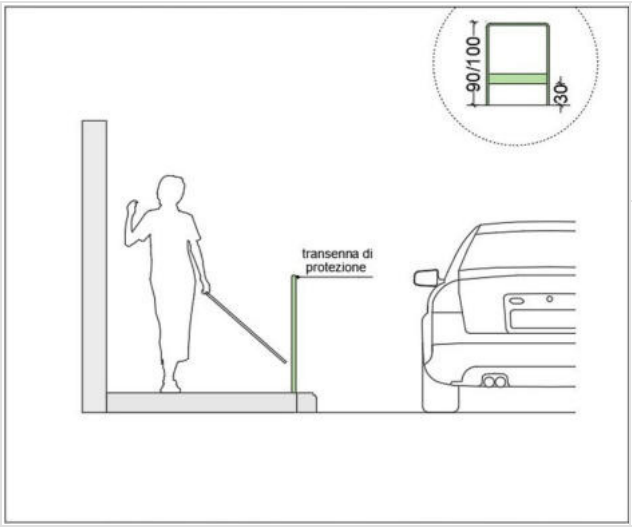

PS1979 (modificato)
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa in funzione del nuovo attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne **2.559 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 4, Udine	1	E 00FF5-03037

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	12	≤ 1%
Dimensioni	X 480,00 cm	Y 290,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-02998	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	8225 €
E 00FF5-02999	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	--
E 00FF5-03000	1	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	--
E 00FF5-03001	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	--
E 00FF5-03002	1	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Pomponio Amalteo 4, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

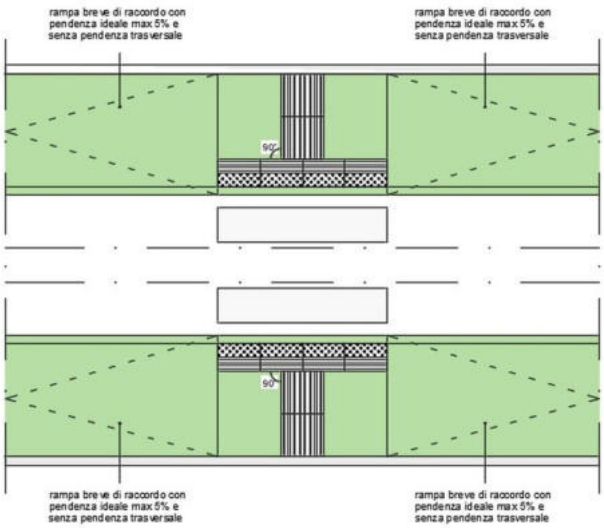

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-02998.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 4, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03038**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 120,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

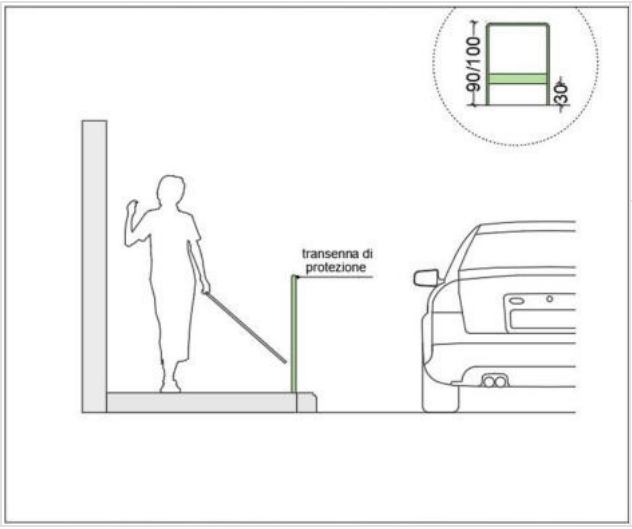

PS1979 (modificato)
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa in funzione del nuovo attraversamento pedonale.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne **558 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Pomponio Amalteo 4, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03039

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 18 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 280 cm. Larghezza totale del marciapiede di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

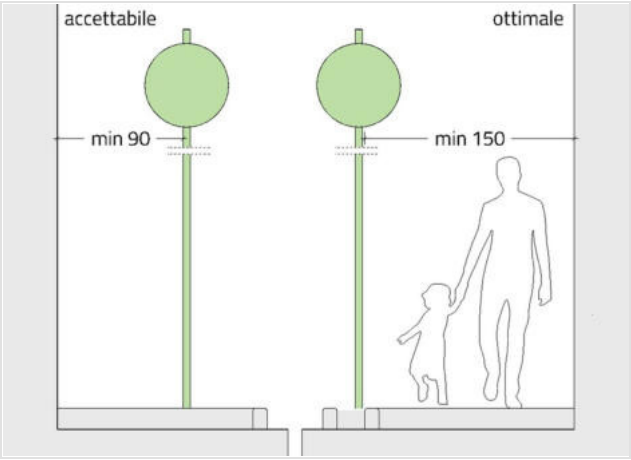

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **02 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Pomponio Amalteo 28, Udine	1	E 00FF5-03461

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 600,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03019	1	**Altezza Dislivello** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	4471 €
E 00FF5-03020	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

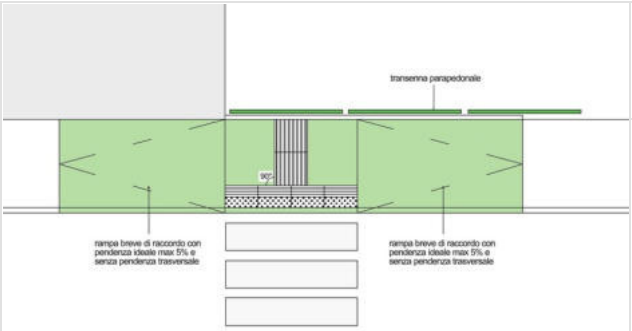

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03019.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Pomponio Amalteo

Rilevatore **0130** Data Rilievo **02 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Pomponio Amalteo 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03462**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 225,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03030	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Pomponio Amalteo 28, Udine	Costo stimato **3967 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

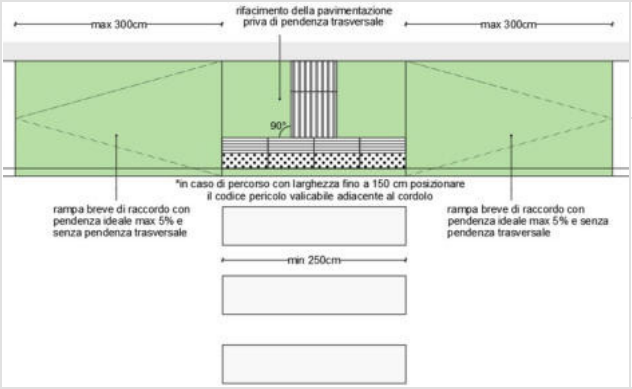

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03030.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 1-5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03040**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 9900,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

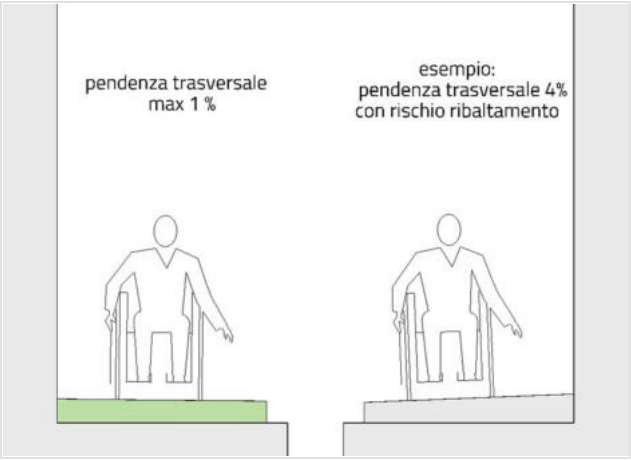

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

30.808 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 3, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03041**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 290 cm. Larghezza totale del marciapiede di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

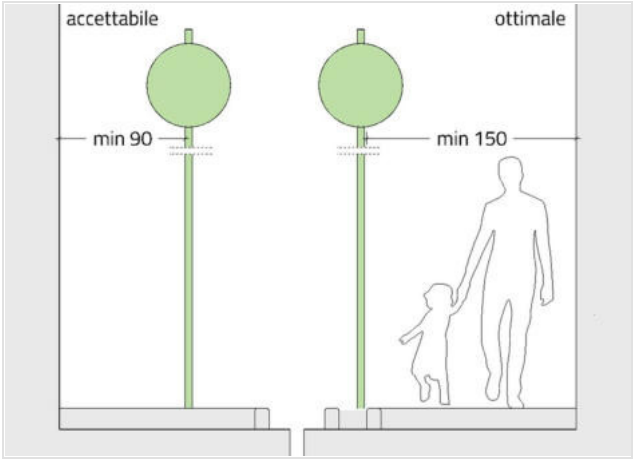

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03042**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 430,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate a costituire guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

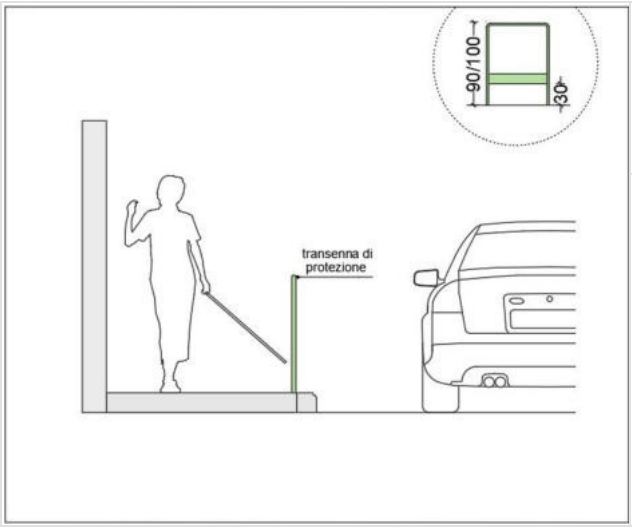

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne — **2.001 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03043**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

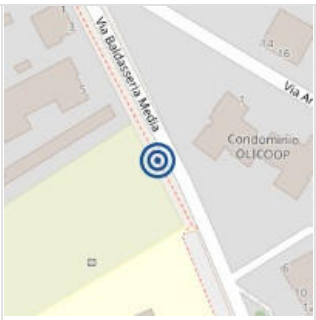

Pendenza longitudinale	10	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

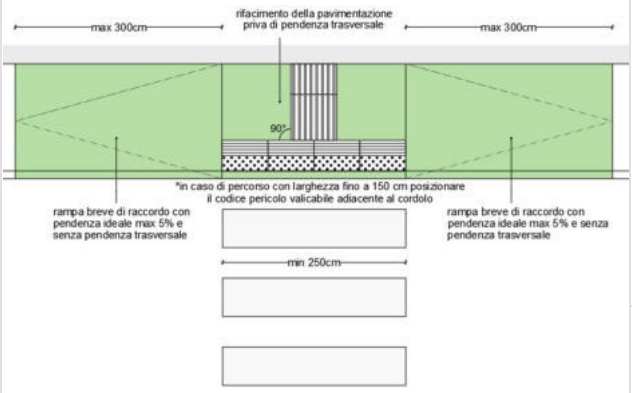

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Riposizionamento di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.113 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03044**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 1000,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate a costituire guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

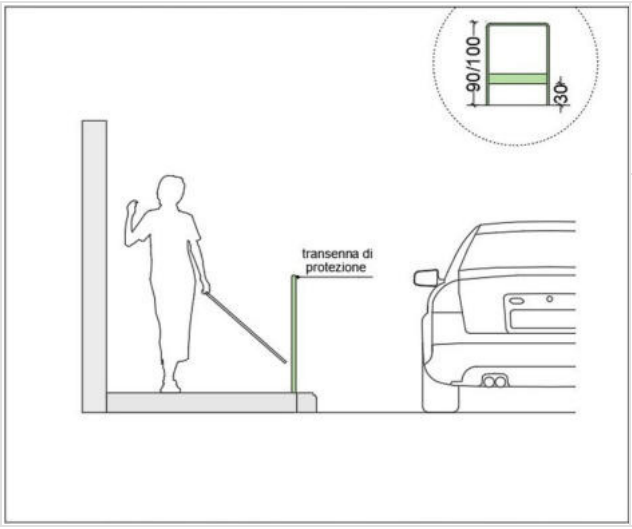

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne — **4.653 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03045**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

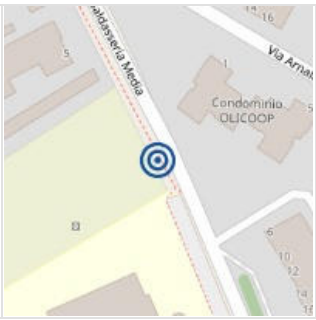

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03046	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 5, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

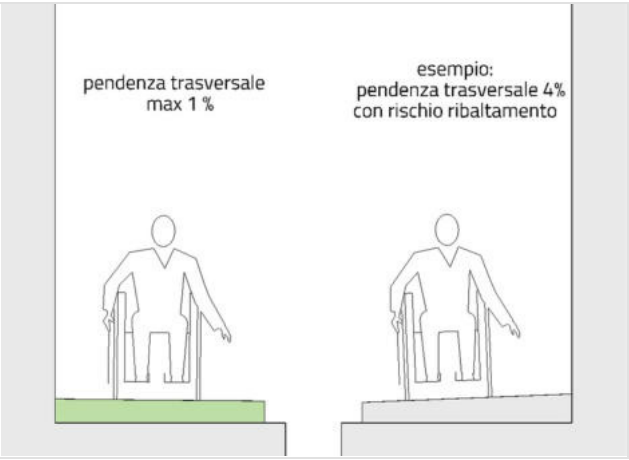

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.162 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 5, Udine	2	E 00FF5-03046

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

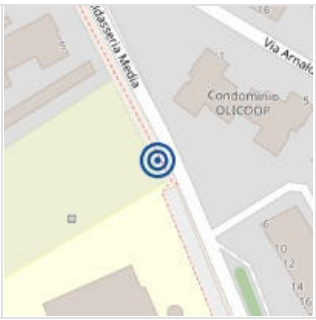

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03045	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 5, Udine	4162 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

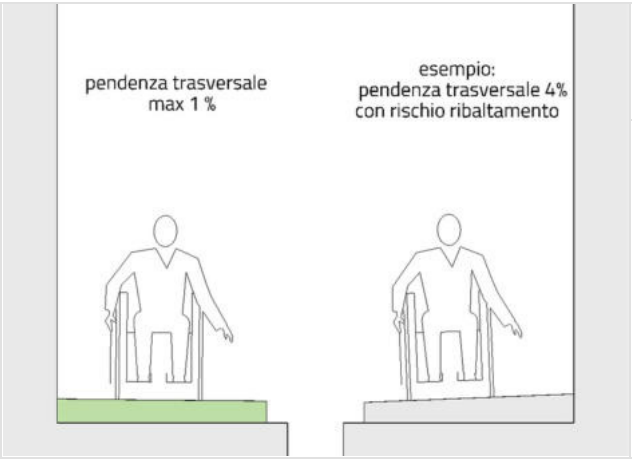

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03045.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03047**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 6200,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

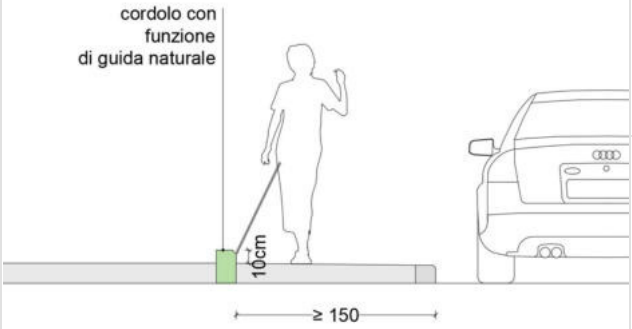

PS1792
Realizzazione di guida naturale (cordolo)

Posa di cordolo in calcestruzzo con funzione di delimitazione fisica e percettiva del margine del percorso, a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, incluse demolizioni e ripristini. Eventuali interruzioni della guida naturale ad esempio per passo carraio devono essere inferiori a 8m. Se superiori a 8 m sostituite con segnaletica tattilo-plantare.
Altezza 10 cm dalla quota della pavimentazione.

STIMA DEL COSTO
Posa di cordolo **2.655 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03048**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03049	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03463	LIV. 2	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

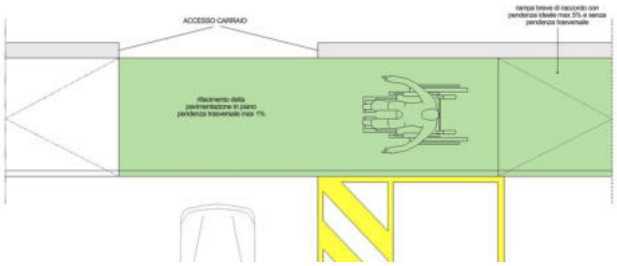

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Spostamento e rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Lo spostamento della rampa permette la risalita dallo stallo riservato degli utenti in carrozzina.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e ricostruzione **2.770 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03049**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

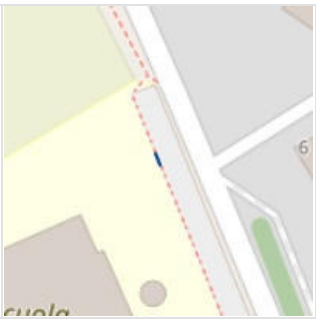

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03048	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato **2770 €**
E 00FF5-03463	LIV. 2	**Assenza di collegamento al percorso pedonale Stallo riservato** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

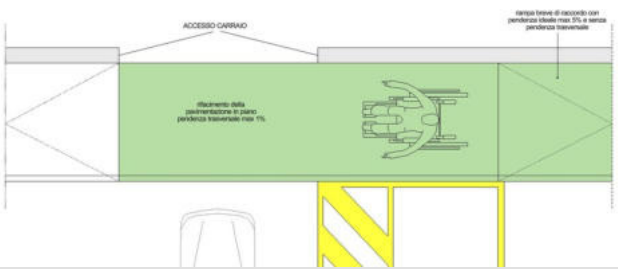

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03048.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 17, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03050

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

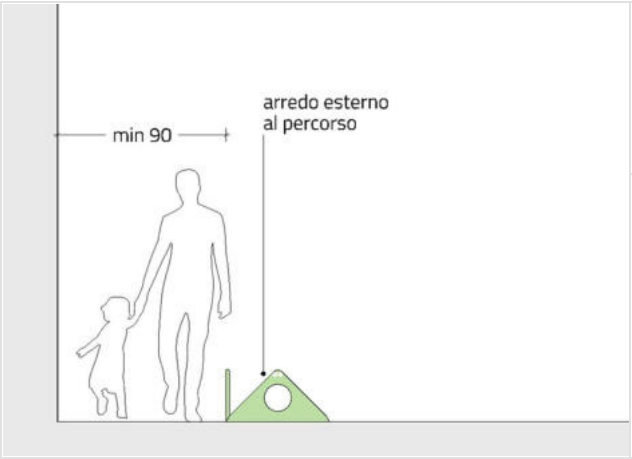

PS1971
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 17, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03051**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Rastrelliera	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

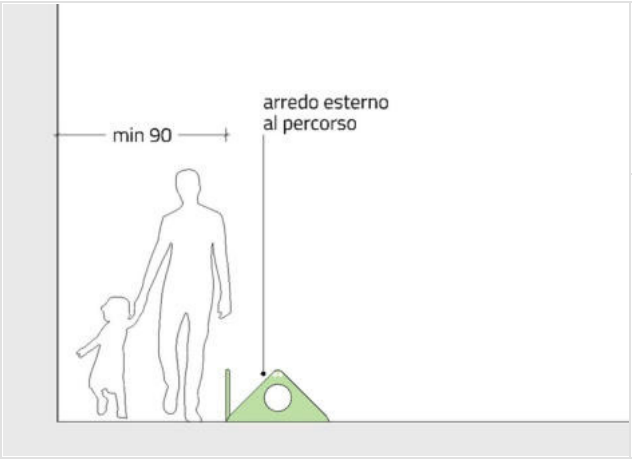

PS1971
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione dell'elemento e suo riposizionamento in area esterna al percorso tale da garantirne l'uso agevole o suo spostamento in posizione tale da non costituire ostacolo lungo la guida naturale per le persone non vedenti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dell'elemento in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03052**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 46 cm. Altezza del cestino di 50 cm. Ingombro totale di 60 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

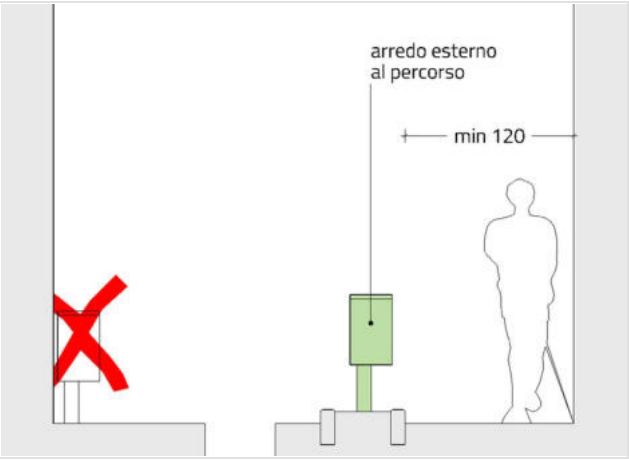

PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in area esterna al percorso pedonale **182 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 17, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03053**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

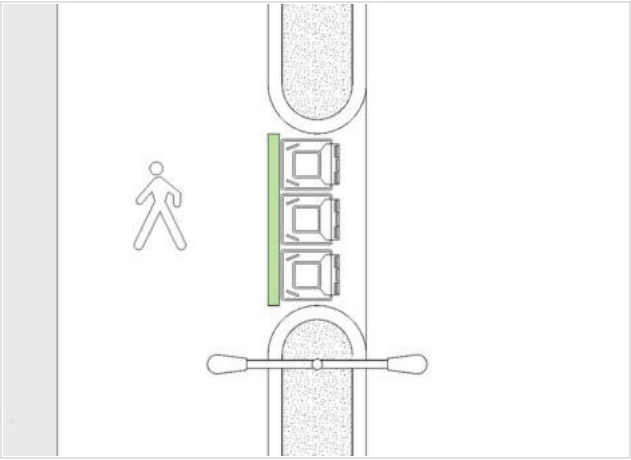

PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cassonetto in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03054**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 9 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03055	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03056	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

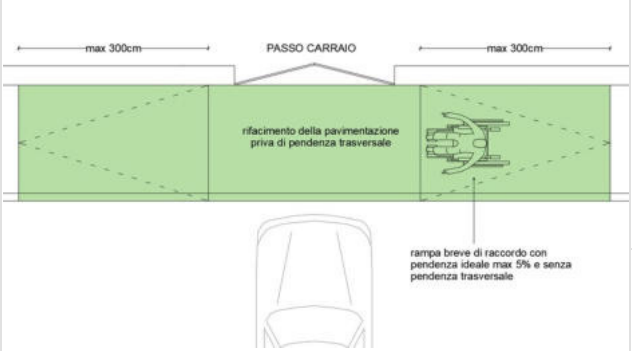

PS1923 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.136 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03055**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03054	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato **3136 €**
E 00FF5-03056	LIV. 2	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

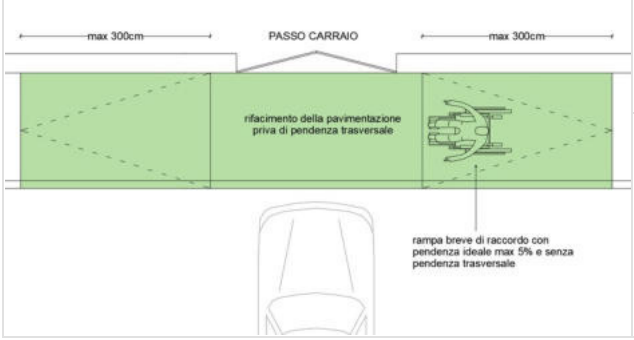

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03054.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03056**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 205,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03054	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato **3136 €**
E 00FF5-03055	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media 23, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

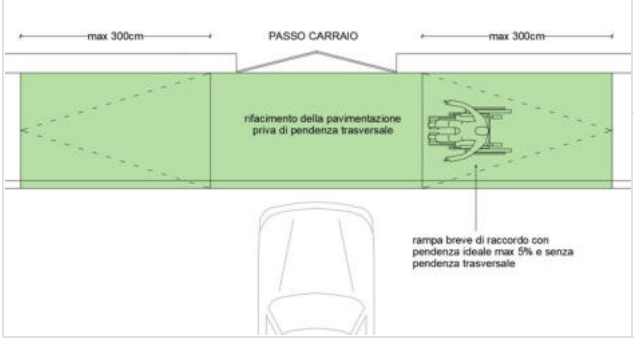

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03054.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03057**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 4450,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

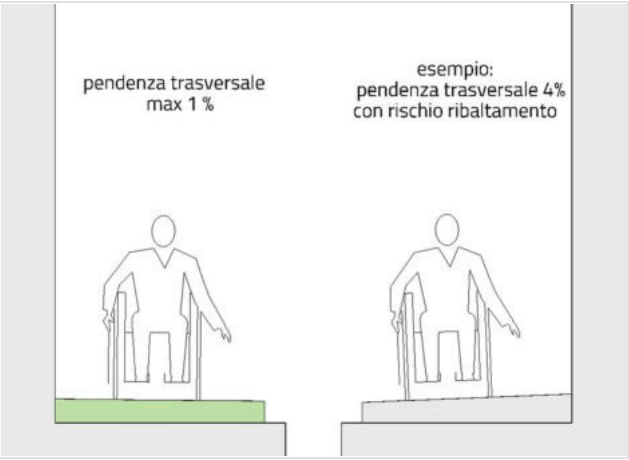

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

8.820 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03058**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PROTEZIONE**

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y 4450,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Transenne parapedonali non adeguate a costituire guida naturale. Non percepibili da persone con disabilità visiva.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

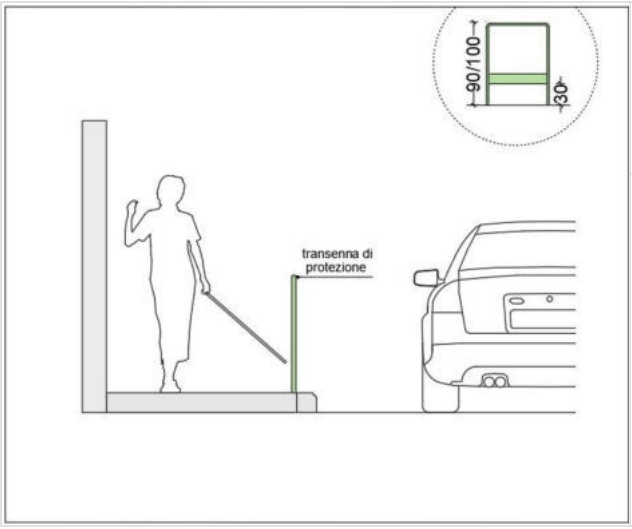

PS1979
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

Rimozione delle transenne esistenti e posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione delle transenne esistenti con nuove transenne

20.707 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 23, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03059**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 11,00 cm	Y 4450,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Ringhiera edificio scolastico con altezza libera da terra di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità tramite un possibile tamponamento della parte libera da terra sotto le inferriate, per creare guida naturale per le persone con disabilità visiva. In alternativa, sostituzione dei parapetti con altri non sporgenti.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione dei parapetti con altri non sporgenti **31.060 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03060**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 30,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 46 cm. Altezza del cestino di 50 cm. Ingombro totale di 40 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

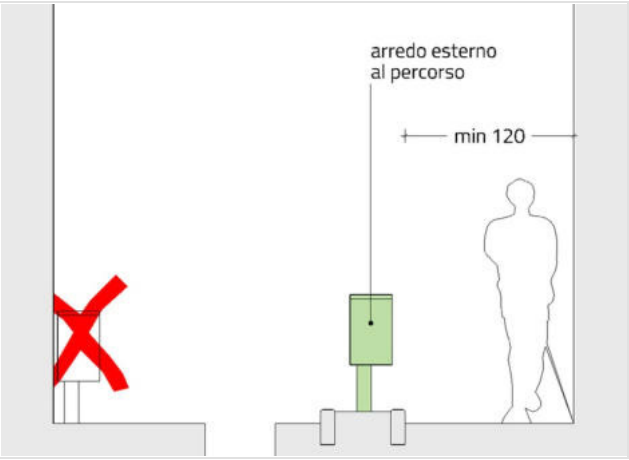

PS1808
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Spostamento del cestino in area esterna ai percorsi pedonali, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.
Larghezza libera di passaggio ottimale 120 cm. Accettabile 90 cm in caso di impossibilità.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del cestino in posizione esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03061**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 640,00 cm	Y 540,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03062	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Baldasseria Media 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

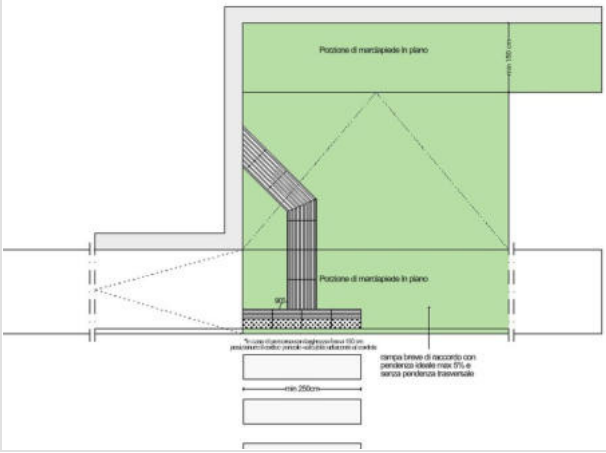

(modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una fascia di marciapiede con una pendenza trasversale costante max 1% per almeno 150 cm in modo da garantire la rotazione della carrozzina per identificare la pendenza presente non più come trasversale, ma come longitudinale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e ricostruzione e posa di segnaletica tattilo-plantare

8.737 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03062**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 400,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03061	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 28, Udine	8737 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

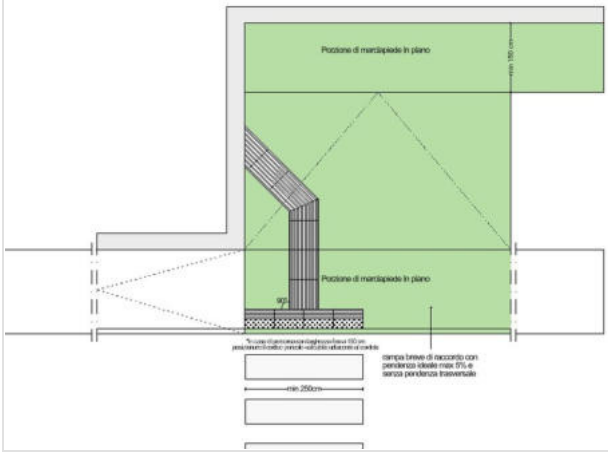

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03061.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03063**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

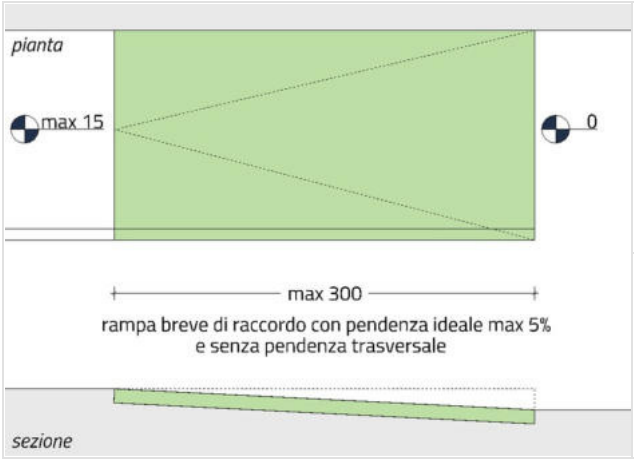

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.433 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03064**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4560,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03065	3	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

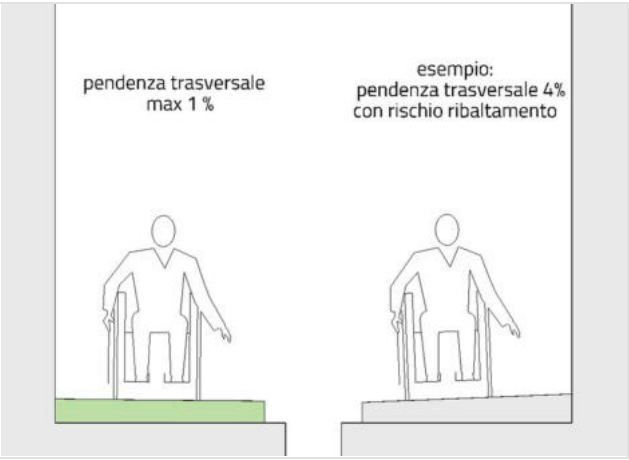

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

14.131 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03065**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4560,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03064	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 28, Udine	**14131 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

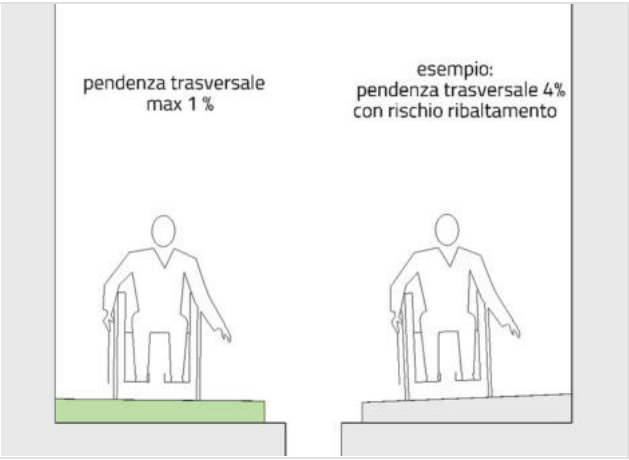

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03064.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03066**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03068	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Baldasseria Media 57, Udine	Costo stimato **55800 €**
E 00FF5-03067	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 28-57, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03068.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 28-57, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03067**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 14600,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03068	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Baldasseria Media 57, Udine	Costo stimato **55800 €**
E 00FF5-03066	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 28, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03068.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 57, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03068**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede (attualmente assente) di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03066	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 28, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03067	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 28-57, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03069)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

55.800 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 57, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03069**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 700 cm. Larghezza del marciapiede di 190 cm. Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03068)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.537 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 54, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03070

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e vegetazione. Larghezza minima di passaggio di 170 cm. Larghezza totale del marciapiede di 195 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

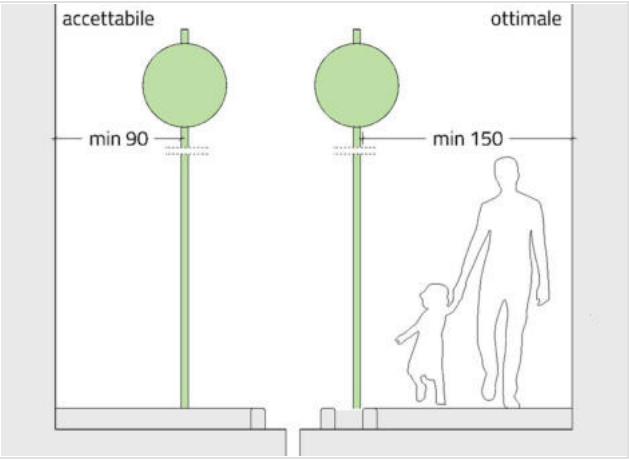

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 54, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03071

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3050,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

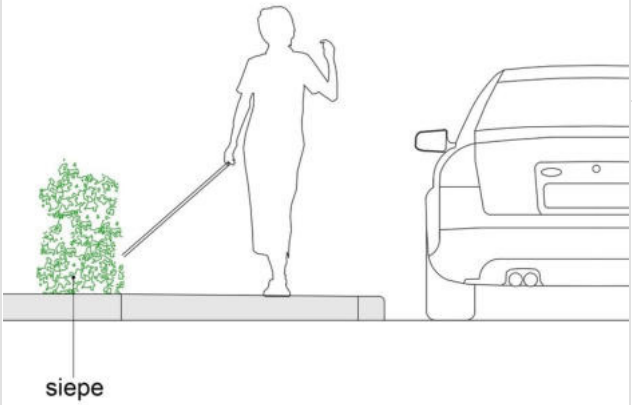

PS1969 (modificato)
Piantumazione di siepe per costituire guida naturale

Piantumazione di siepe per la delimitazione e protezione del percorso pedonale e costituzione di guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

3.467 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 54, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03072

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 50 cm tra tirante e vegetazione. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2009 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con l'ente terzo la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione e spostamento del cavo **136 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 54, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03073**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

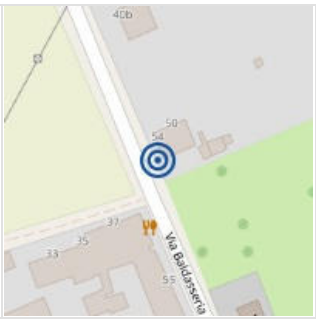

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 35 cm tra tirante e vegetazione. Larghezza minima di passaggio di 165 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

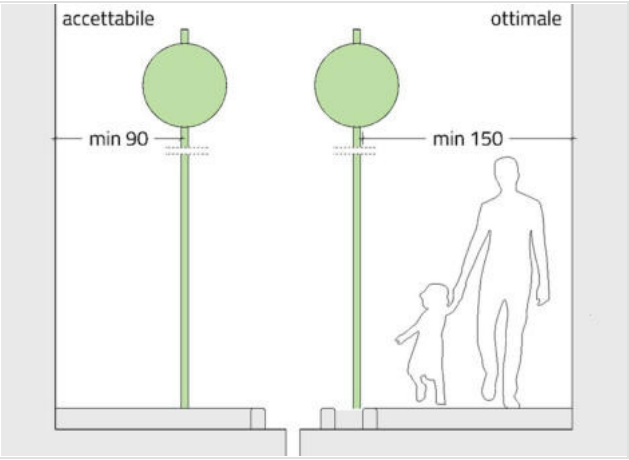

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 38, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03075**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

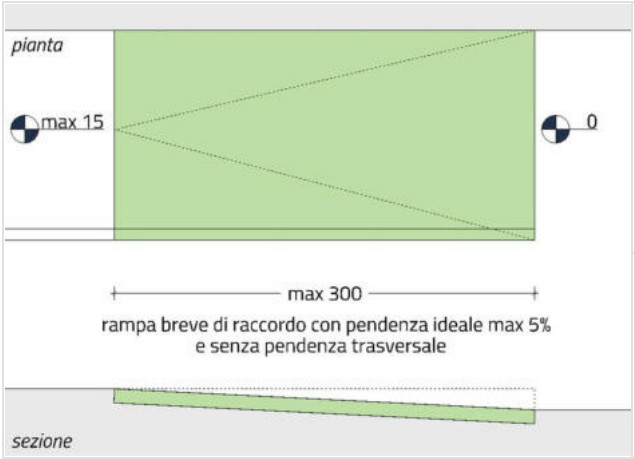

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.302 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 38, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03076**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

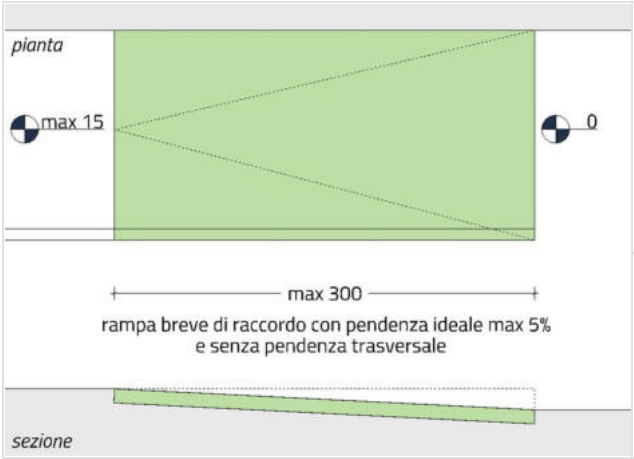

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.433 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 36-34, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03077

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 196,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

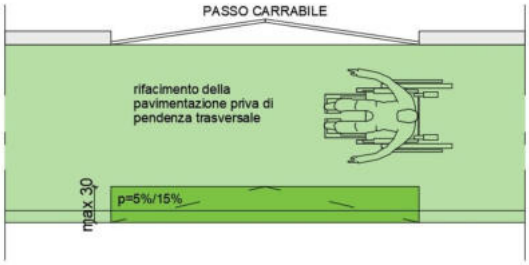

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

11.292 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 32, Udine	1	E 00FF5-03078

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare in posizione incoerente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03079	1	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 32, Udine	1578 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

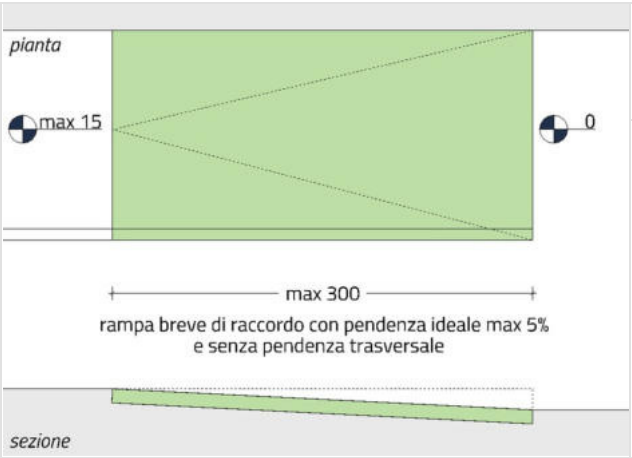

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03079.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03079**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	7	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03078	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Baldasseria Media 32, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

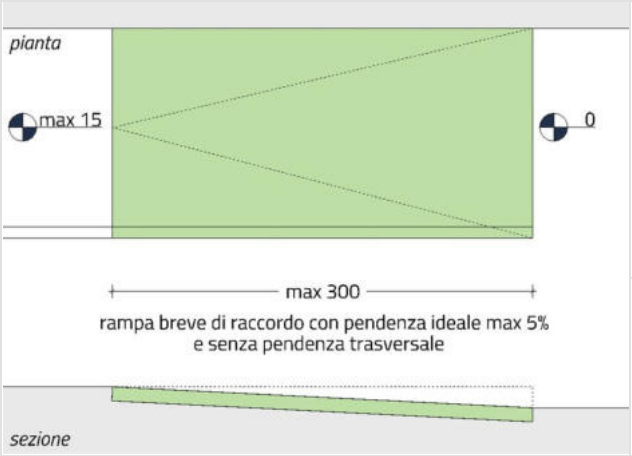

PS1931 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, eliminazione segnaletica tattilo-plantare

Eliminazione della segnaletica tattilo-plantare e rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva, sua ricostruzione ed eliminazione della segnaletica tattilo-plantare

1.578 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 32, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03080**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di pavimentazione

Eliminazione del ghiaino sciolto nel tratto di percorso pubblico per permettere la fruizione di una carrozzina lungo il percorso, e rifacimento della pavimentazione in materiale analogo al contesto (asfalto) o al marciapiede (porfido a cubetti).

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di pavimentazione **1.856 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 30, Udine	1	E 00FF5-03081

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 160,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03082	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Baldasseria Media 30, Udine	1572 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

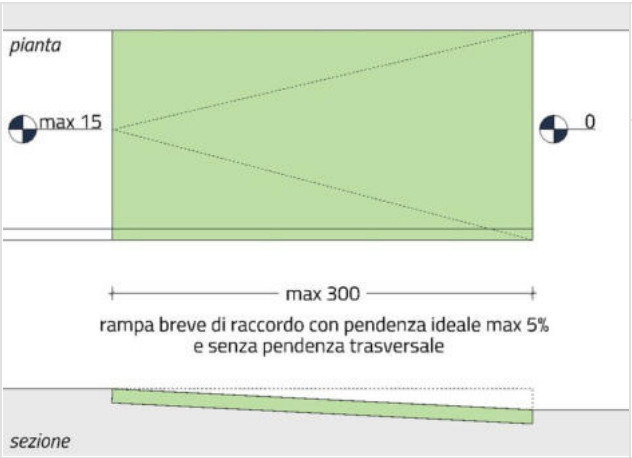

PS1931 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03082.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 30, Udine	1	E 00FF5-03082

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare in posizione incoerente.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03081	1	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 30, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

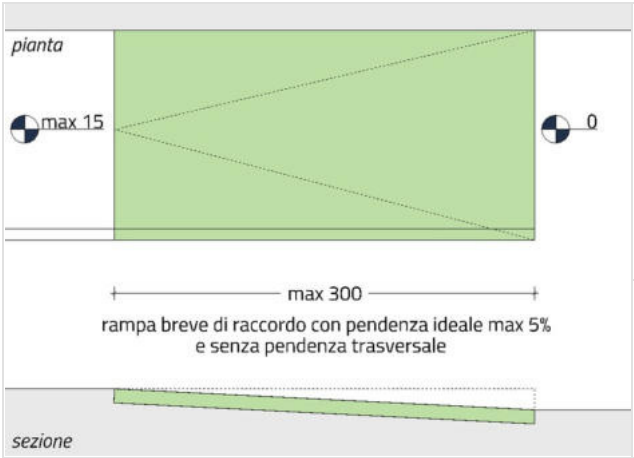

(modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione, eliminazione segnaletica tattilo-plantare

Eliminazione della segnaletica tattilo-plantare e rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata, sua ricostruzione ed eliminazione segnaletica tattilo-plantare

1.572 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 30, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03083**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03086	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media 30, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

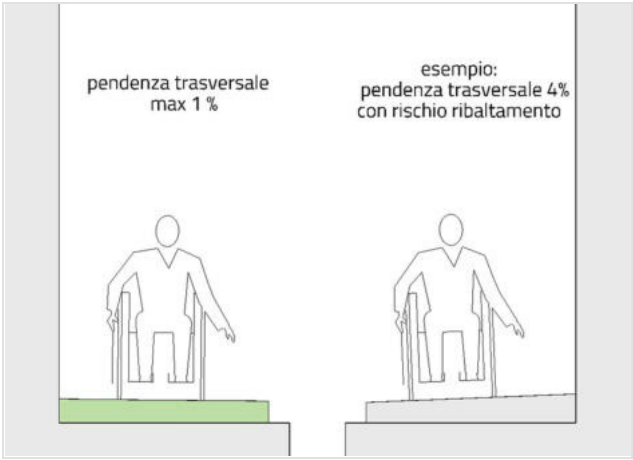

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

6.719 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 28, Udine	1	E 00FF5-03084

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 430,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03085	1	**Non coerente o interrotta Segnaletica tattilo plantare** Via Baldasseria Media 28, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

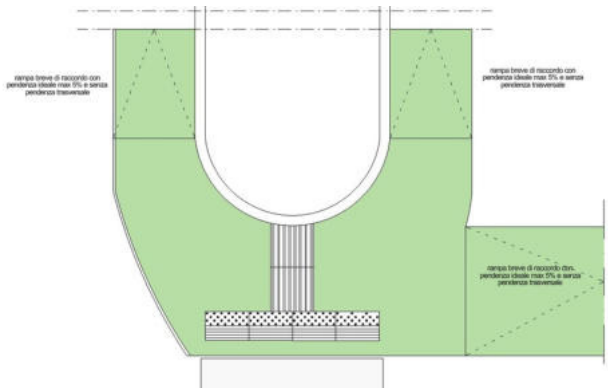

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, realizzazione di rampe longitudinali e posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede a livello stradale e in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, realizzazione di rampe longitudinali e posa di segnaletica tattilo-plantare

6.592 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 28, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03085

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Non coerente o interrotta	Si	
Dimensioni	X --	Y 170,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Segnaletica tattilo plantare interrotta. Porzione mancante per giunger a guida natural di 170 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03084	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 28, Udine	Costo stimato **6592 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

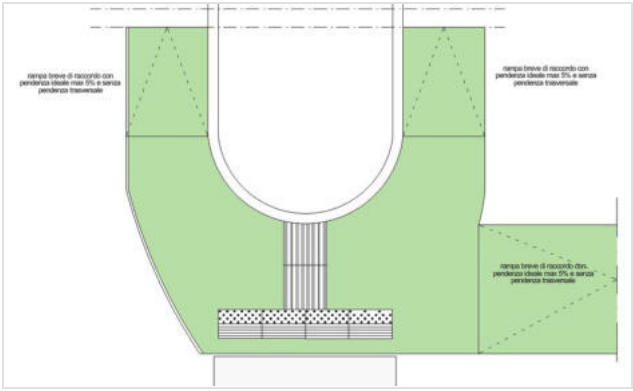

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03084.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 30, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03086**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 2250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03083	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 30, Udine	Costo stimato **6719 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

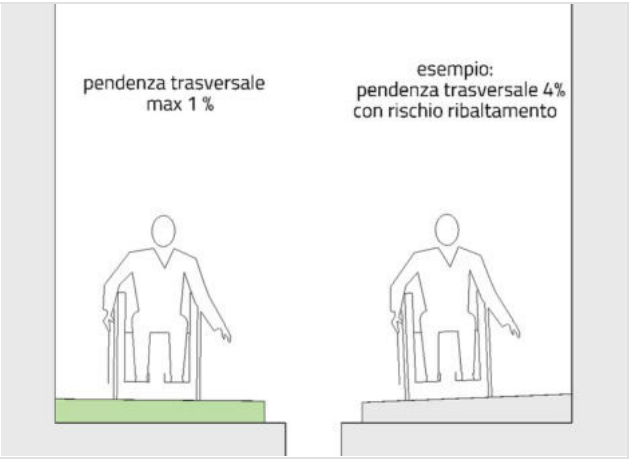

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03083.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 26-6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03087**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 10200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03088	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 26-6, Udine	Costo stimato **30461 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

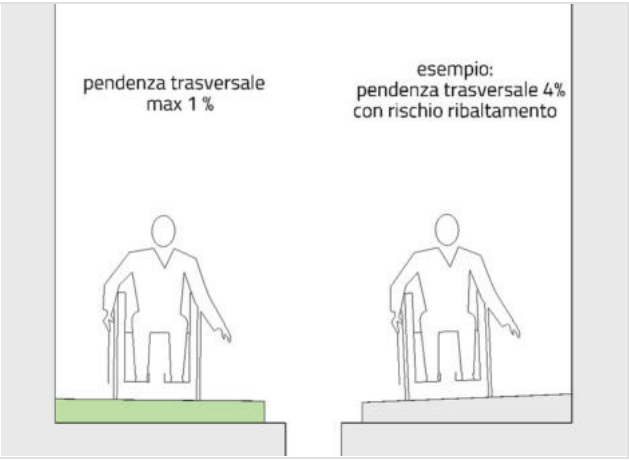

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03088.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo Via Baldasseria Media 26-6, Udine	LIV. di priorità 2	ID Scheda E 00FF5-03088

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 10200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03087	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media 26-6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

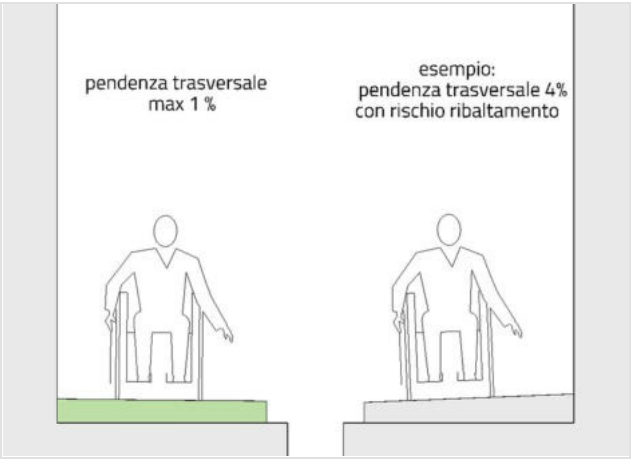

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

30.461 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 28, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03089

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 23 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 175 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

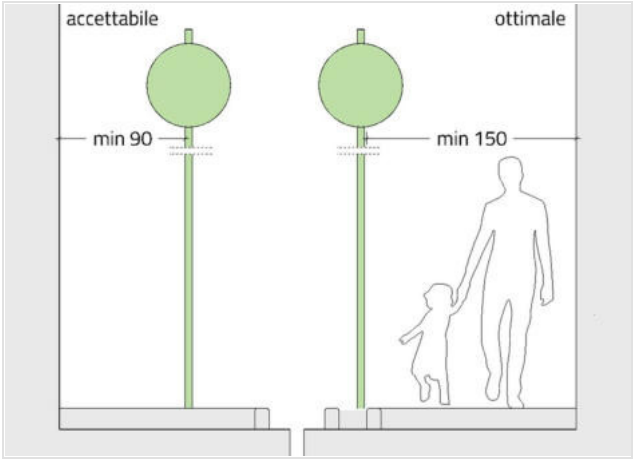

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 16, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03090**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 220,00 cm	Y 620,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Dislivello di 17 cm. Larghezza del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

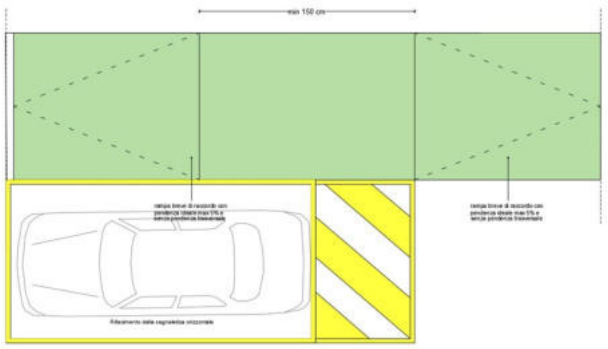

P1446
Demolizione di parte del percorso pedonale antistante allo stallo riservato e ricostruzione in quota con l'area dello stallo e di parte del marciapiede per realizzare brevi rampe di raccordo

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Porzione in piano in prossimità della zebratura laterale dello stallo riservato.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento dello stallo riservato compresa realizzazione di percorso in sicurezza

3.541 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 10, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03091**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	12	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 200,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

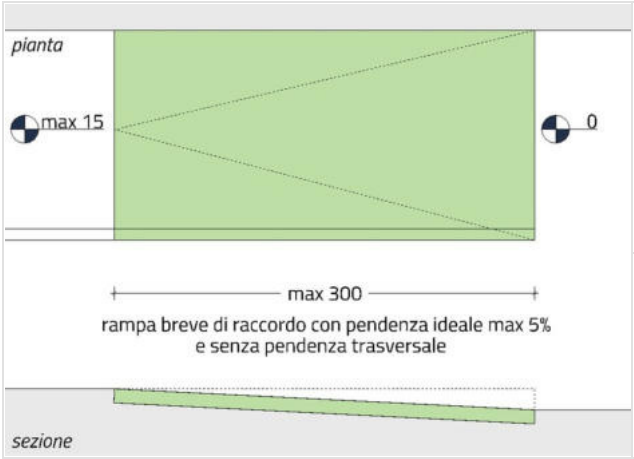

PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.572 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 6, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03092**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	8	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 205,00 cm	Y --
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03093	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 6, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

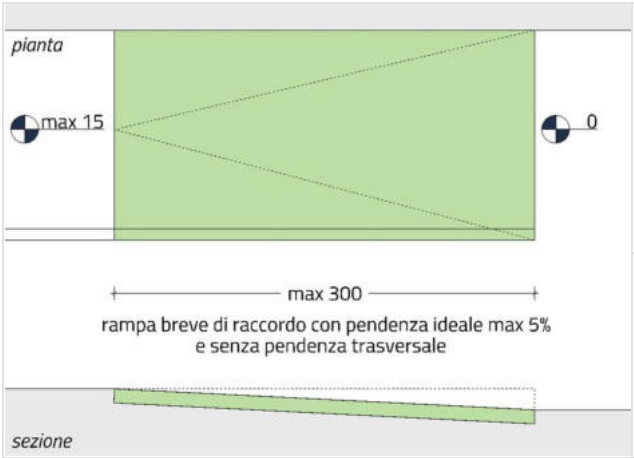

PS1931
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.704 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 6, Udine	1	E 00FF5-03093

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	17	≤ 15%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03092	1	**Altezza Dislivello** Via Baldasseria Media 6, Udine	1704 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

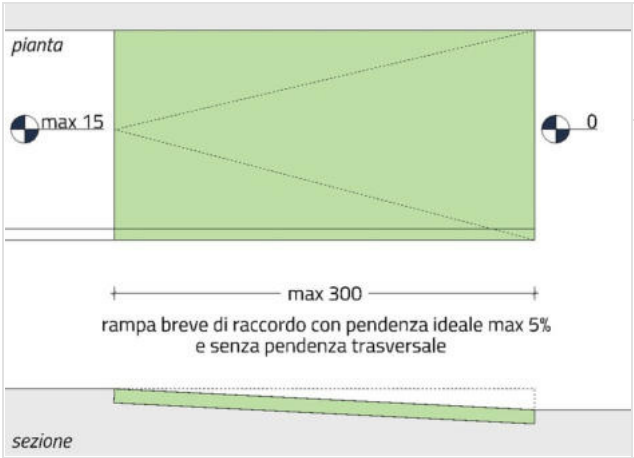

PS1735 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03092.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 6, Udine	2	E 00FF5-03094

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 4400,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

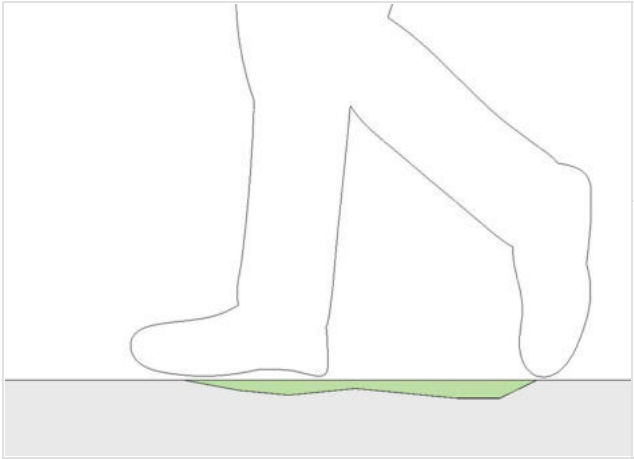

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **15.242 €**

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Baldasseria Media 5, Udine	2	E 00FF5-03095

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

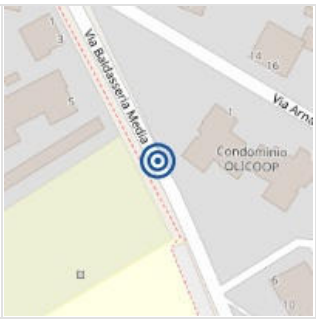

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

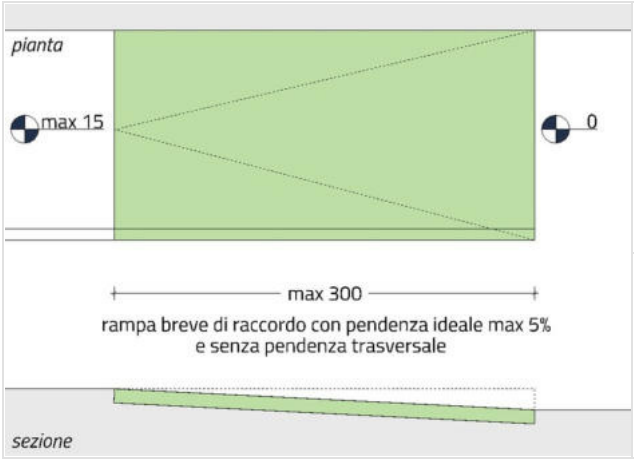

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.302 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Baldasseria Media 5, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03096

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

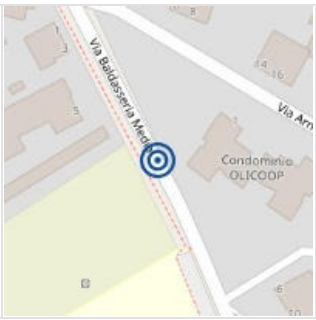

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 15 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

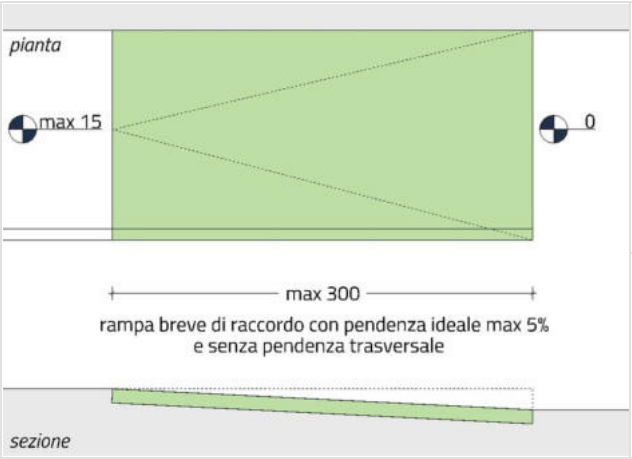

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

1.433 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03097**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 4130,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il tratto di percorso presenta dei tratti di restringimento e sconnessioni della pavimentazione che non permettono l'accessibilità.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

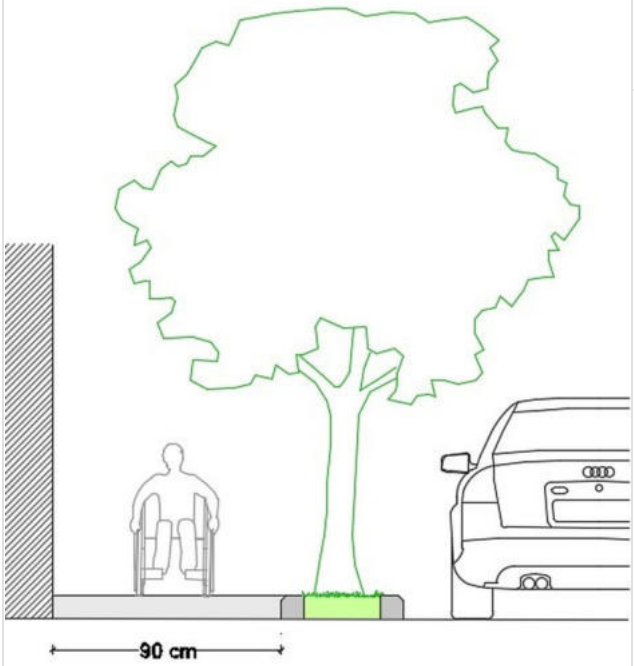

PS2006
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso per permettere un passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

13.584 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 5, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03098**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	6	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	
Note relative al rilievo --		

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **via Baldasseria Media, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03099**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Distanza di 36 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 160 cm. Larghezza totale del marciapiede di 200 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

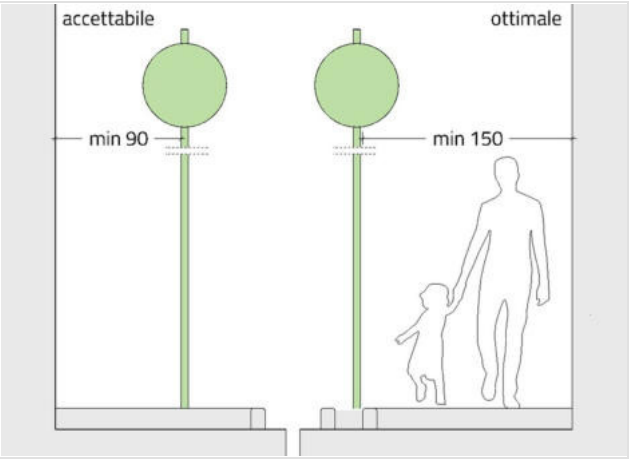

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03111**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03112	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Baldasseria Media, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

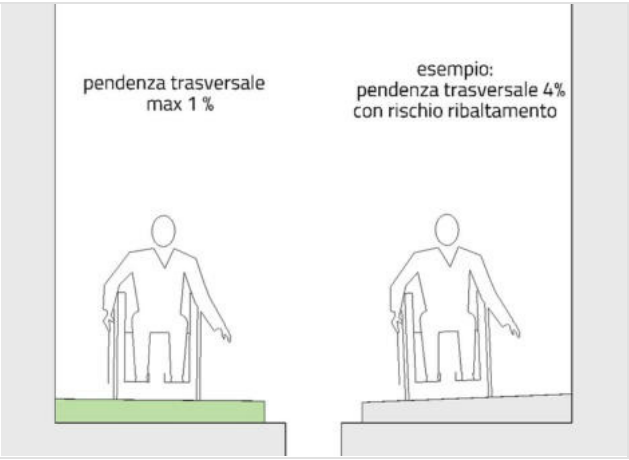

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

12.543 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03112**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 4200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03111	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media, Udine	**12543 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

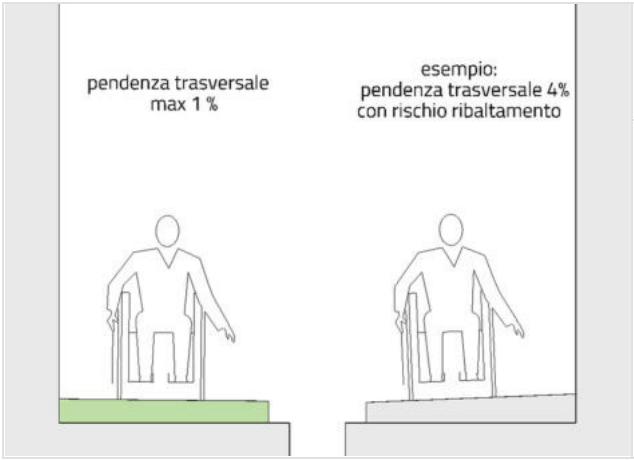

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03111.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03113**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Arredo attività commerciale	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0639 (modificato)
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Rimozione dell'arredo che costituisce elemento di ostacolo alla percezione della guida naturale. In alternativa, realizzazione di protezione del percorso e formazione di linea guida tramite l'utilizzo di fioriere o arredo urbano, garantendo una larghezza libera di passaggio min 120 cm ed una lunghezza del percorso privo di guida naturale di massimo 8 m.

STIMA DEL COSTO
Rimozione dell'arredo o realizzazione di protezione del percorso

182 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Baldasseria Media

Rilevatore **0130** Data Rilievo **02 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Baldasseria Media 10, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03463**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **STALLO RISERVATO**

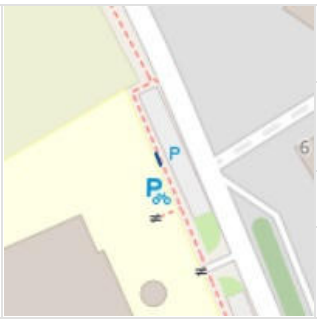

Assenza di collegamento al percorso pedonale	Si	
Dimensioni	X 500,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza del marciapiede di 180 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03048	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato **2770 €**
E 00FF5-03049	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Baldasseria Media 10, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

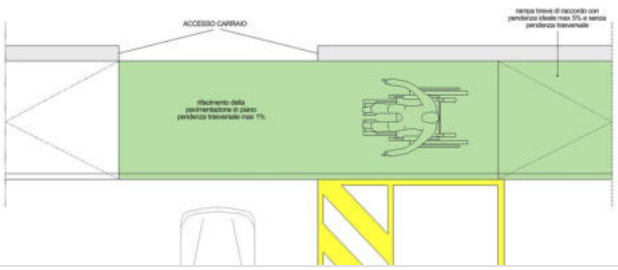

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03048.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Arnaldo Piutti, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03101

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

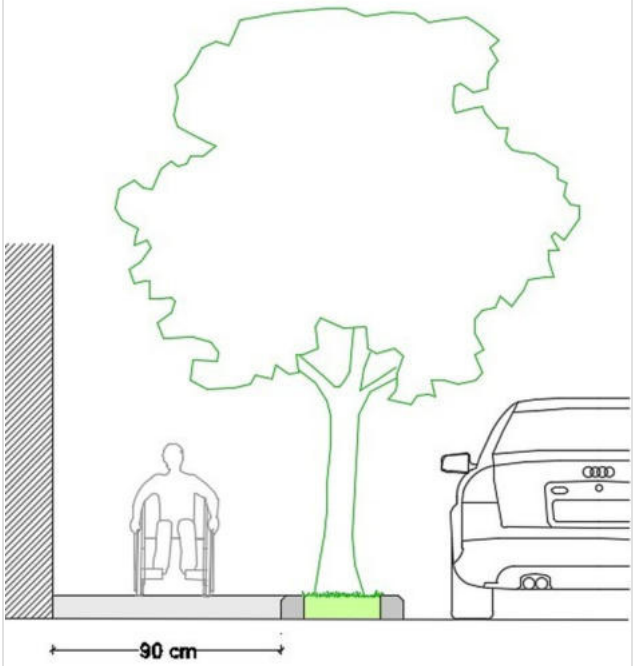

PS2006
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso per permettere un passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

1.717 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03102**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	8	≤ 15%
Dimensioni	X 200,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

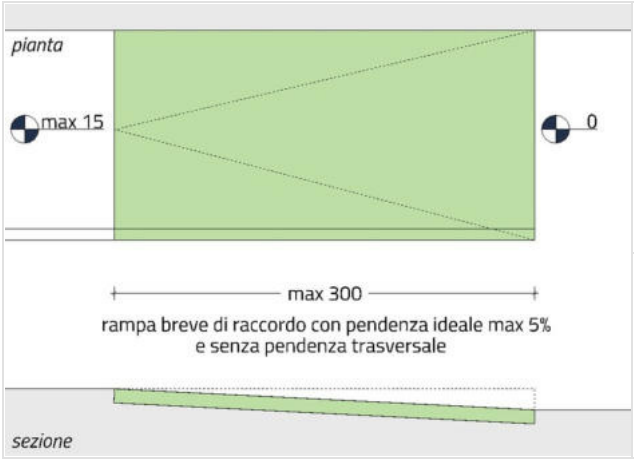

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.302 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03103**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

81 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Arnaldo Piutti 8, Udine	1	E 00FF5-03104

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03105	1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Arnaldo Piutti 8, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

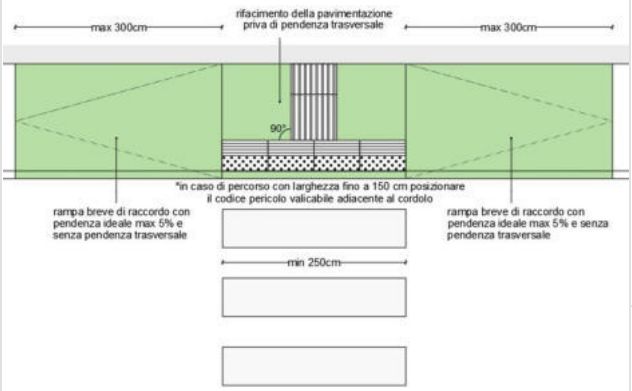

PS2014
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.036 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Arnaldo Piutti 8, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03105

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03104	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Arnaldo Piutti 8, Udine	Costo stimato **4036 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

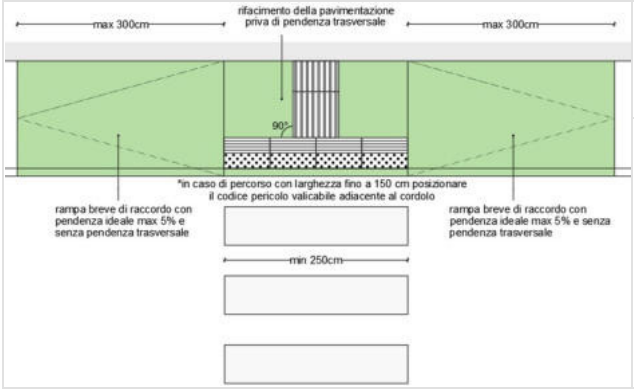

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03104.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 8, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03106**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 205,00 cm	Y 3200,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03107	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

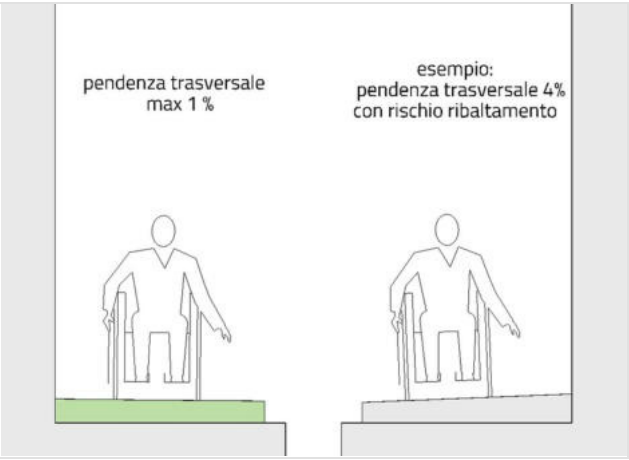

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

9.950 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03107**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 2000,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03106	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Arnaldo Piutti 8, Udine	Costo stimato **9950 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

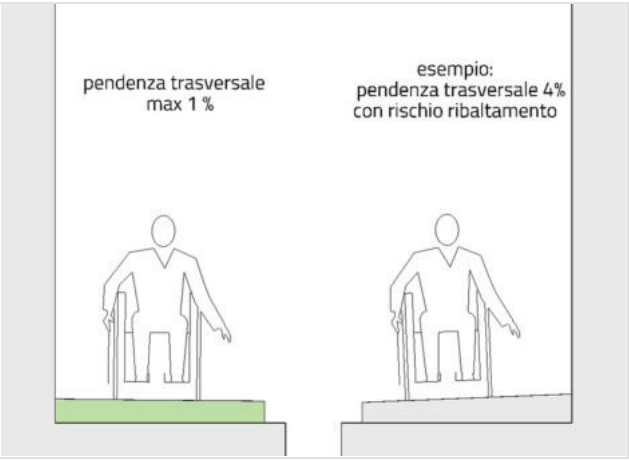

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03106.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03108**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03109	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03110	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

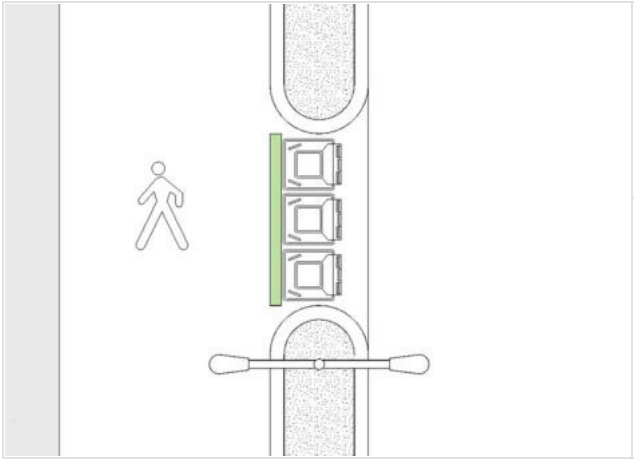

PS1873
Spostamento/richiesta di spostamento a ente terzo in area esterna al percorso pedonale

Spostamento dei cassonetti in posizione esterna ai percorsi pedonali, al fine di garantire il conferimento dei rifiuti in modo agevole e sicuro, da identificarsi a cura degli uffici preposti.

STIMA DEL COSTO
Spostamento dei cassonetti in posizione esterna al percorso pedonale

545 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03109**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03108	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato **545 €**
E 00FF5-03110	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

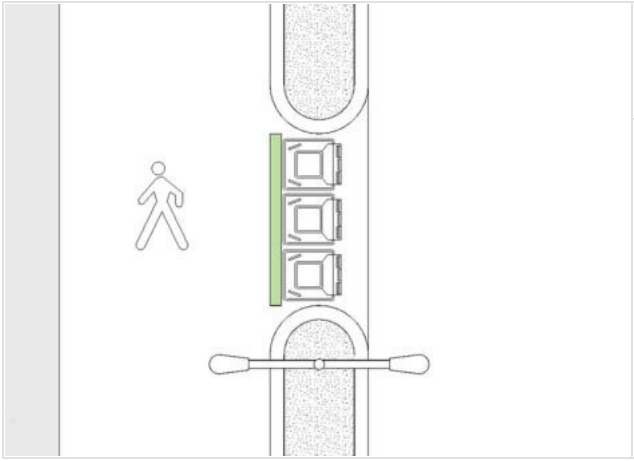

PS1873 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03108.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > BALDASSERIA > Via Arnaldo Piutti

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Arnaldo Piutti 6, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03110**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cestino/cassonetto	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 60,00 cm
Materiale	Gomma/PVC/resina	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03108	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato **545 €**
E 00FF5-03109	LIV. 3	**Cestino/cassonetto Ostacolo verticale** Via Arnaldo Piutti 6, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

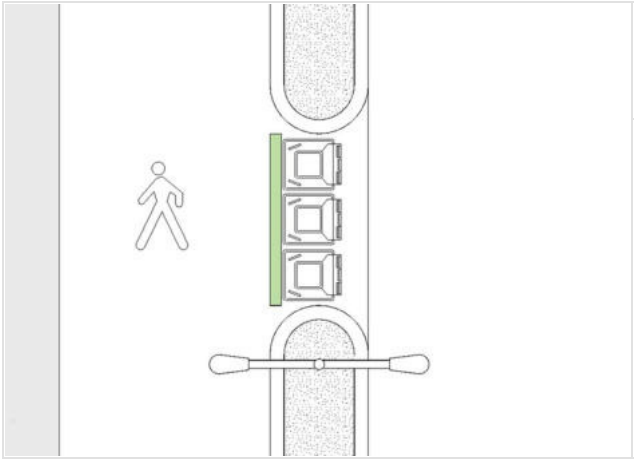

PS1873 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03108.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

16

LAIPACCO

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 127, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03178**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 280,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03180	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 127-141, Udine	**21647 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

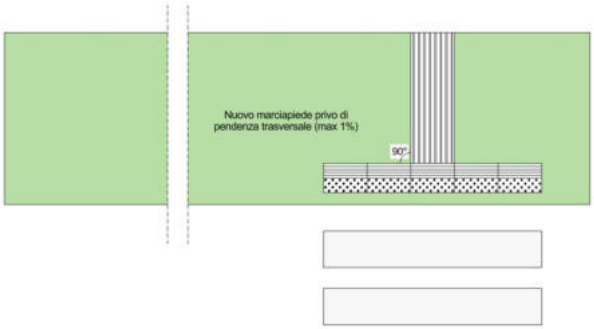

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03180.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 127, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03179**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

53 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 127-141, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03180**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 7800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03178	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 127, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

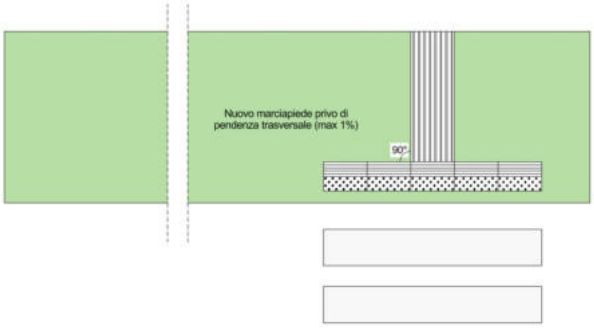

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e posa di segnaletica tattilo-plantare

21.647 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03181**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 195,00 cm	Y 850,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

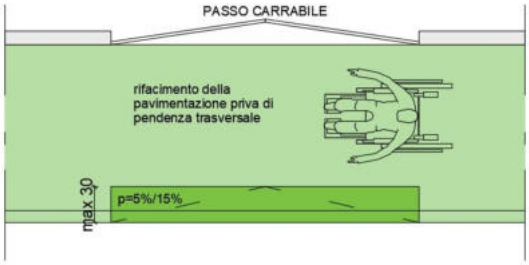

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.834 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03182**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03183	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 141, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

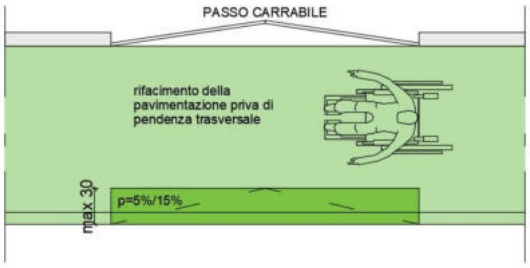

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.789 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03183**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03182	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 141, Udine	**2789 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

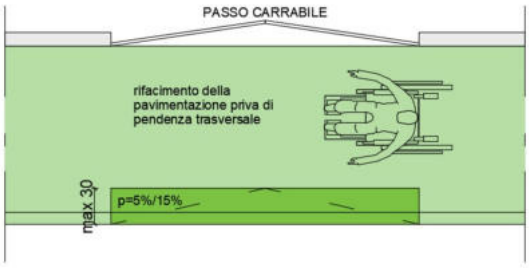

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03182.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03184**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

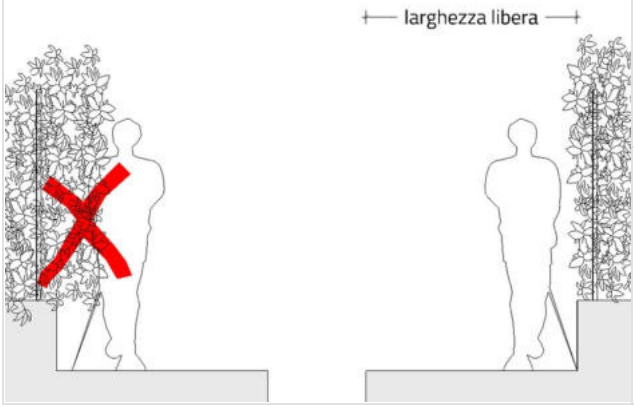

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

740 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03185**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	2	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 4500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

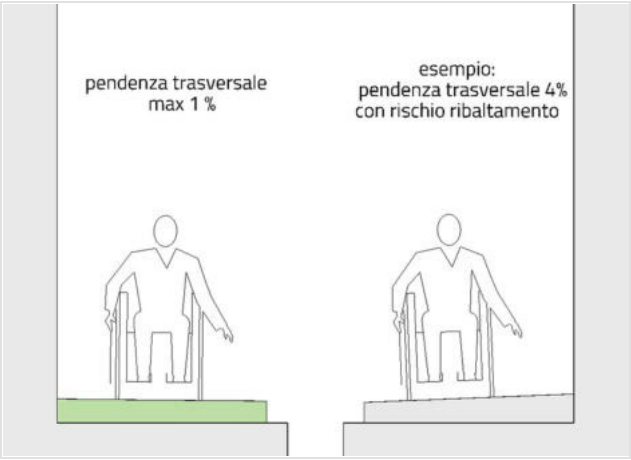

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.853 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03186**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 4500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

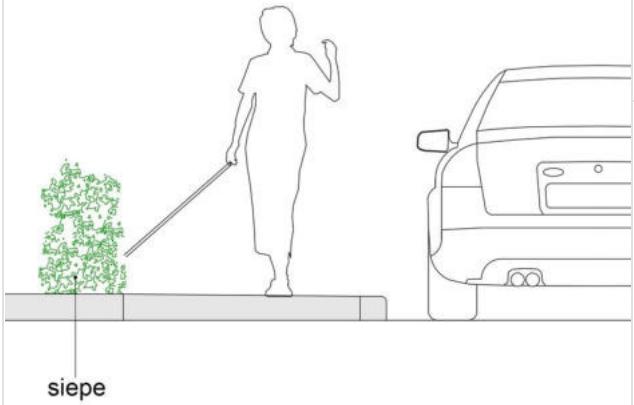

PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

5.461 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03187**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03188	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 141, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

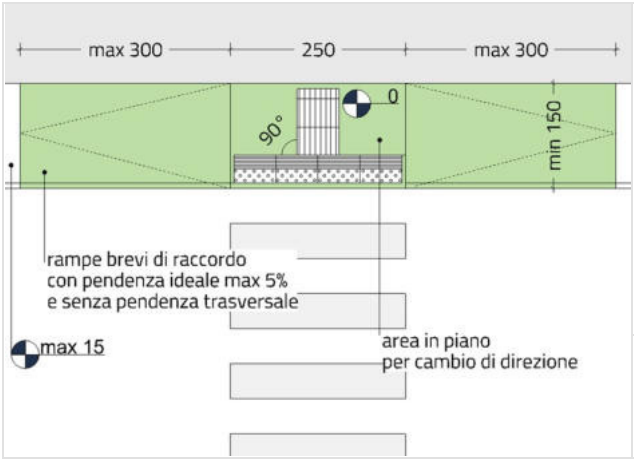

P0822 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

2.566 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 141, Udine	1	E 00FF5-03188

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03187	1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 141, Udine	2566 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

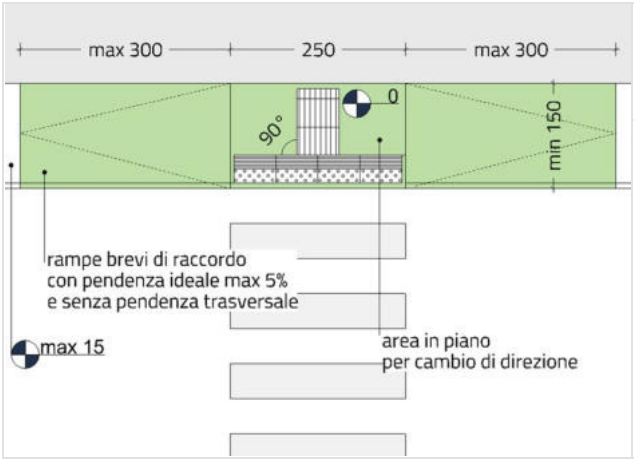

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03187.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03189**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 700,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

75 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 141, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03190**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli e schienale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

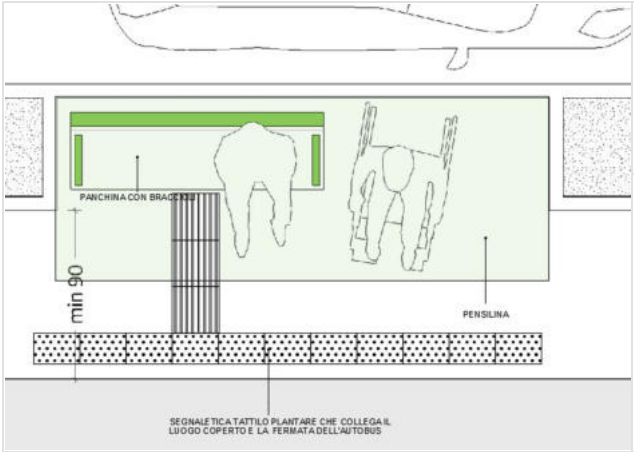

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 149, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03191**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 92,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03192	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03193	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03194	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03196	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03464	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Allargamento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Allargamento del tratto di percorso con una larghezza min 90 cm, con cordolo ad elevato contrasto cromatico, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di una sola rampa come esistente in prossimità del passo carraio, con pendenza massima del 5%, priva di pendenza trasversale. Eventuali pali segnaletica e manufatti presenti lungo il tratto di marciapiede saranno spostati in area esterna al percorso pedonale o delimitati per creare guida naturale. Realizzazione di attraversamento pedonale in linea in materiale analogo all'esistente. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03203)

STIMA DEL COSTO
Allargamento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e posa di segnaletica tattilo-plantare

7.276 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 149, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03192**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 2050,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03191	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato **7276 €**
E 00FF5-03193	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03194	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03196	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03464	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03191.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 149, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03193

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Palo in posizione centrale rispetto al percorso pedonale sul tratto di 50 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03191	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato **7276 €**
E 00FF5-03192	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03194	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03196	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03464	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03191.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 149, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03194

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Pluviale alto da terra di 20 cm. Sporgente di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03191	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato **7276 €**
E 00FF5-03192	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03193	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03196	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03464	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03191.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 155, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03203**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il percorso si riduce fino ad annullarsi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03204	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03205	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03206	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03197	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03198	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1847 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Realizzazione di attraversamento pedonale in linea. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di breve rampa laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03191)

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **6.390 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 155, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03204

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

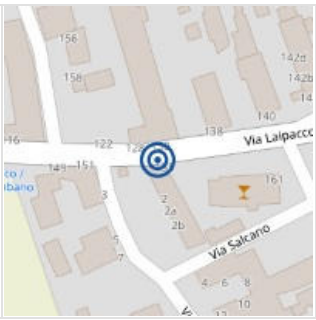

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03203	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato **6390 €**
E 00FF5-03197	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03198	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03205	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03206	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 155, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03205**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 40,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	
Note relative al rilievo	--	

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03203	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato **6390 €**
E 00FF5-03197	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03198	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03204	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03206	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 155, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03206

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	0	≥ 90cm
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Il percorso si riduce fino ad annullarsi.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03203	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato **6390 €**
E 00FF5-03197	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03198	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03204	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03205	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 155, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03207**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 220,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
Il percorso é ostacolato da aiuola.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

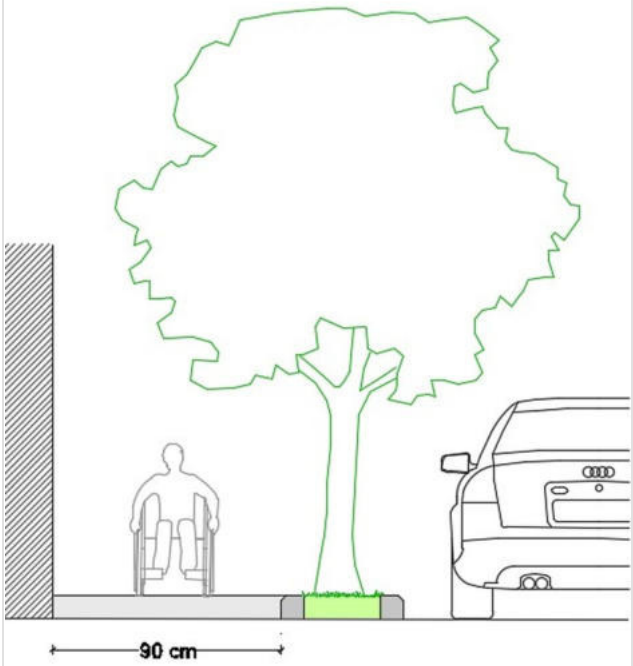

Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso per permettere un passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

186 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03208**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 295,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

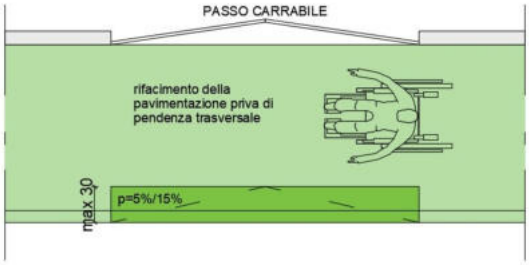

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.716 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03209**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 390,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

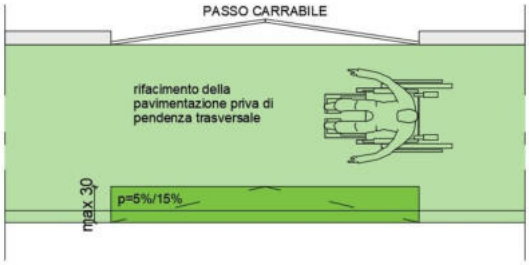

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.609 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03210**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03211	**1**	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 138, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

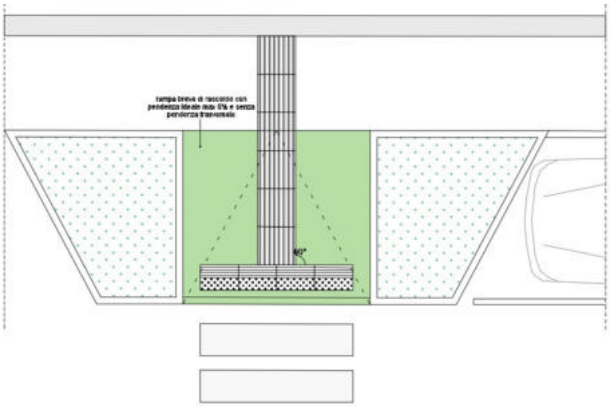

PS1850 (modificato)
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, posa di segnaletica tattilo plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo plantare

3.522 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03211**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	9	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03210	**1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 138, Udine	**3522 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

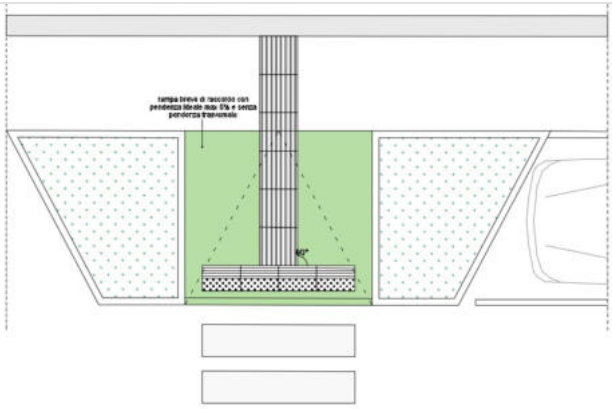

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03210.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03212**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 900,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

85 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03213**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Presenza lungo il percorso di accesso carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03214	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 138, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

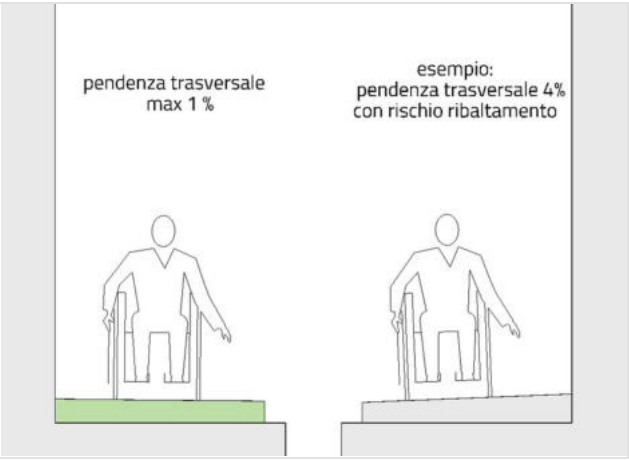

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.330 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 138, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03214**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 2000,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Presenza lungo il percorso di accesso carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03213	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 138, Udine	**10330 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

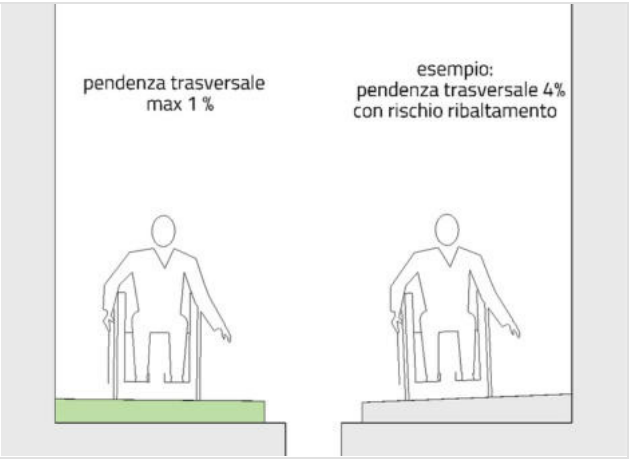

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03213.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 161, Udine	1	E 00FF5-03215

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 320,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03217	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Idria, Udine	3130 €

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03217.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03220**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso è intervallato da aiuole che riducono la larghezza di passaggio a 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03221	**1**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 165, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

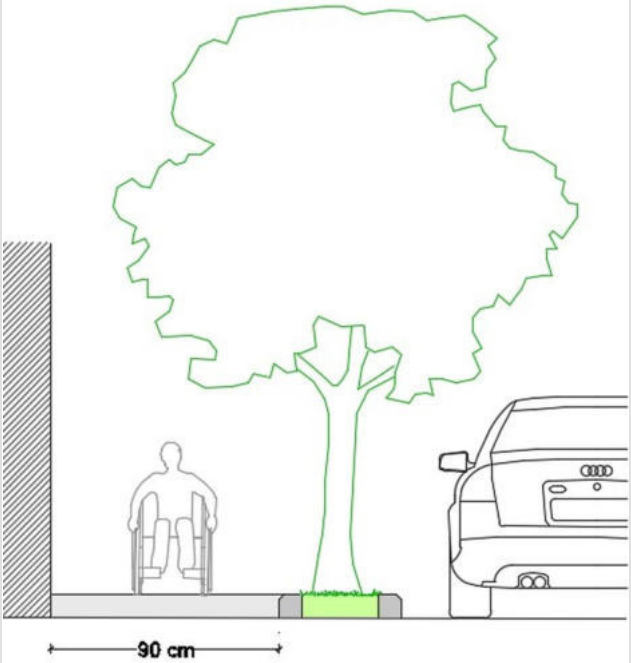

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione, riduzione della aiuole

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Riduzione della larghezza delle aiuole che riducono la larghezza di passaggio, garantendo una larghezza di passaggio minima di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso e riduzione della aiuole

10.351 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03221**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03220	**1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 165, Udine	**10351 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

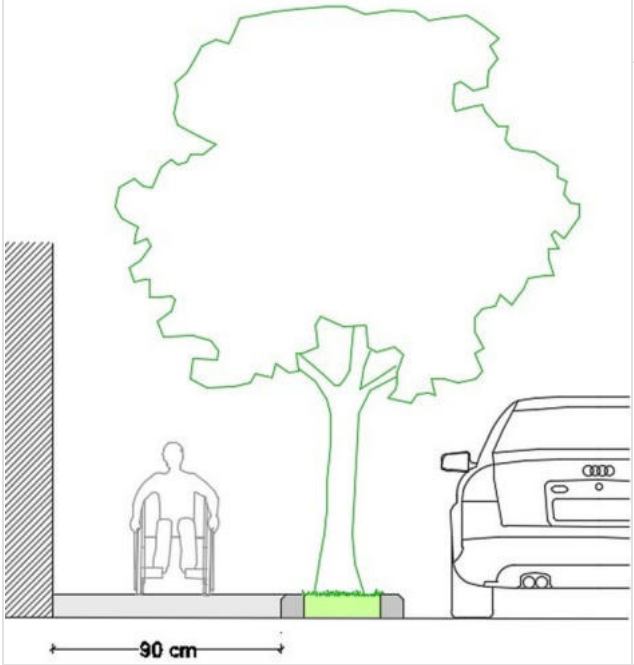

PS2006 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03220.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03222**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | STALLO RISERVATO

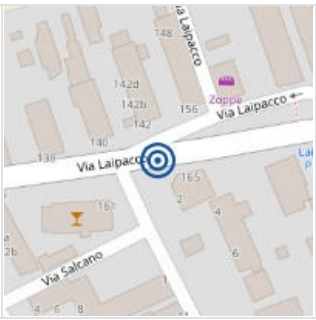

Lunghezza	560	cm
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 560,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

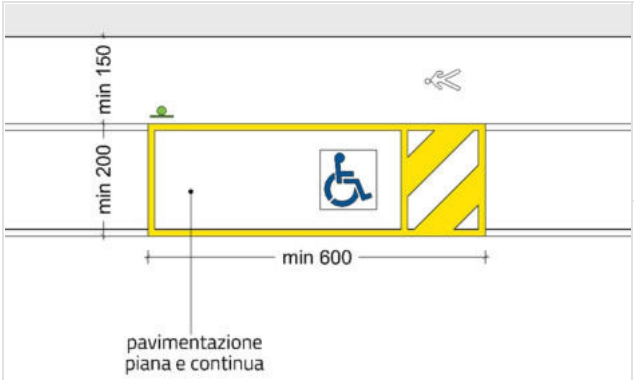

P1434 (modificato)
Rifacimento di segnaletica orizzontale

Adeguamento dello stallo riservato con dimensioni minime di 200 x 600 cm e segnaletica verticale ed orizzontale come da prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, collegamento al percorso pedonale a raso o mediante breve rampa di raccordo.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento di segnaletica orizzontale **5.451 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03224**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

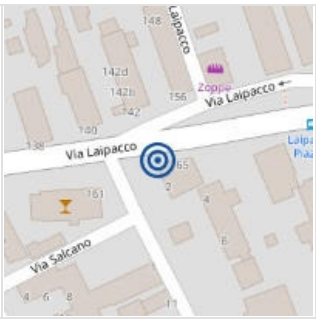

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm da pluviale (interasse) al muro. Larghezza minima di passaggio di 235 cm. Larghezza totale del marciapiede di 250 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

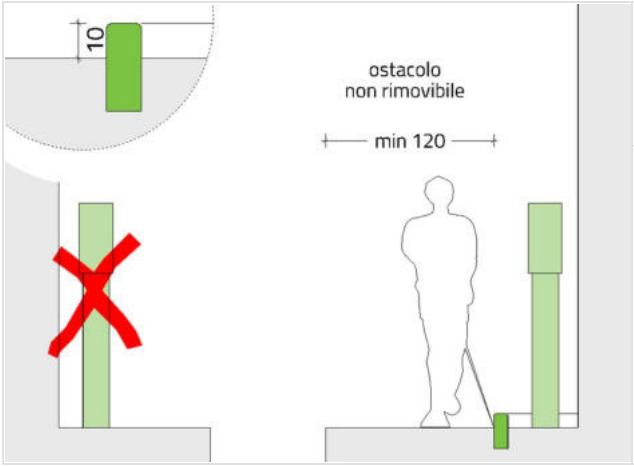

P0994 (modificato)
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

Delimitazione con cordolo della grondaia per creare continuità alla guida naturale.

STIMA DEL COSTO
Delimitazione con cordolo di manufatto tecnologico non spostabile

350 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03225**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 235,00 cm	Y 480,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Passo carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

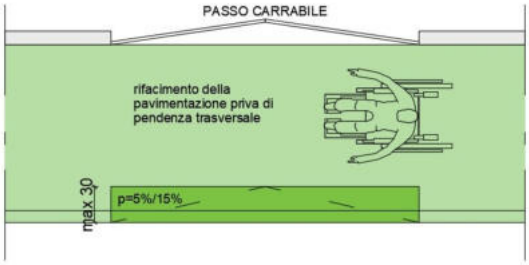

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.543 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 165, Udine	1	E 00FF5-03226

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **PAVIMENTAZIONE**

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 1080,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Il percorso è intervallato da aiuole che riducono la larghezza di passaggio a 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

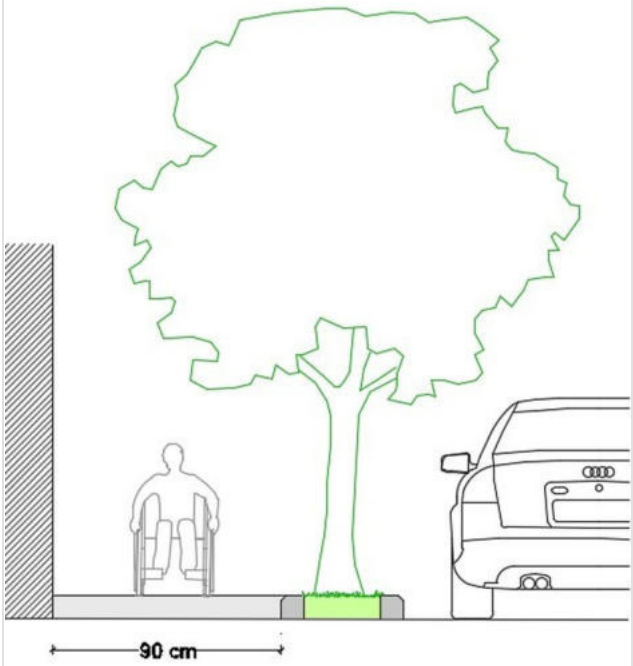

PS2006
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso per permettere un passaggio minimo di 90 cm.

STIMA DEL COSTO
Riduzione della larghezza dell'aiuola e pavimentazione del percorso

4.587 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03227**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 450,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Passo carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03228	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 165, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

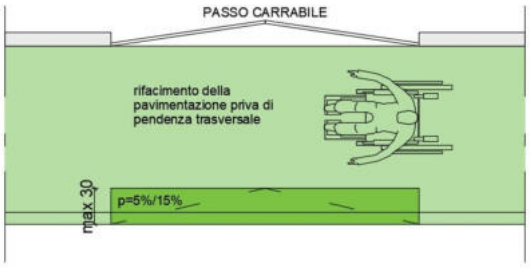

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

12.549 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 165, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03228**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 330,00 cm	Y 1840,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
La larghezza del marciapiede varia con una media di 330 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03227	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 165, Udine	Costo stimato **12549 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

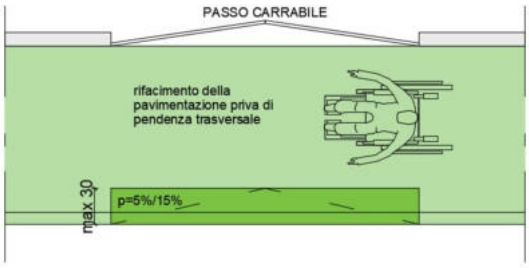

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03227.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 165, Udine	1	E 00FF5-03229

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03231	1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 173, Udine	8159 €
E 00FF5-03232	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 173, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

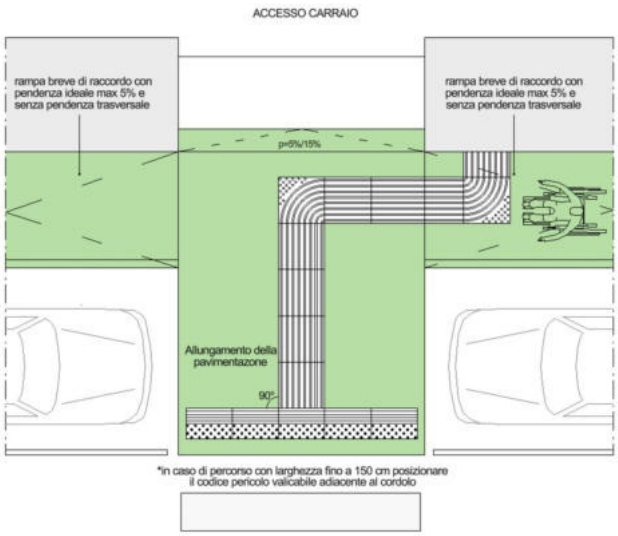

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03231.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 173, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03231

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	11	≤ 8 m
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1100,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Attraversamento affiancato da stalli di parcheggio di larghezza 250 cm. Sia da un lato che dall'altro della carreggiata.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03229	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 165, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03232	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 173, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

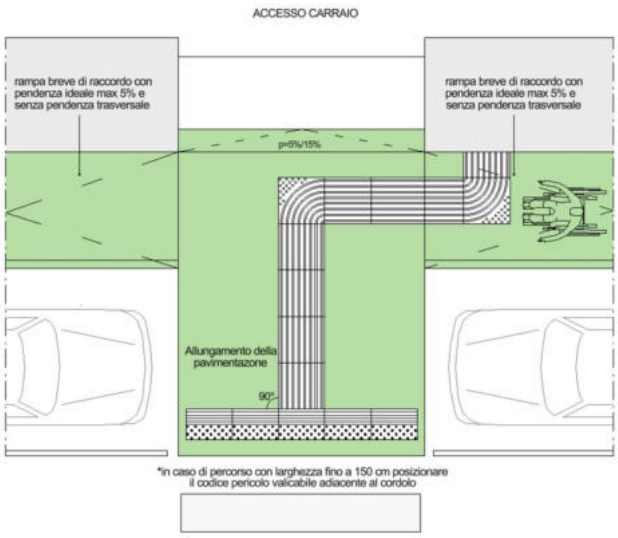

(modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, affiancato da stalli di parcheggio, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Realizzazione di rampe longitudinali con pendenza max del 5% per portare il tratto di marciapiede frontale all'attraversamento a raso con la sede stradale.
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

NOTA: Si consiglia, se possibile, lo spostamento dell'attraversamento.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare
8.159 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 173, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03232**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03231	LIV. 1	**Lunghezza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 173, Udine	Costo stimato **8159 €**
E 00FF5-03229	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 165, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

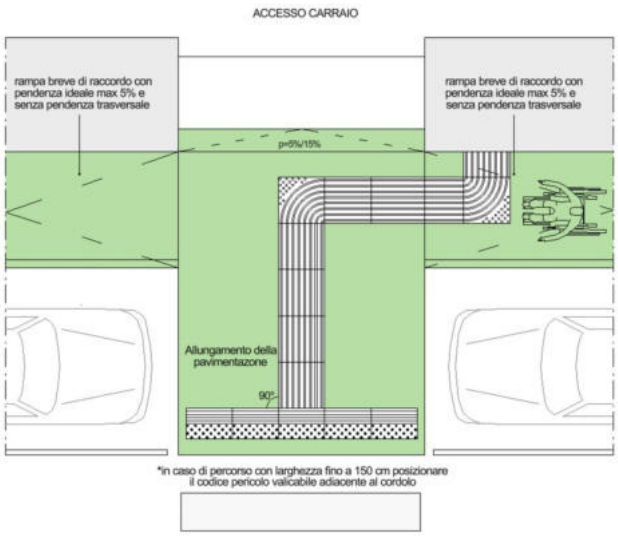

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03231.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 173, Udine	2	E 00FF5-03233

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli e schienale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

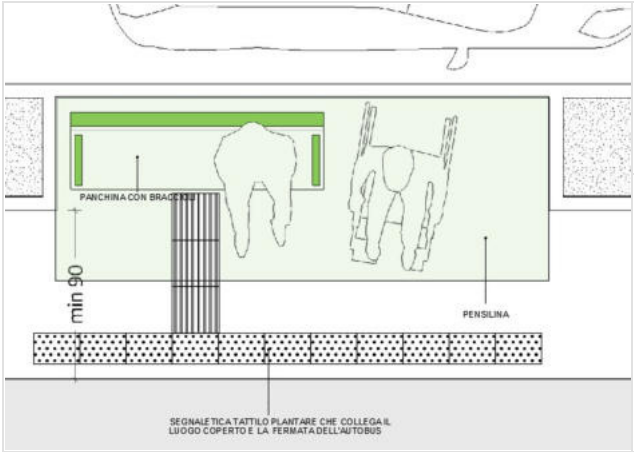

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.055 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 173, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03234**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 530,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Accesso carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

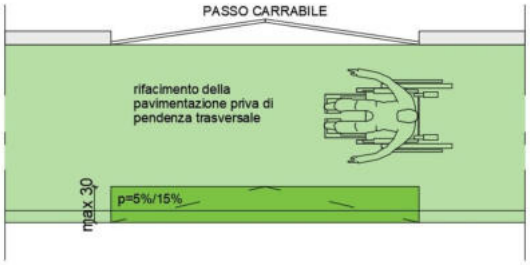

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

1.937 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 173, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03235**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03236	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 173, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

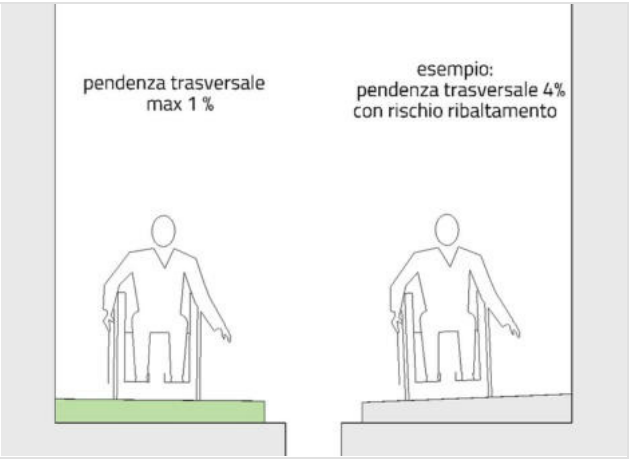

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.563 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 173, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03236**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 125,00 cm	Y 1700,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03235	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 173, Udine	Costo stimato **3563 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

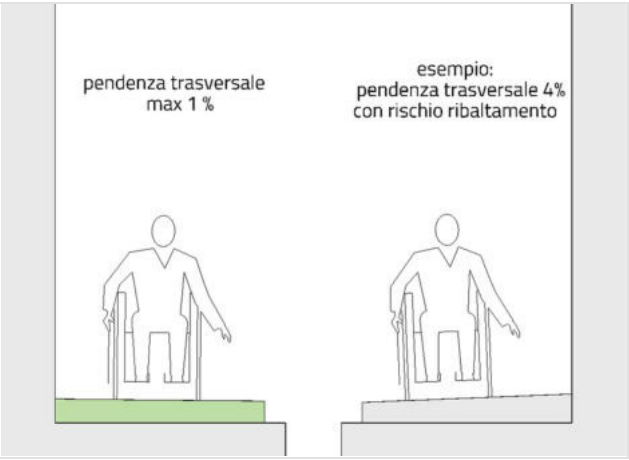

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03235.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 181, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03237

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 125 cm. Larghezza totale del marciapiede di 142.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

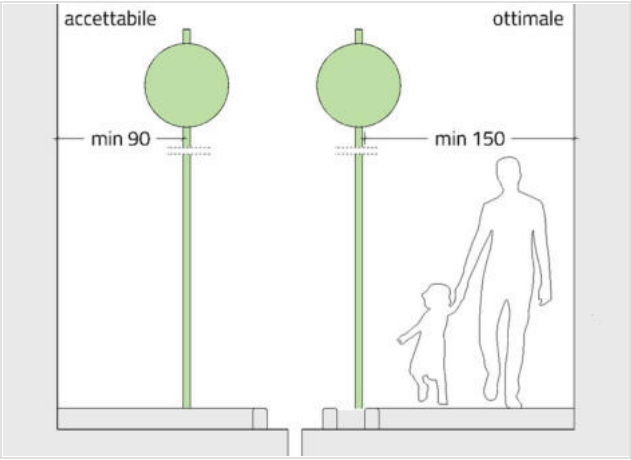

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 181, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03238

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03239	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03240	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03241	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03242	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181-185, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con rampe longitudinali

Rifacimento del tratto di percorso tramite la realizzazione di rampe longitudinali di pendenza massimo 5% agli estremi dei passi carrai. Abbassamento del marciapiede tra i due passo carrai e realizzazione di pavimentazione continua a livello stradale priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

9.085 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 181, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03239**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03238	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato **9085 €**
E 00FF5-03242	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181-185, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03241	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03240	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03238.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 181, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03240**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03238	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato **9085 €**
E 00FF5-03242	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181-185, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03241	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03239	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03238.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 181, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03241**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza trasversale	7	0%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03238	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato **9085 €**
E 00FF5-03242	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181-185, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03240	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03239	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03238.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 181-185, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03242

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza trasversale	3	0%
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 2250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Parte del percorso è accesso carraio alto.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03238	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato **9085 €**
E 00FF5-03241	LIV. 2	**Pendenza trasversale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03240	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03239	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 181, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03238.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 185, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03243**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

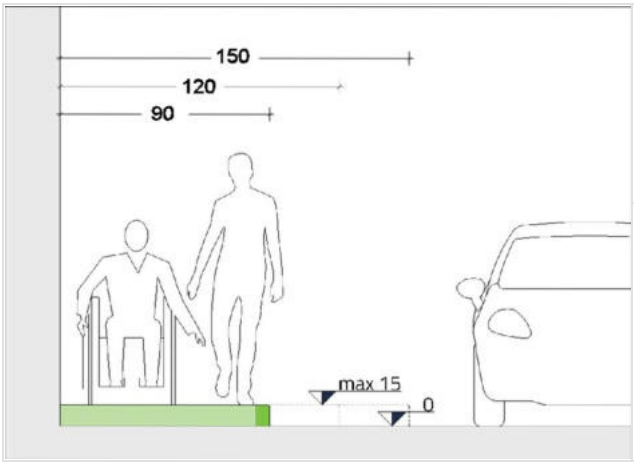

PS1847
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **4.665 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 185, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03244**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 85,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03249	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Lonzano 1, Udine	Costo stimato **4495 €**
E 00FF5-03248	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03247	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

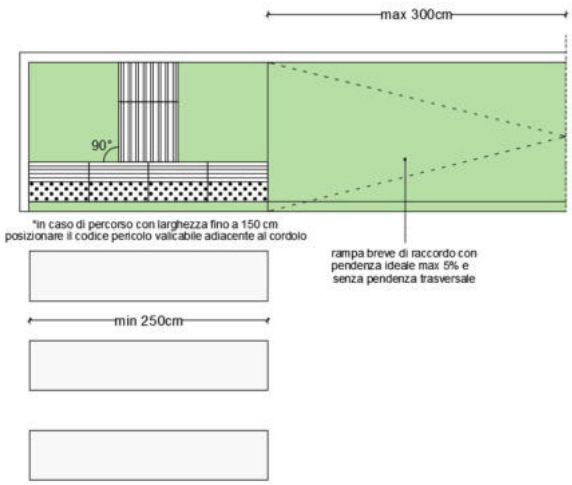

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03249.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 189-207, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03252**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2950,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

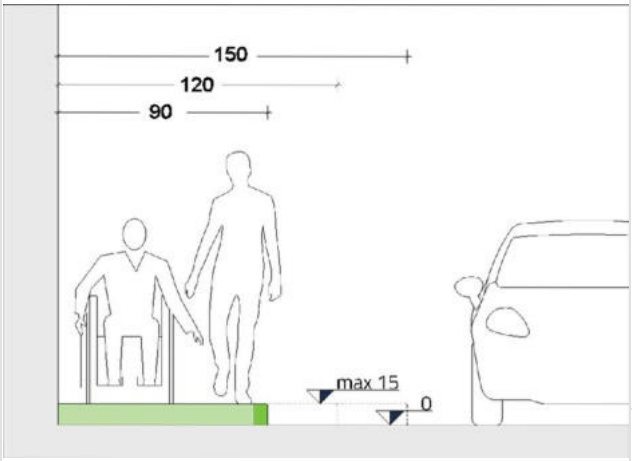

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Prestare attenzioni agli accessi carrai lungo il percorso, garantendo, durante la realizzazione del marciapiede, una corretta predisposizione delle aree e una corretta pendenza delle rampe di raccordo, sia che si scelta di optare per le rampe carrabili tenendo in continuità il marciapiede, sia che si scelga di realizzare rampe longitudinali abbassandosi di livello. I casi in questione su questo tratto di strada presentano tutti degli accessi carrai a livello stradale, per cui si procederà con il secondo caso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **11.707 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 193, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03253**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 85,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03254	LIV. **1**	**Altezza dislivello Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03255	LIV. **1**	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato **1410 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

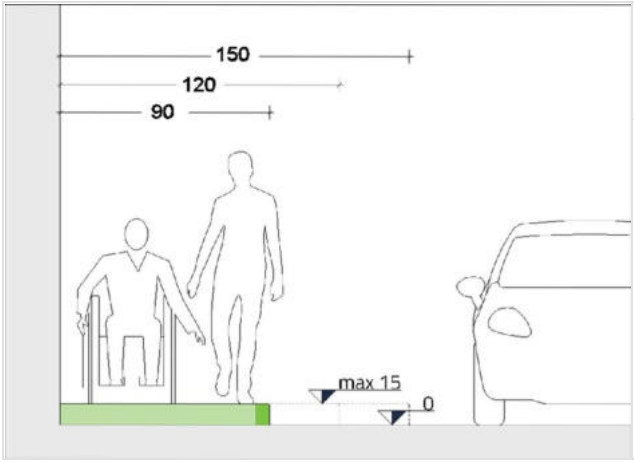

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03255.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 193, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03254**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Altezza dislivello	3	≤ 15 cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 85,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 7 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03253	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03255	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato **1410 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

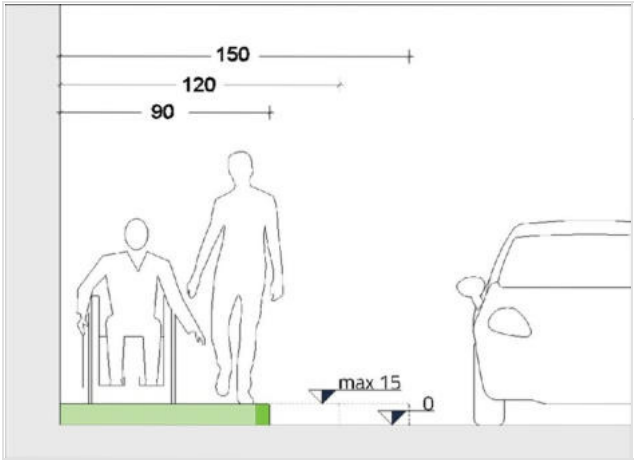

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03255.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 193, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03255**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

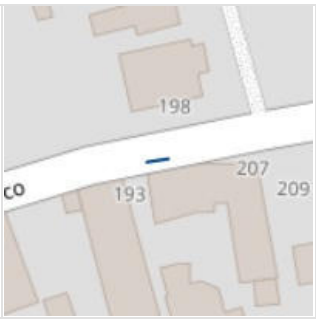

Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03254	LIV. 1	**Altezza dislivello Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03253	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 193, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

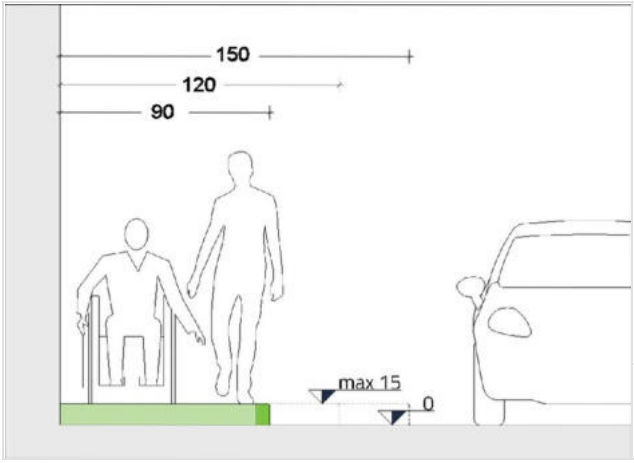

PS1847 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco. Compreso rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

1.410 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 193, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03256**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

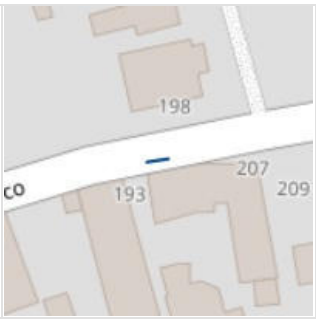

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2560,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

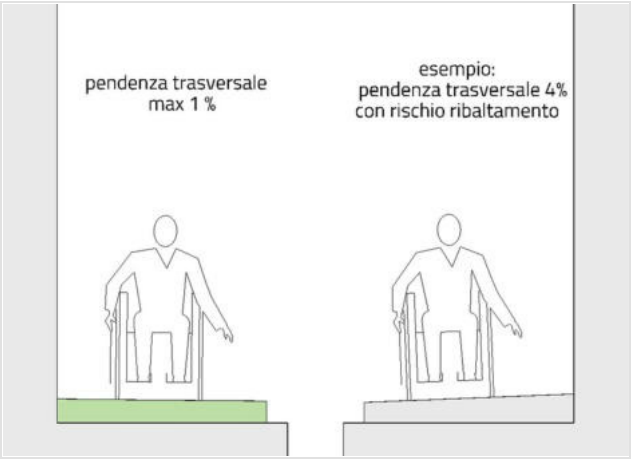

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.030 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 209, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03257**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	9	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 290,00 cm	Y 1160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03258	1	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Laipacco 209, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità non risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 209, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03258**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza longitudinale	27	≤ 5% – ammessa fino a ≤12% in caso di adeguamento
Dimensioni	X 395,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03257	**1**	**Pendenza longitudinale Percorso pedonale** Via Laipacco 209, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03257.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 215, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03259**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1500,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo

La porzione di percorso segnalata presenta nella sua complessità un percorso con pendenza trasversale di media del 9%, una pendenza longitudinale del 6% e dei restringimenti fino a 65 cm di brevi tratti. Pendenza longitudinale non risolvibile. Si suggerisce o il rifacimento del marciapiede con riduzione delle aiuole o rifacimento a raso con sede stradale, delimitato da cordolo.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03260	LIV. **1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

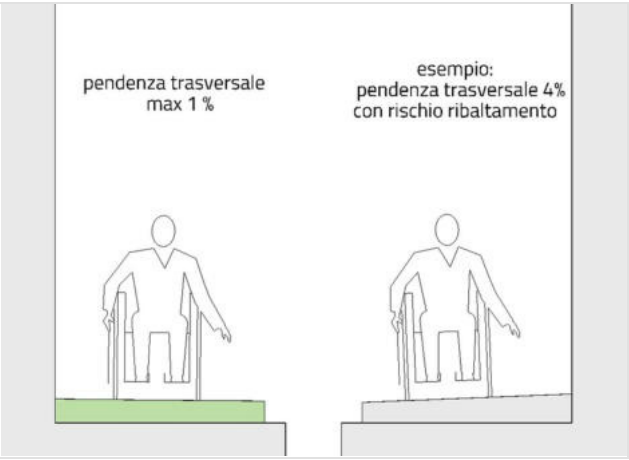

PS1702 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento dell'area pavimentata in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. La pendenza longitudinale non è risolvibile a causa delle caratteristiche del contesto. Si suggerisce, inoltre, l'eliminazione o la riduzione di larghezza delle aiuole presenti che riducono la larghezza minima di passaggio.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

10.510 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 215, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03260

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03259	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato **10510 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

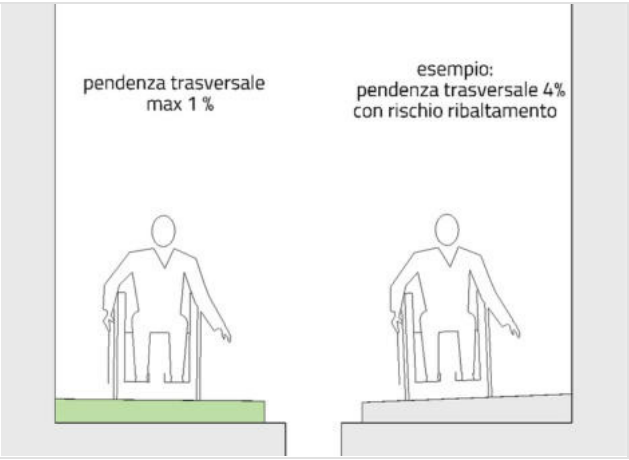

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03259.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 215, Udine	2	E 00FF5-03261

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	15	≤ 15%
Dimensioni	X 210,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

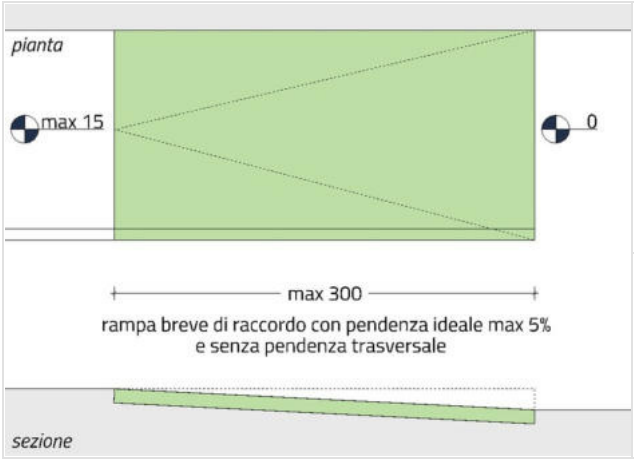

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.109 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 215, Udine	2	E 00FF5-03262

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03263	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 215, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

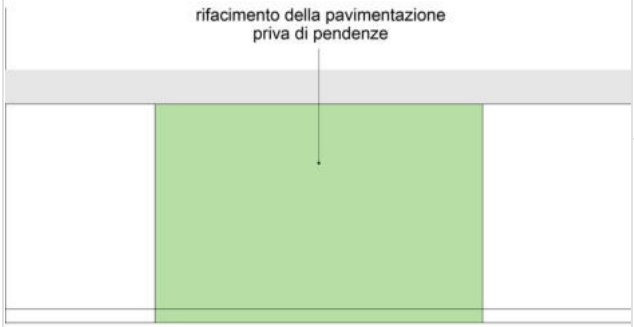

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento in piano del tratto di percorso **680 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 215, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03263

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 115,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03262	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 215, Udine	680 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

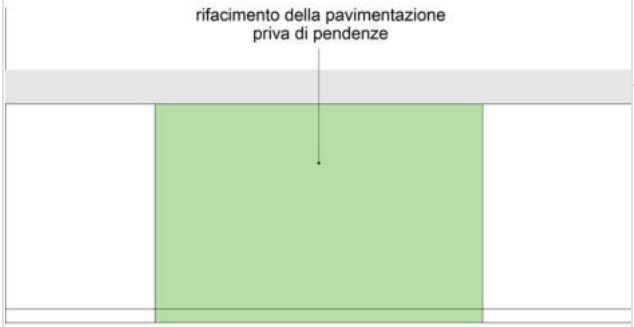

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03262.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 215, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03264

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO ORIZZONTALE

Risalti/incasso	Si	
Dimensioni	X 20,00 cm	Y 430,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Profondità di 30 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

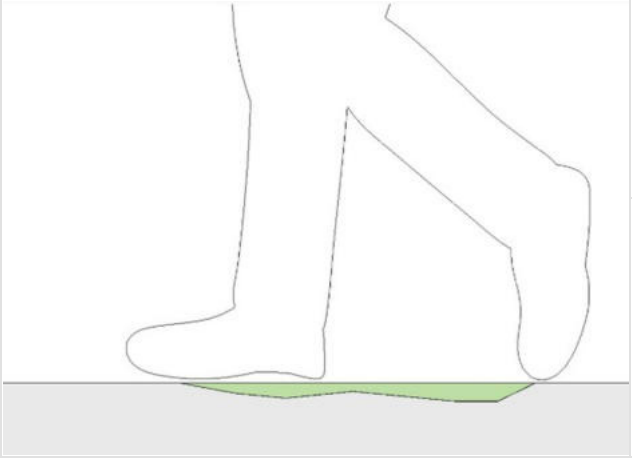

(modificato)
Riparazione puntuale

Rifacimento puntuale del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **337 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 215, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03265

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 34 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 150 cm. Larghezza totale del marciapiede di 185 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

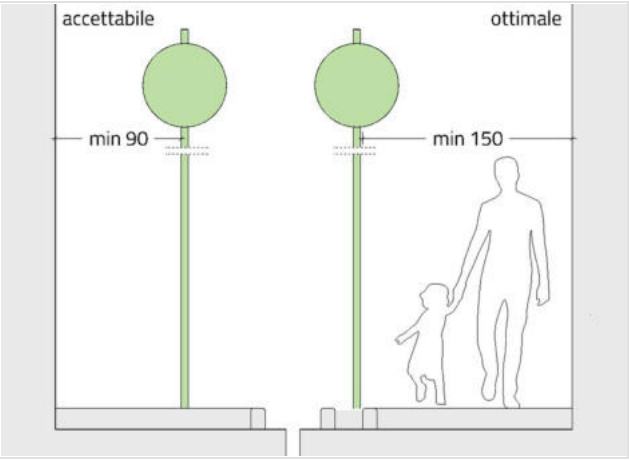

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 215, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03266**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03267	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

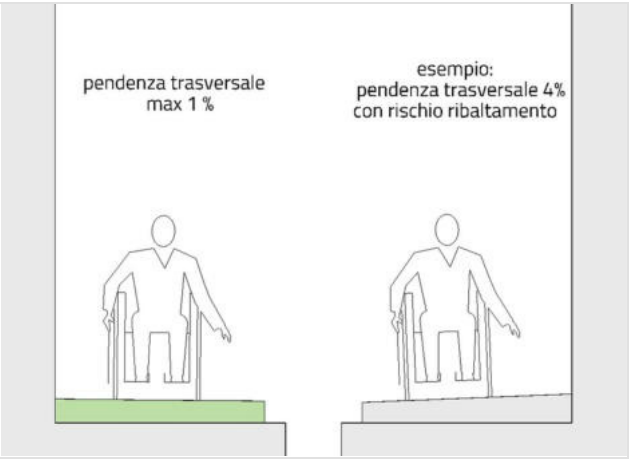

PS1702 (modificato)
Sistemazione della pavimentazione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo a quello del resto del marciapiede al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.010 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 215, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03267**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 570,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03266	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato **2010 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

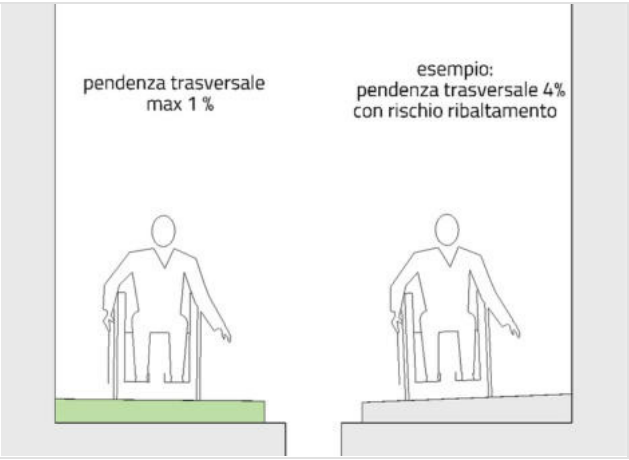

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03266.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 215, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03268**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2400,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03269	LIV. **1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato **8556 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

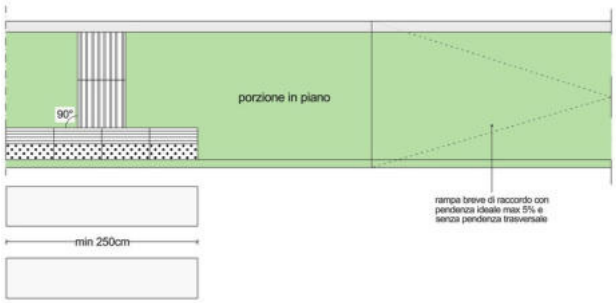

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03269.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 215, Udine	1	E 00FF5-03269

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 550 cm. Larghezza del marciapiede attualmente non esistente di 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03268	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 215, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

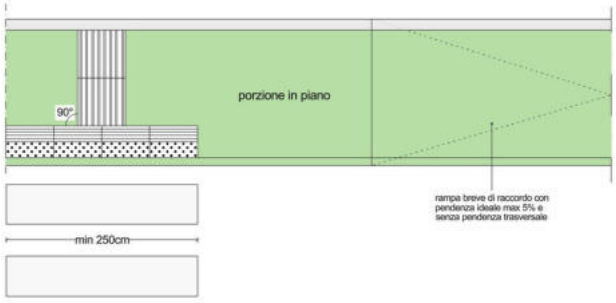

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03270)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

8.556 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 215, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03270**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 550,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 550 cm. Larghezza del marciapiede attualmente non esistente di 310 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03271	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 251, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

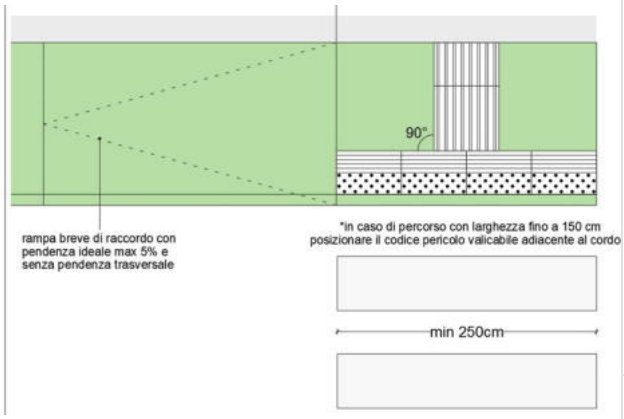

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03270)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

4.336 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 251, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03271

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03270	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 215, Udine	Costo stimato **4336 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

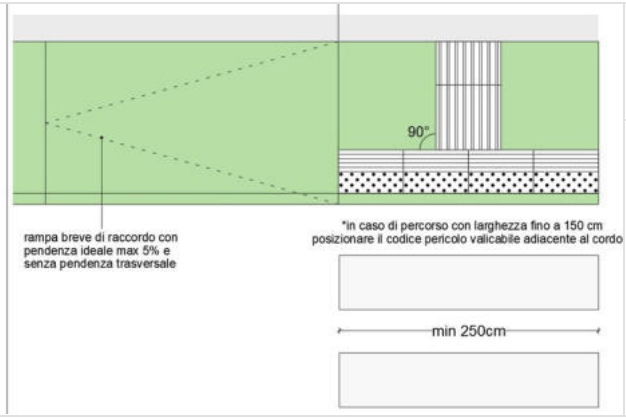

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03270.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 251, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03272**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Danneggiato	Si	
Dimensioni	X 15,00 cm	Y 760,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Cordolo danneggiato.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0968 (modificato)
Manutenzione dell'elemento

Manutenzione dei cordoli lungo la carreggiata.

STIMA DEL COSTO
Manutenzione dei cordoli

1.278 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 251, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03273**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

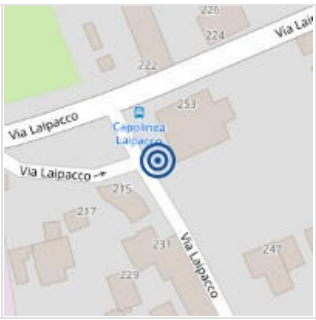

Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03274	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **2343 €**
E 00FF5-03276	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

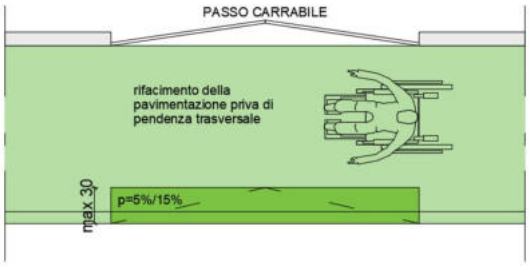

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03274.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 251, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03274**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 400,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03273	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03276	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

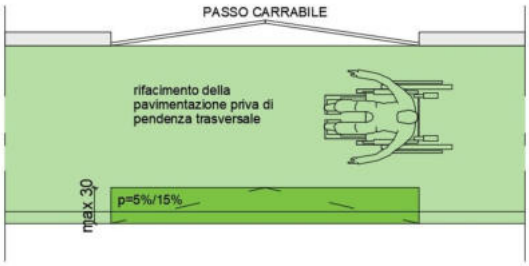

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

2.343 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 251, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03276**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

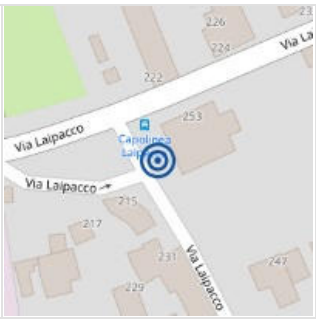

Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 50,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03274	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **2343 €**
E 00FF5-03273	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

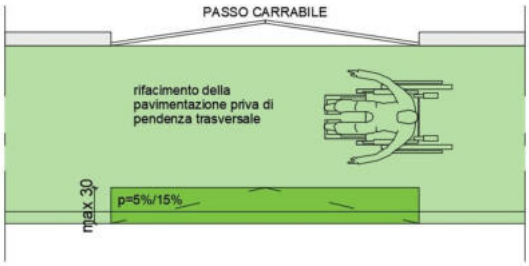

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03274.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 251, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03277

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

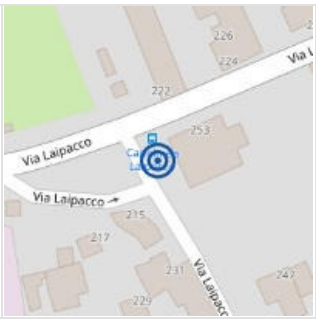

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03278	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03279	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 253, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

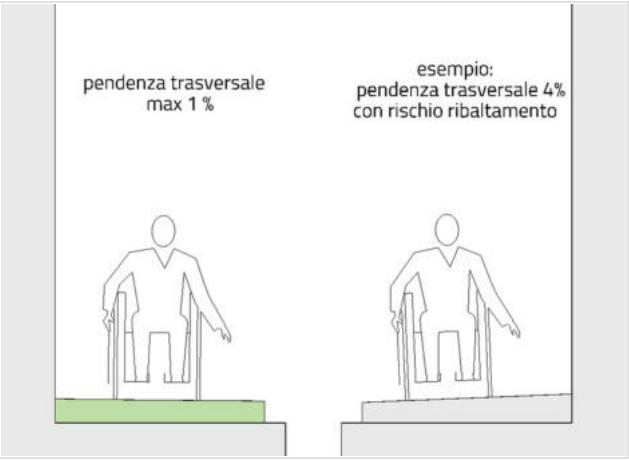

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.487 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 251, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03278**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03277	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **1487 €**
E 00FF5-03279	LIV. **2**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 253, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

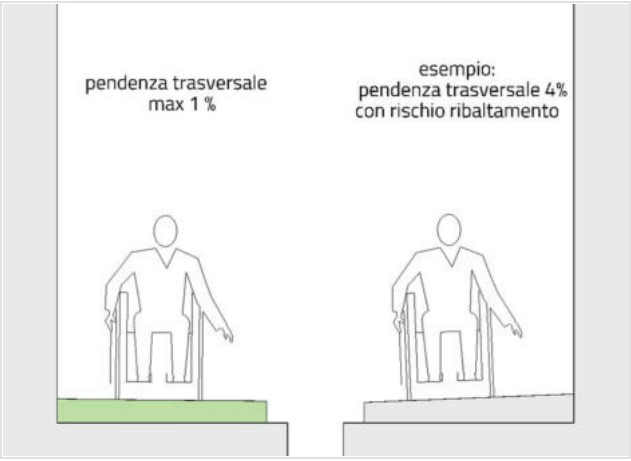

PS1702 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03277.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 253, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03279**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

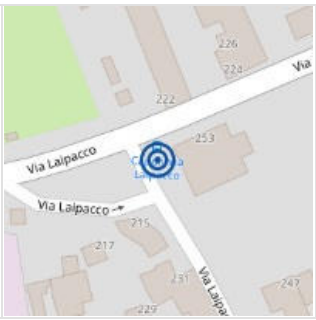

Pendenza longitudinale	19	≤ 15%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03277	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **1487 €**
E 00FF5-03278	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 251, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

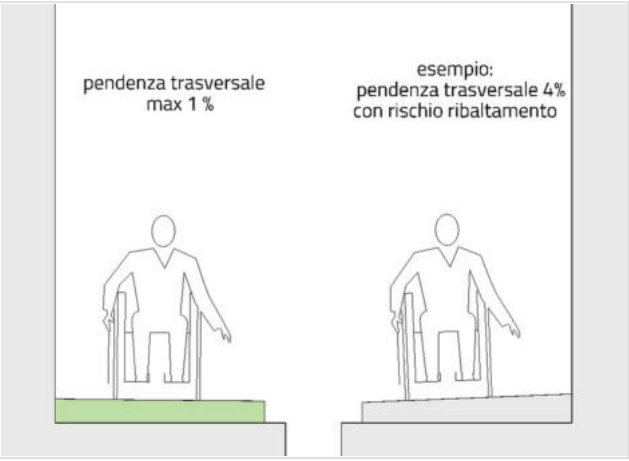

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03277.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 253, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03280**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 1750,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

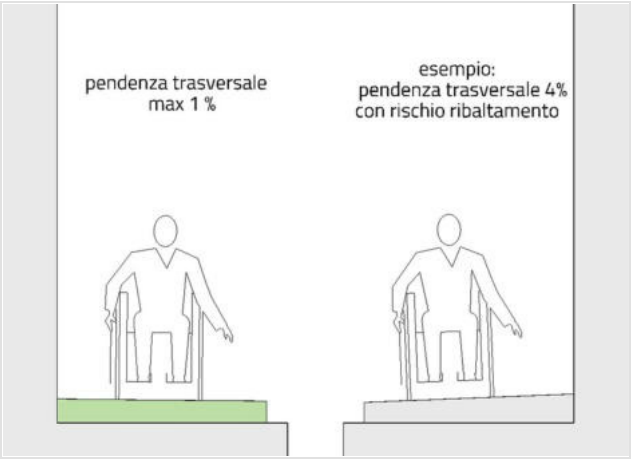

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

5.203 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 253, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03281**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

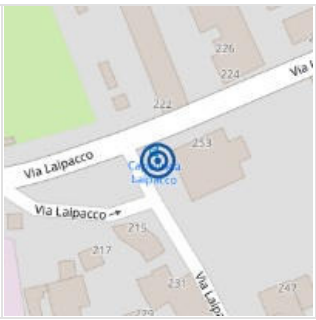

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Panchina senza braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

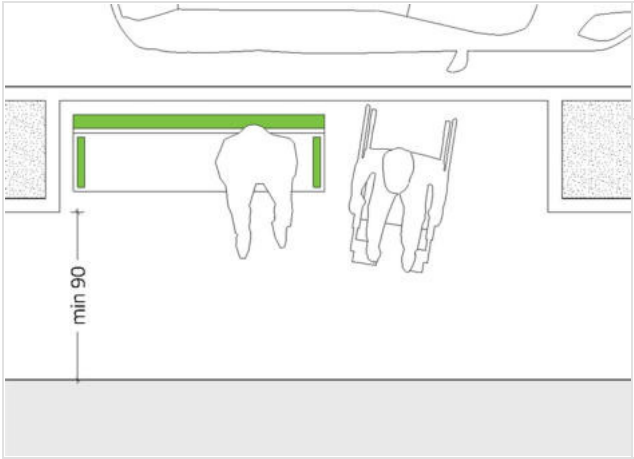

P0965
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione della panchina esistente con una avente schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina **582 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 253, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03282**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Panchina senza braccioli.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

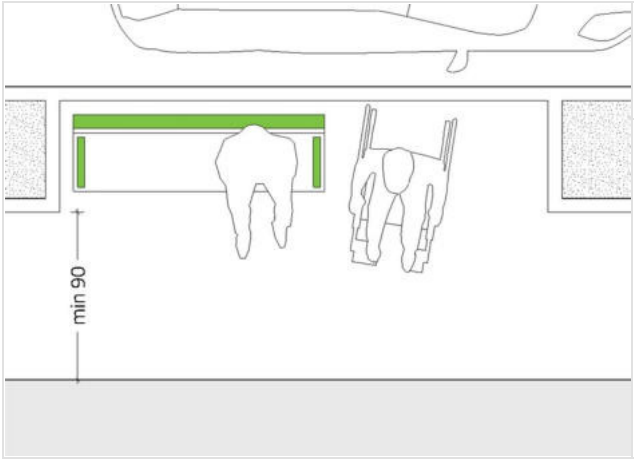

PS2008
Sostituzione dell'elemento

Sostituzione della panchina esistente con una avente schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Sostituzione della panchina **582 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 253, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03283

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

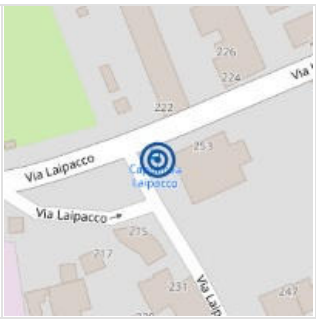

Inadeguato	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva panchina con braccioli e schienale e segnaletica tattilo plantare. La pensilina riduce la larghezza minima di passaggio a 65 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

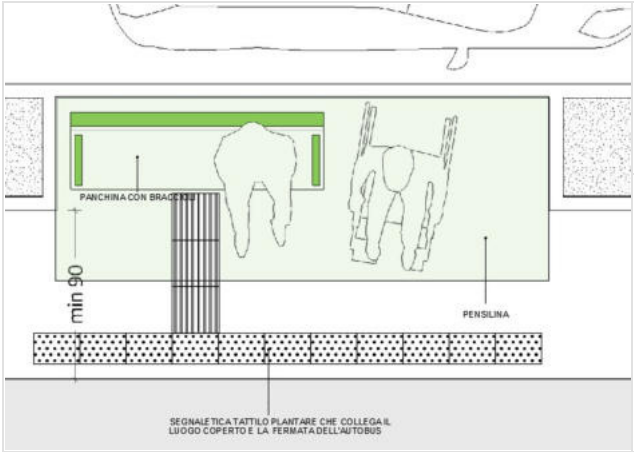

PS1752 (modificato)
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

1.015 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 253, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03284

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

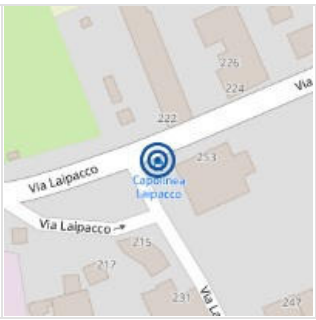

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 270 cm. Larghezza totale del marciapiede di 300 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

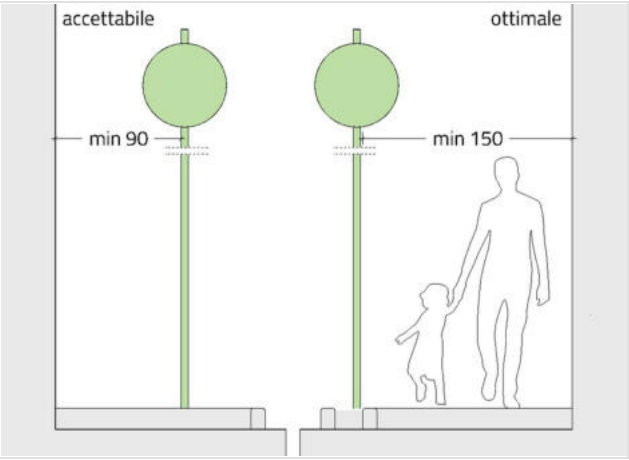

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 253, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03285**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 670 cm Larghezza del marciapiede di 300 cm Dislivello di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (allineato)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di rampa longitudinale con pendenza massima del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03286)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.464 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 222, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03286

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | **ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 670,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 670 cm Larghezza del marciapiede attualmente non esistente di 270 cm. Dislivello di 6 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03287	LIV. **1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 222, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

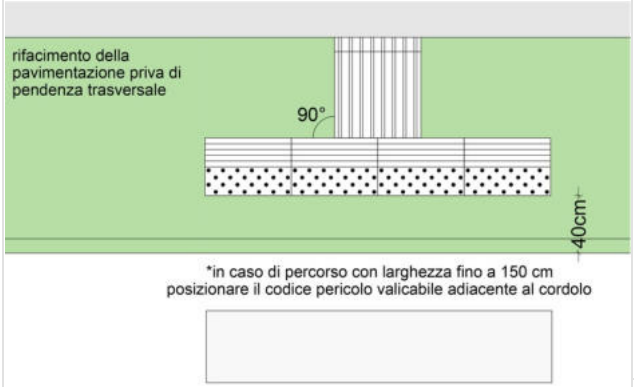

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, a livello con sede stradale. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03285)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso
7.424 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03287**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 2050,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03286	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Laipacco 222, Udine	**7424 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

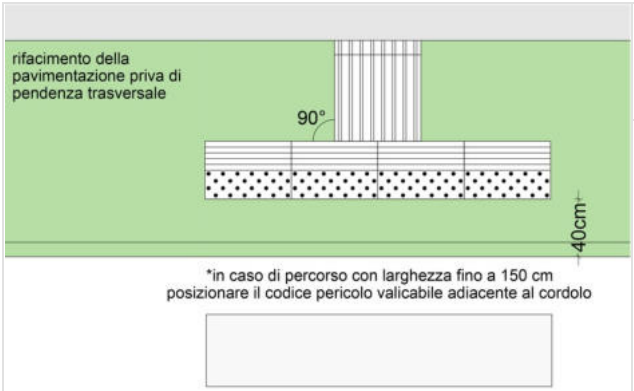

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03286.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03288**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

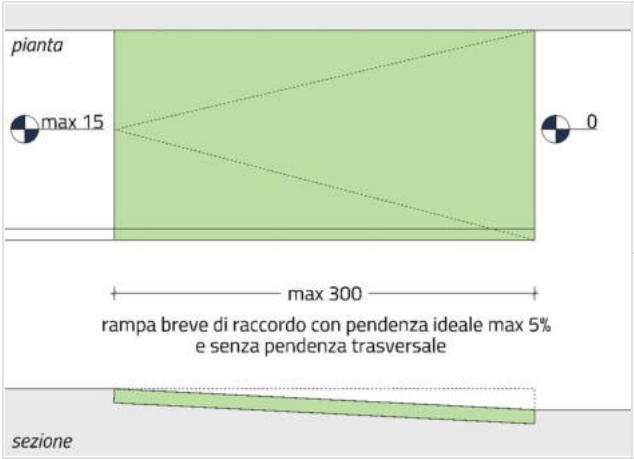

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.446 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03289**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 3500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

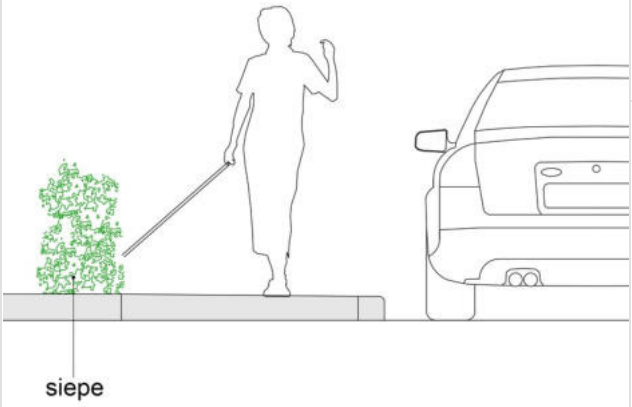

(modificato)
Posa di guida naturale

Piantumazione di siepe con altezza minima di 40 cm per creare guida naturale lungo il percorso per le persone di disabilità visiva.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

3.920 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03290**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

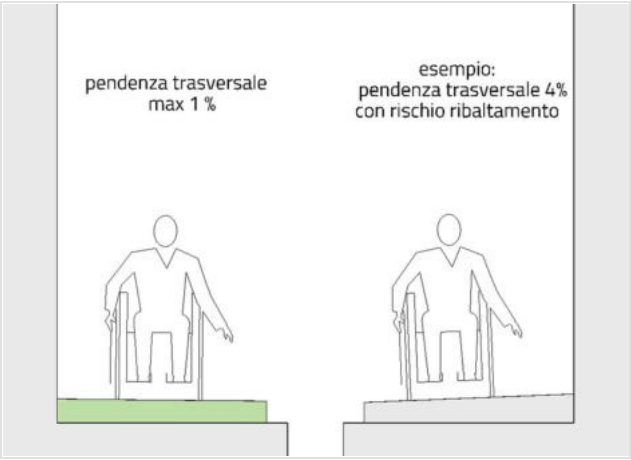

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

555 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03291**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 30,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

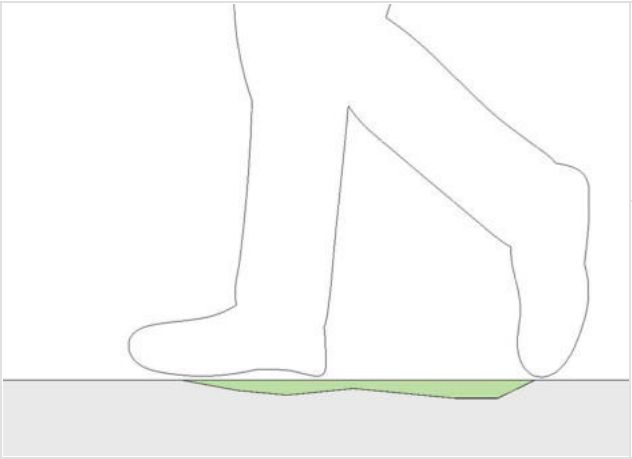

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **74 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03292**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 130,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

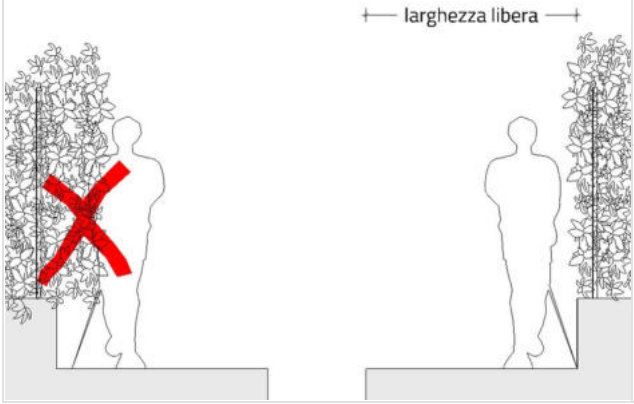

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

156 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03293**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

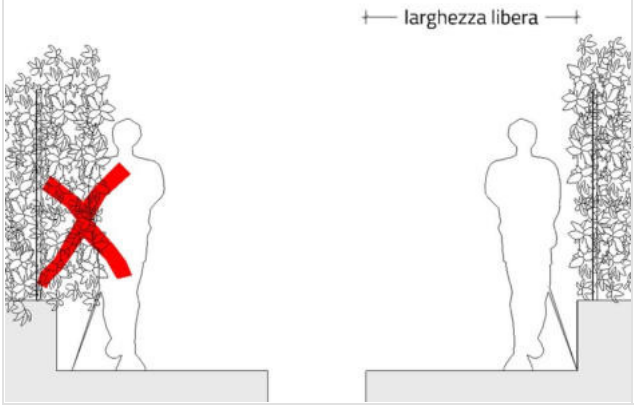

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

69 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 222, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03294**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	21	≤ 15%
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

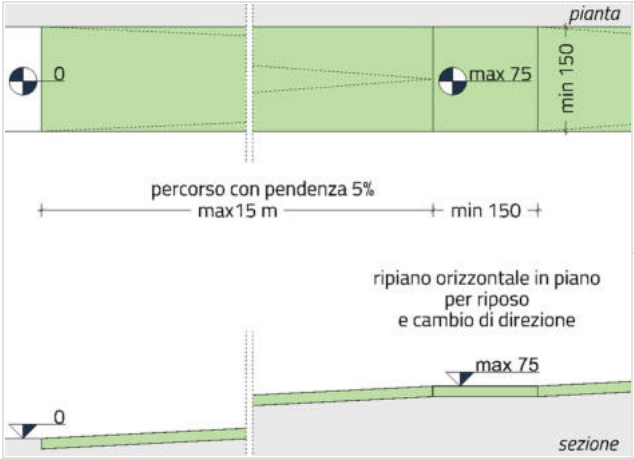

PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.208 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 222, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03295

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PARAPETTO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 310,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

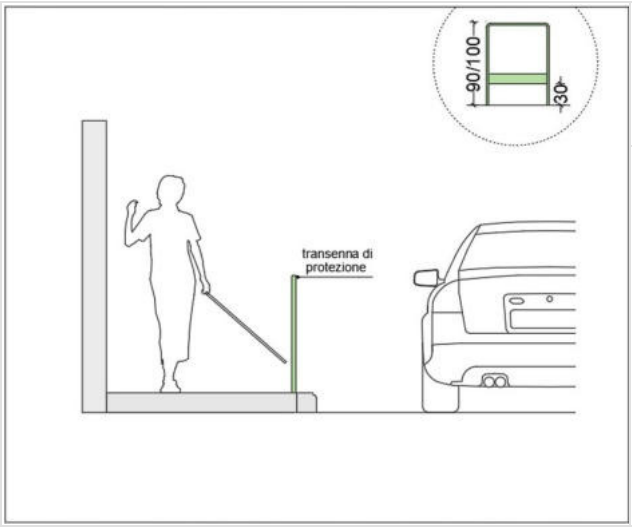

P1177 (modificato)
Posa di transenne di protezione

Posa di transenne di protezione, dotate di elementi trasversali continui a 30 cm da terra, per la riconoscibilità del percorso pedonale in area pericolosa.

STIMA DEL COSTO
Posa di transenne di protezione

1.375 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03296**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 230,00 cm	Y 410,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

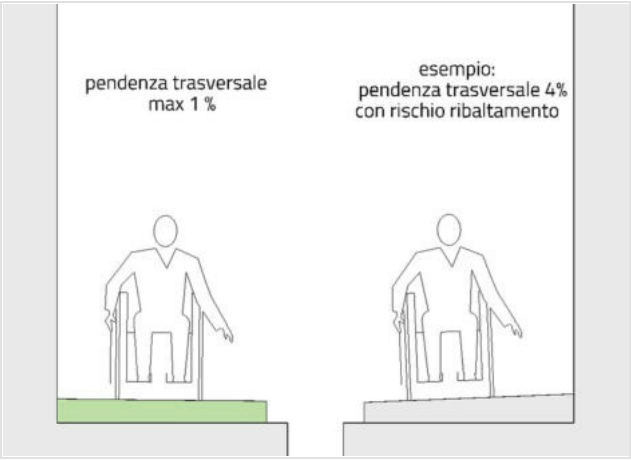

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.243 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 206, Udine	2	E 00FF5-03297

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	9	≤ 15%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 120,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 12 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03299	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 208, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

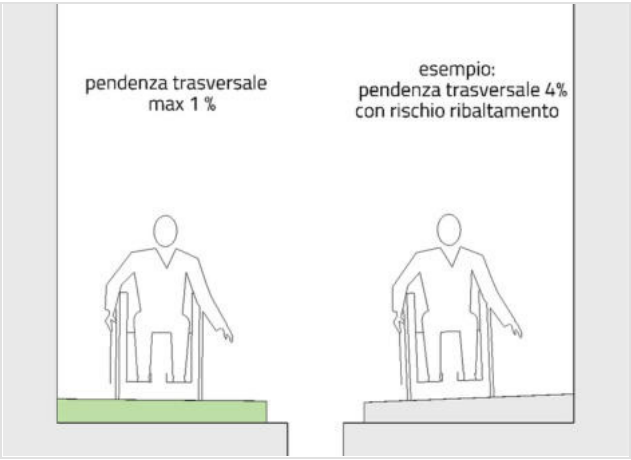

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%. Eliminazione quindi del tratto di percorso e realizzazione di pavimentazione a livello della sede stradale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

766 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 208, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03299

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	14	≤ 15%
Dimensioni	X 186,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03297	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 206, Udine	**766 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

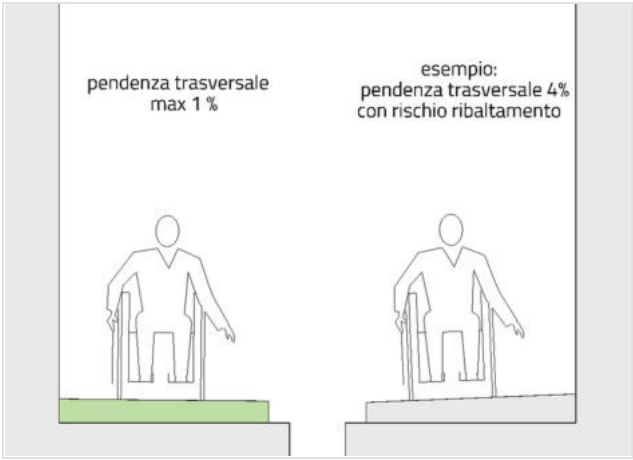

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03297.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03300**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

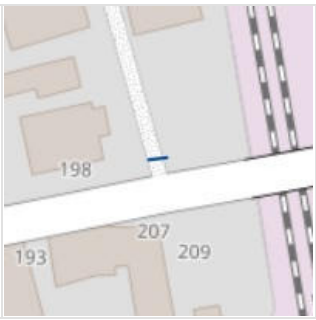

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 420,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

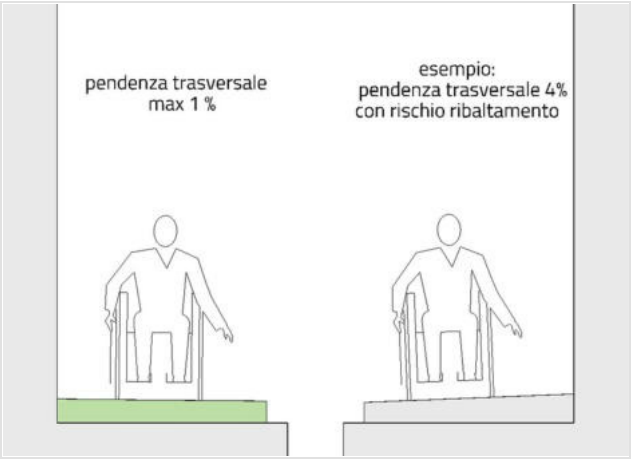

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.771 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 198, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03302**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PROTEZIONE

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1400,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
Assenza di guida naturale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

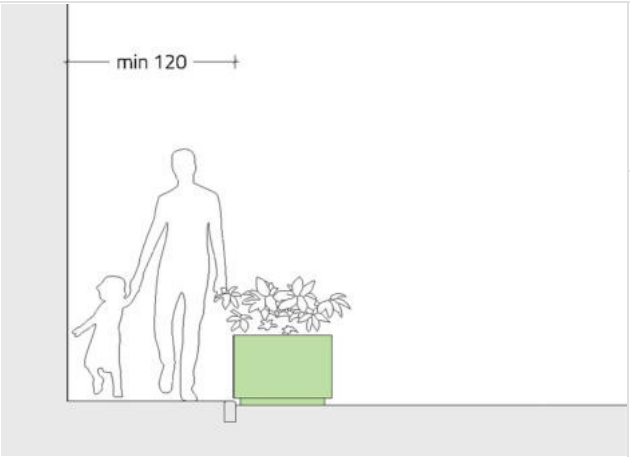

P1198 (modificato)
Posa di arredo urbano lungo il dislivello longitudinale a protezione del percorso

Posizionamento di fioriera o di arredo urbano che costituisca sia guida naturale che protezione per il tratto di percorso analizzato.

STIMA DEL COSTO
Posa di arredo urbano

1.750 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 196, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03303**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 165,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03304	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03305	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03306	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03307	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03308	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 190, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1735 (modificato)
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento del tratto di percorso che include i due passi carrai. Realizzazione di una rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Eliminazione del tratto in risalto in mezzo agli accessi carrai per rendere quell'area in piano a livello con la sede stradale e realizzazione di un'ulteriore rampa con pendenza massima del 5% alla fine degli accessi carrai, che si congiungerà con il nuovo marciapiede tramite un'altra rampa (al momento non esistente).

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

19.044 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 196, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03304**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 165,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03303	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato **19044 €**
E 00FF5-03305	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03306	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03307	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03308	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 190, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03303.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 196, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03305**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 80,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03303	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato **19044 €**
E 00FF5-03304	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03306	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03307	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03308	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 190, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03303.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 196, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03306**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	13	≤ 15%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 130,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03303	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato **19044 €**
E 00FF5-03304	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03305	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03307	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03308	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 190, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03303.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 196, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03307**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 2850,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03303	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato **19044 €**
E 00FF5-03308	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 190, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03306	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03305	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03304	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1749 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03303.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 190, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03308

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 120,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 14 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03303	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato **19044 €**
E 00FF5-03307	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03306	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03305	LIV. 1	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03304	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 196, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03303.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 190, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03309**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 3600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

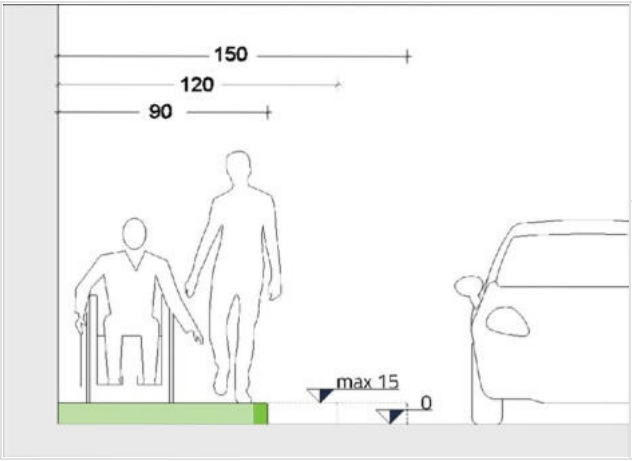

PS1847
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **12.494 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 182, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03310**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 65 cm. Larghezza totale del marciapiede di 75 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

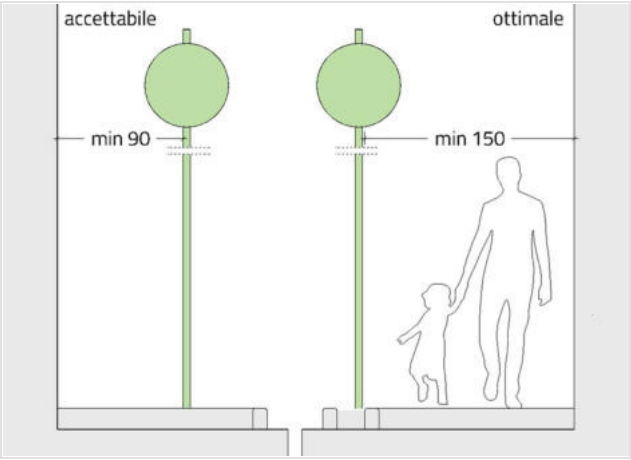

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 182, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03311**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 1000,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

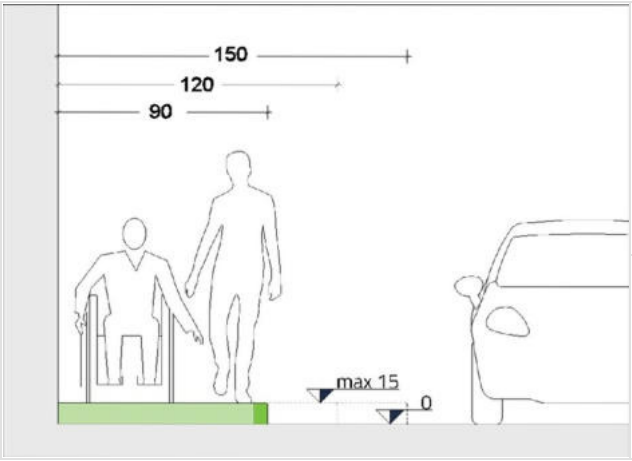

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Si suggerire di prestare attenzioni agli accessi carrai in questo tratto di marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede

4.009 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 180, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03312**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 98,00 cm	Y 2500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

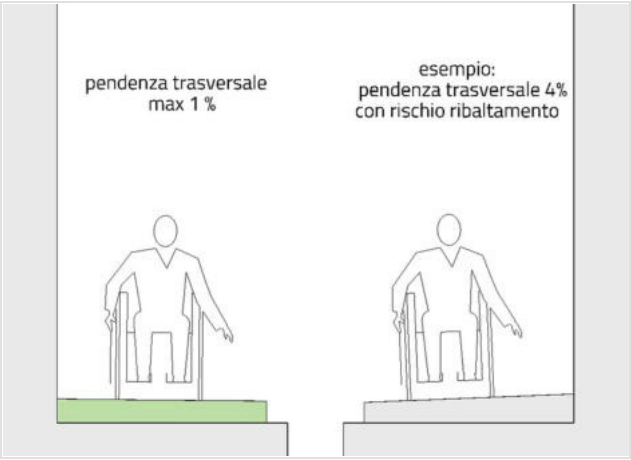

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

3.962 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 180, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03313

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X --	Y 2500,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

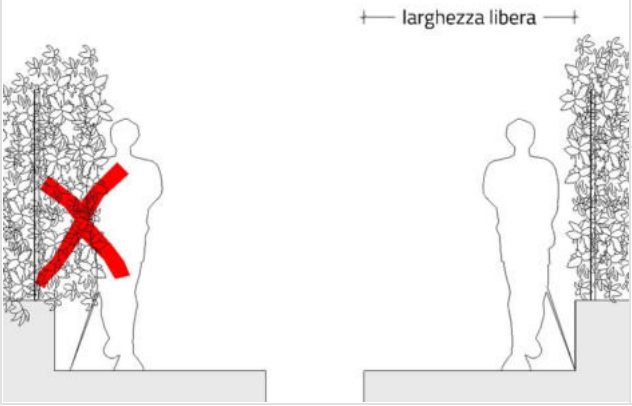

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

411 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 176, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03314

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 65 cm. Larghezza totale del marciapiede di 90 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

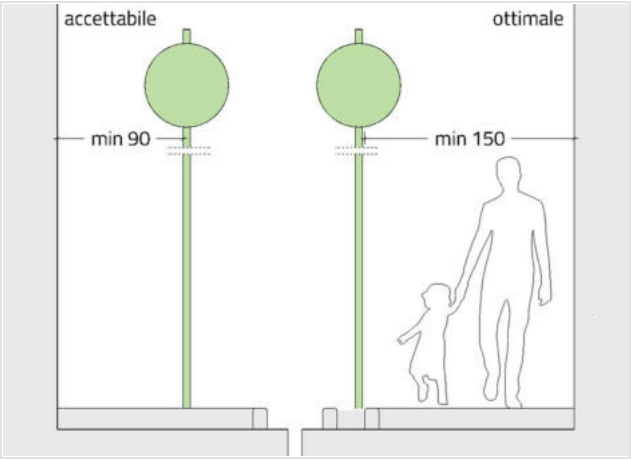

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 174, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03315**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 240,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03316	LIV. **2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 166, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

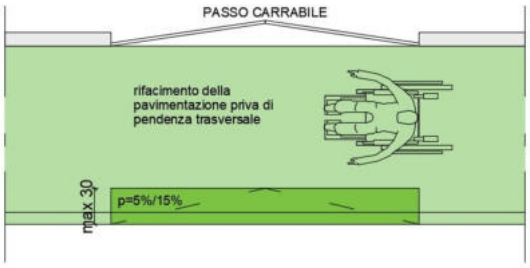

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.911 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 166, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03316**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 160,00 cm	Y 12,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Sconnessioni con crescita di vegetazione spontanea.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03315	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 174, Udine	**3911 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

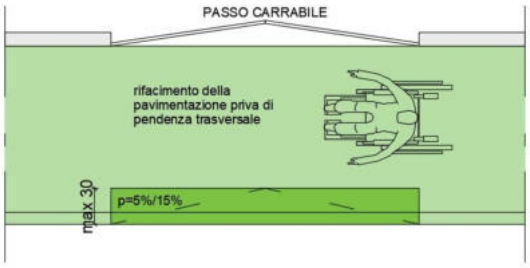

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03315.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 172, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03317**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 310,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

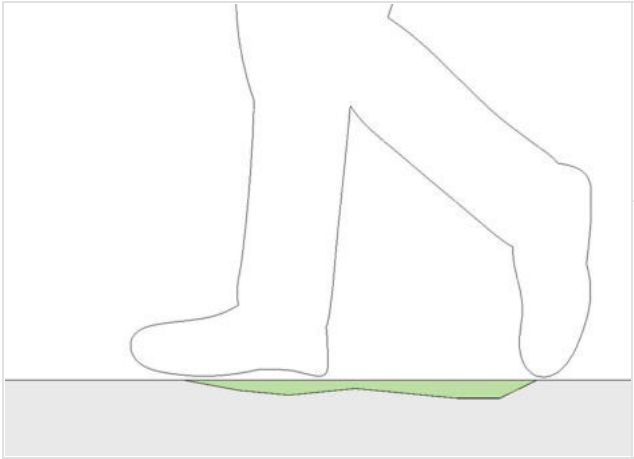

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **231 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 172, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03318**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 180 cm. Larghezza totale del marciapiede di 203 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

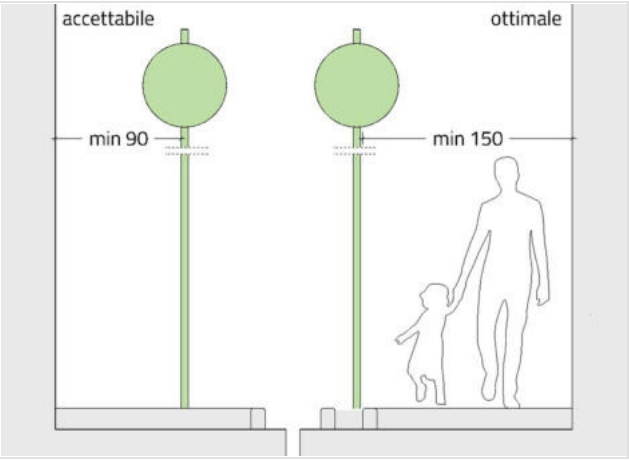

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 172, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03319**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

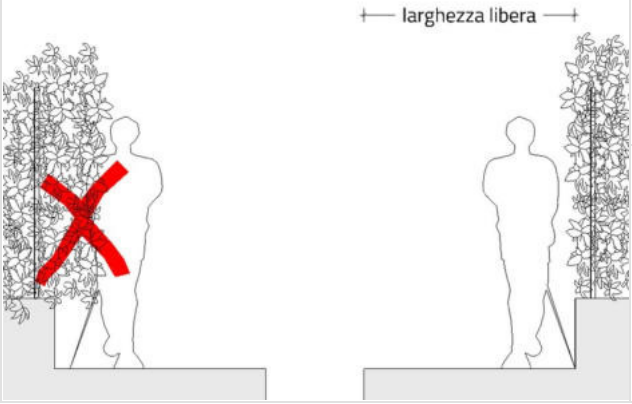

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

49 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 140, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03320**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

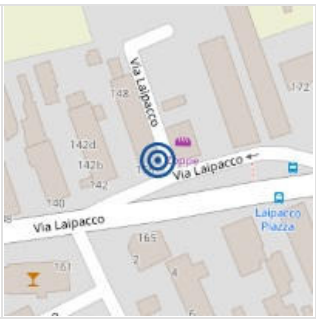

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 12,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 108 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

P0656
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **208 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 140, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03321**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

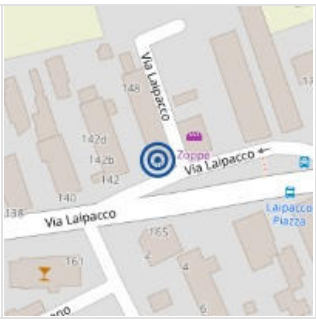

Manufatto edilizio o tecnologico sporgente	Si	
Dimensioni	X 12,00 cm	Y 100,00 cm
Materiale	Pietra	

Note relative al rilievo
Altezza libera da terra di 108 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS2009
Interlocuzione con soggetto terzo interessato per la risoluzione della criticità

Concordare con il proprietario la modalità di eliminazione dell'ostacolo e l'eventuale ricostruzione di un elemento con analoga funzione nella tutela del transito in area pubblica.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione dell'ostacolo **208 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 140, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03322**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 340,00 cm	Y 500,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

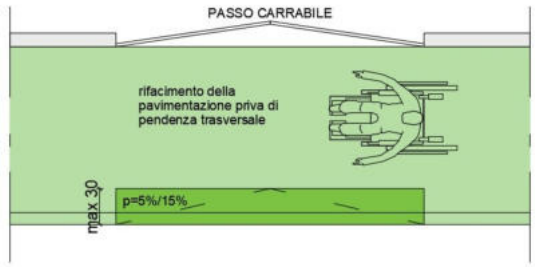

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

3.658 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 136, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03323**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Cantiere	Si	
Dimensioni	X --	Y 500,00 cm
Materiale	Legno	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Criticità non risolvibile

Criticità attualmente non risolvibile.

STIMA DEL COSTO
Criticità non risolvibile

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 136, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03324**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

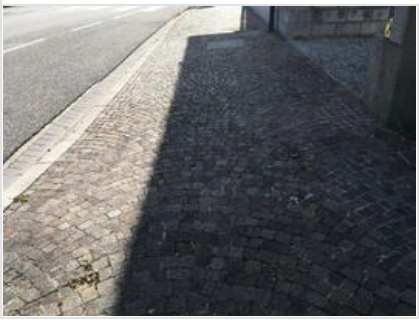

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 260,00 cm	Y 660,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03325	**2**	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 134, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

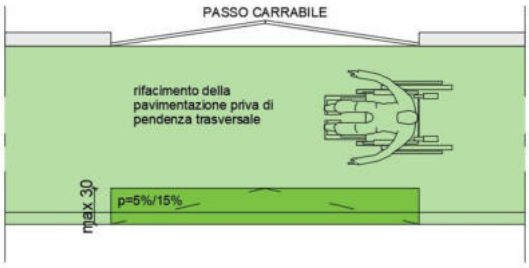

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e realizzazione di rampa carrabile

4.508 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 134, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03325**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 180,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03324	LIV. **2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 136, Udine	Costo stimato **4508 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

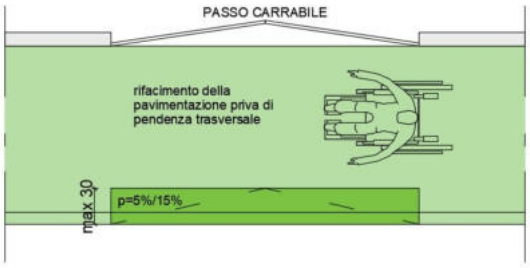

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03324.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 134, Udine	1	E 00FF5-03326

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

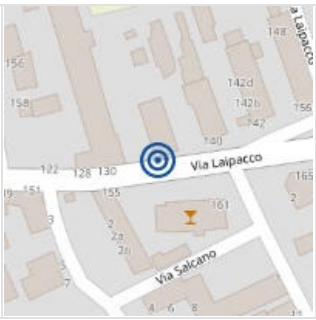

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 190,00 cm	Y 340,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03457	1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 134, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

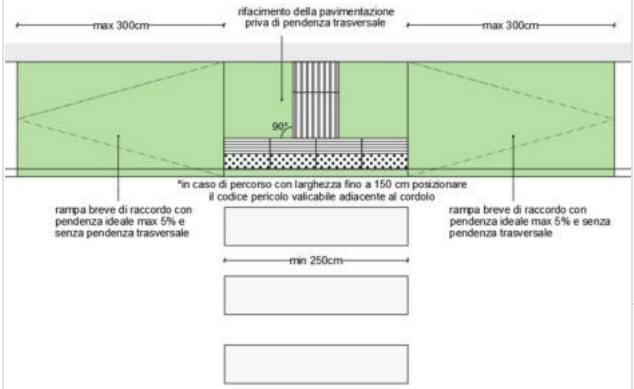

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali, posa di segnaletica tattilo-plantare

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

4.242 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 128, Udine	2	E 00FF5-03328

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

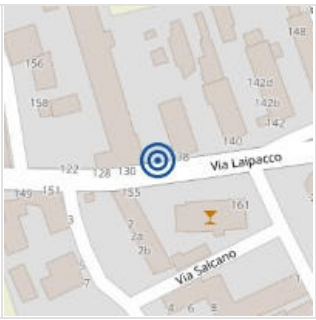

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 165,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03329	2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 128, Udine	--
E 00FF5-03330	2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	--
E 00FF5-03331	2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 128, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

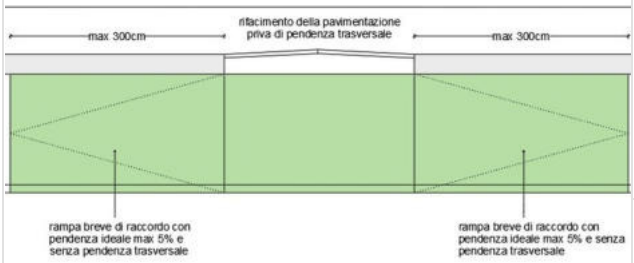

PS1923
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

4.950 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03329**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	11	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 320,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03328	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato **4950 €**
E 00FF5-03331	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03330	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

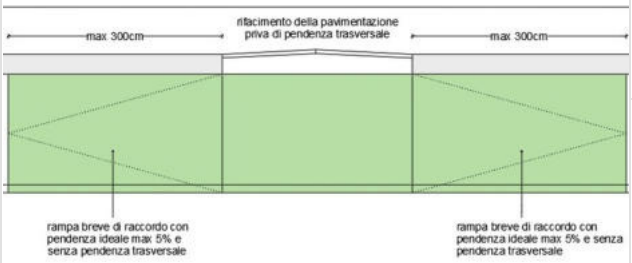

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03328.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03330**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

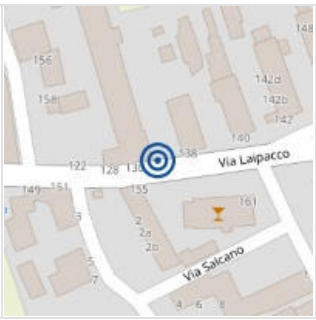

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 150,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03328	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato **4950 €**
E 00FF5-03331	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03329	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

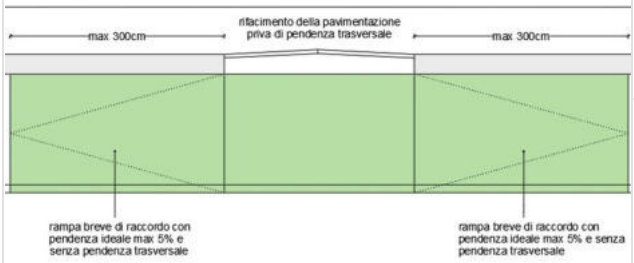

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03328.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 128, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03331**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

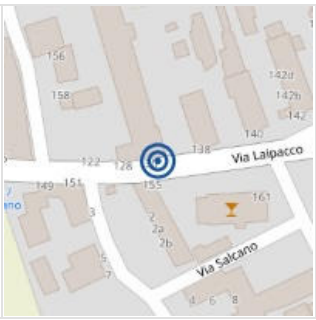

Sconnessioni	Si
Dimensioni	X 130,00 cm Y 80,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03328	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato **4950 €**
E 00FF5-03330	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03329	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 128, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

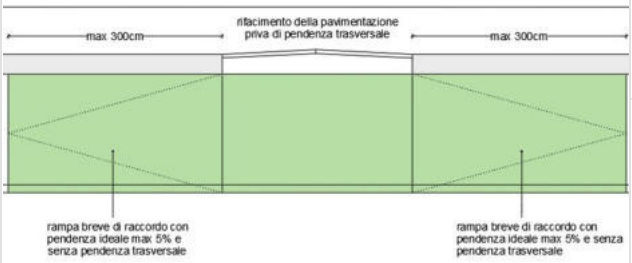

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03328.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 122, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03332**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	75	≥ 90cm
Dimensioni	X 75,00 cm	Y 1250,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

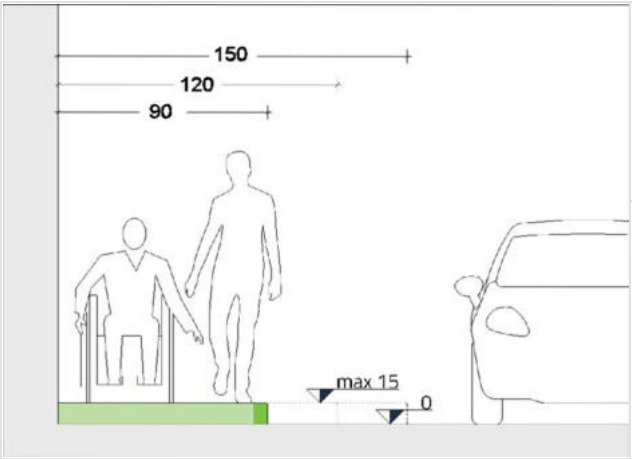

PS1847 (modificato)
Allargamento del marciapiede

Allargamento del tratto di marciapiede troppo stretto. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede

5.241 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 122, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03333

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 630,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03334	LIV. 2	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

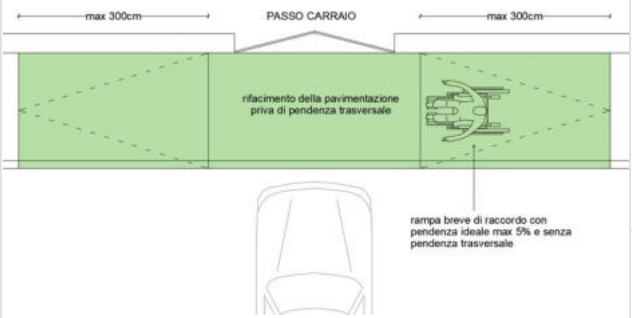

PS1843 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Allargamento del tratto di marciapiede troppo stretto.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.775 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03334**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	68	≥ 90cm
Dimensioni	X 68,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03333	**2**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 122, Udine	**5775 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

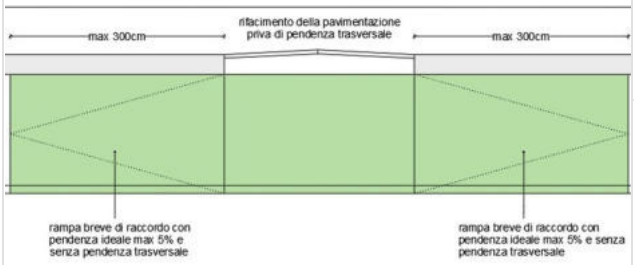

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03333.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 122, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03335

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 22 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 70 cm. Larghezza totale del marciapiede di 95 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

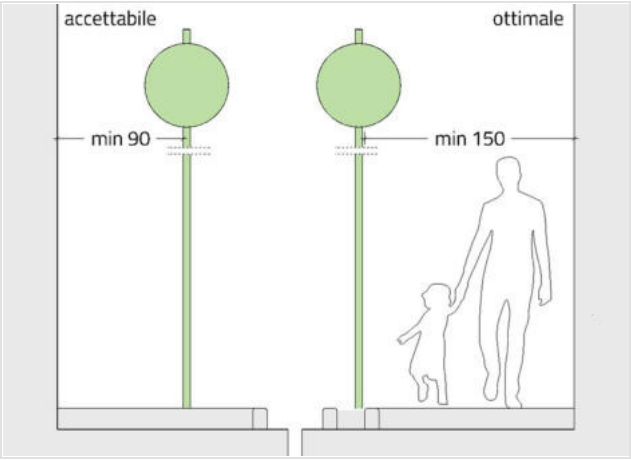

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Laipacco 122, Udine	2	E 00FF5-03336

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	6	≤ 1%
Dimensioni	X 103,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

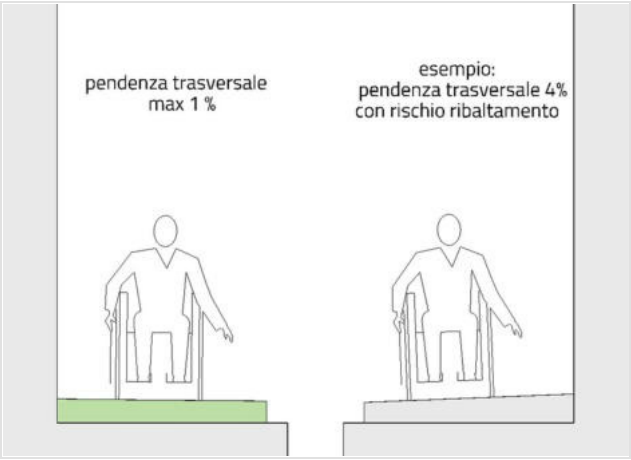

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.314 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 122, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03337

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 103,00 cm	Y 240,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03338	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03339	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

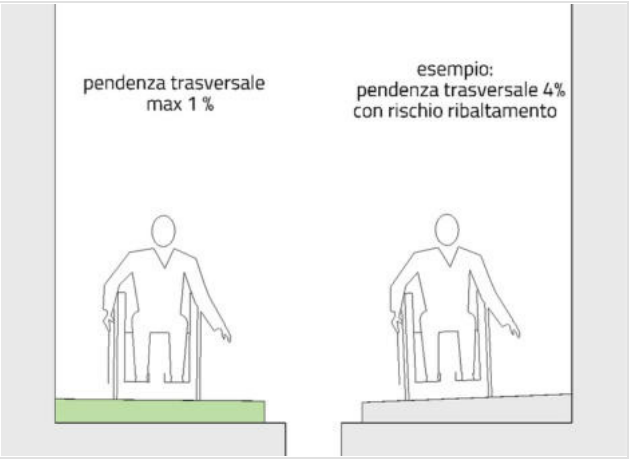

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

4.151 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 122, Udine

LIV. di priorità **2**

ID Scheda
E 00FF5-03338

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03337	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato **4151 €**
E 00FF5-03339	LIV. 2	**Sconnessioni Pavimentazione** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

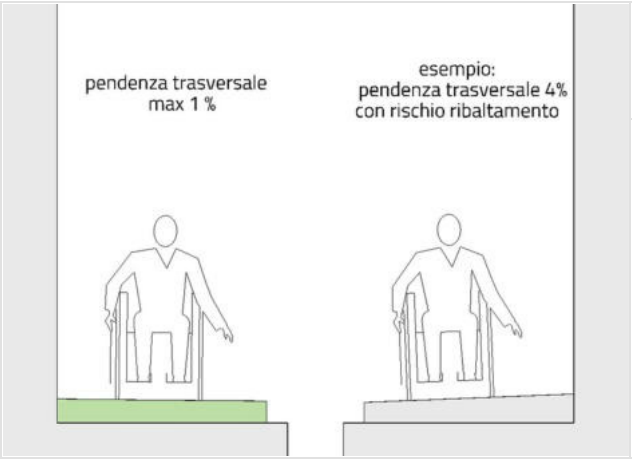

PS1702 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03337.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 122, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03339**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 100,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03337	LIV. 2	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato **4151 €**
E 00FF5-03338	LIV. 2	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 122, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

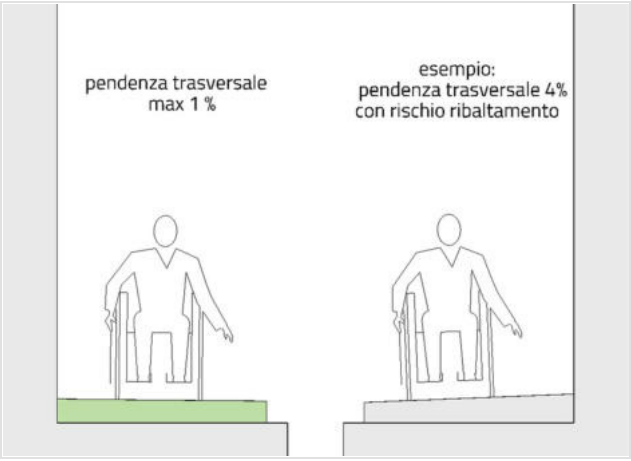

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03337.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 122, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03340**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 10 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 117 cm. Larghezza totale del marciapiede di 129 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

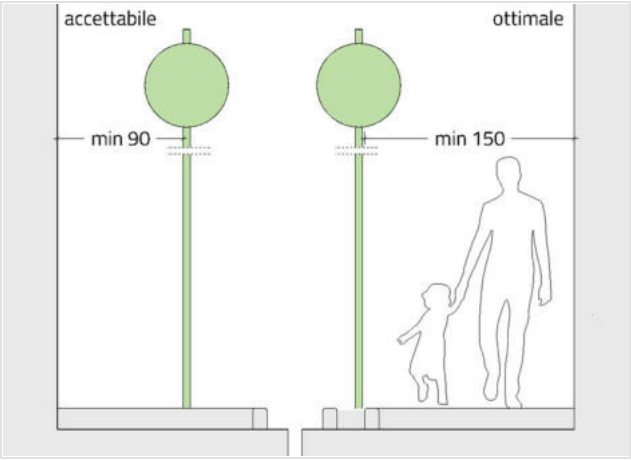

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 118, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03345**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	6	≤ 15%
Dimensioni	X 101,00 cm	Y 160,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 11 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

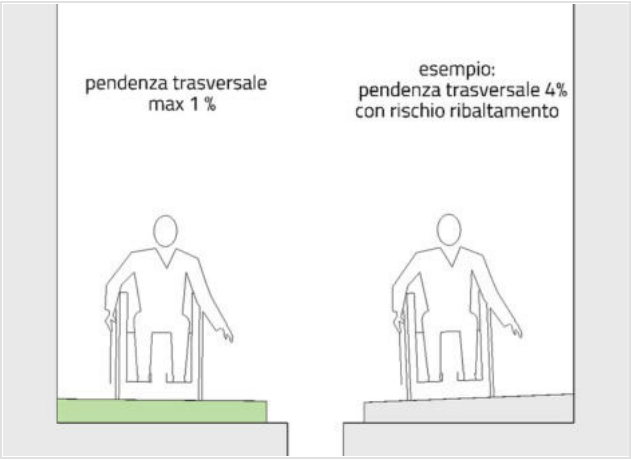

(modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

297 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 118, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03346**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza trasversale	2	0%
Dimensioni	X 101,00 cm	Y 1170,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

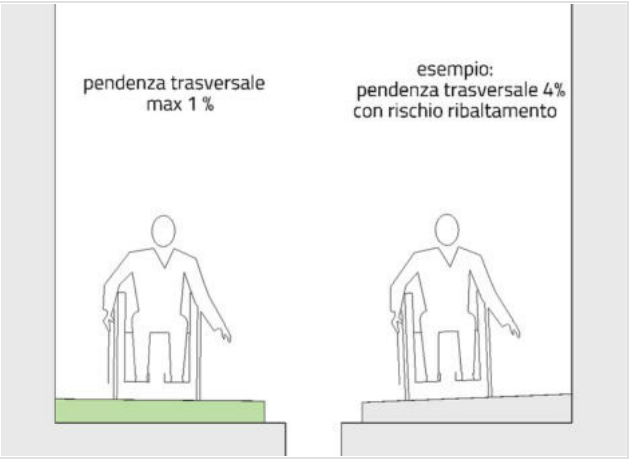

P0692 (modificato)
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.452 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 118, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03347

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 13 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 95 cm. Larghezza totale del marciapiede di 111 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

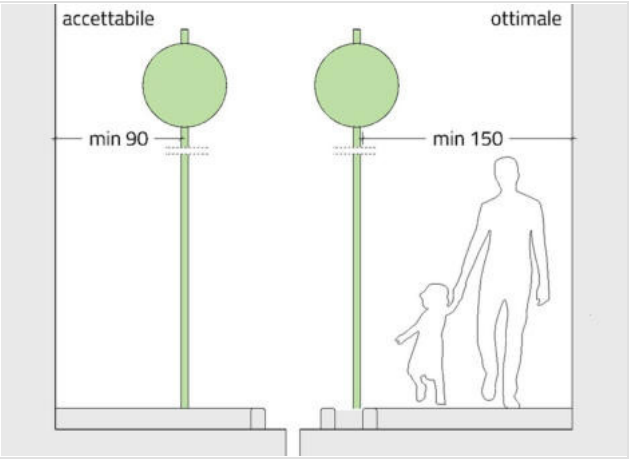

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 118, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03348**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 111,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

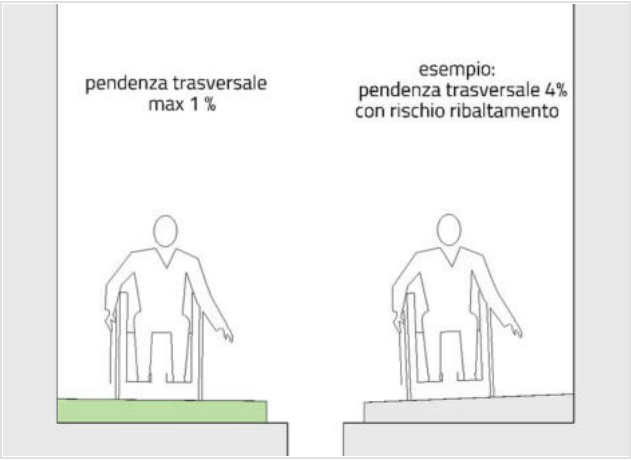

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.014 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 118, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03349**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	3	≤ 1%
Dimensioni	X 138,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

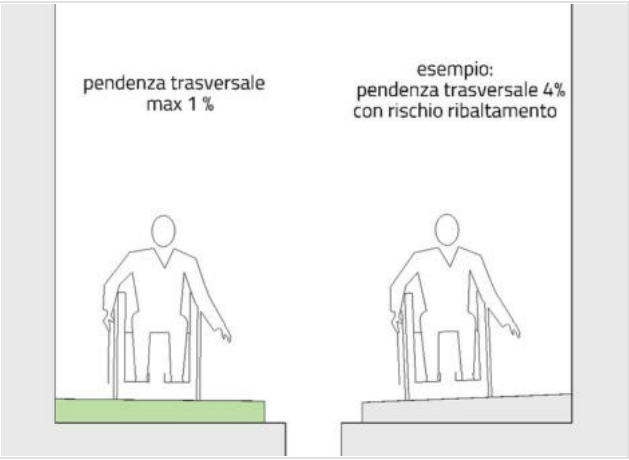

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

1.893 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03350**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 300,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03351	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03352	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03353	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

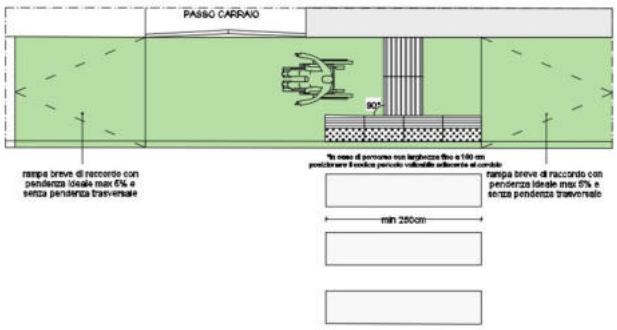

(modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale, posa di segnaletica tattilo plantare

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute a passo carraio e all'attraversamento pedonale mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e "pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio e all'attraversamento pedonale e posa di segnaletica tattilo plantare

5.031 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03351**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 138,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03350	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato **5031 €**
E 00FF5-03353	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03352	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

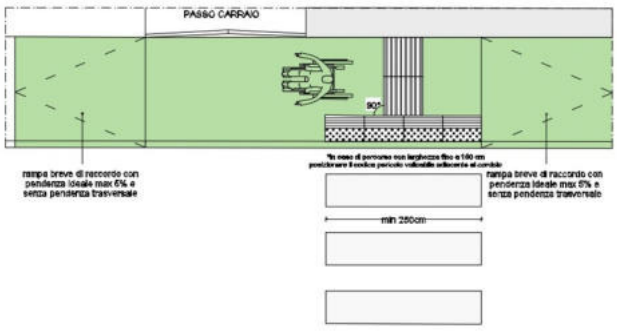

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03350.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03352**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 180,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03350	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato **5031 €**
E 00FF5-03353	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03351	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

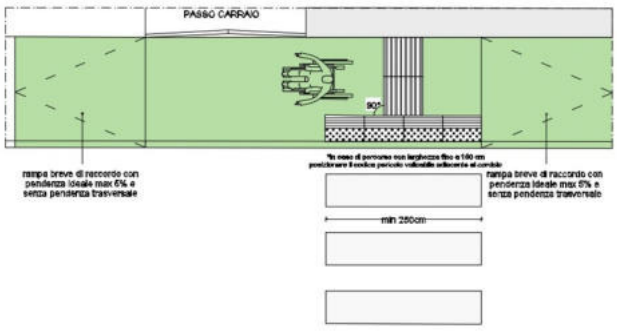

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03350.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03353**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	7	≤ 15%
Dimensioni	X 153,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Dislivello di 8 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03350	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato **5031 €**
E 00FF5-03352	LIV. **1**	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato **--**
E 00FF5-03351	LIV. **1**	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 114, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

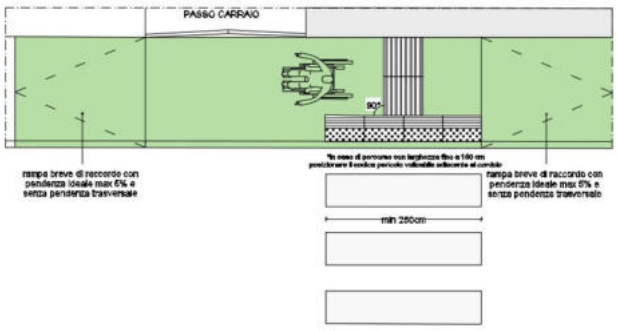

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03350.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03354**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 161,00 cm	Y 590,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

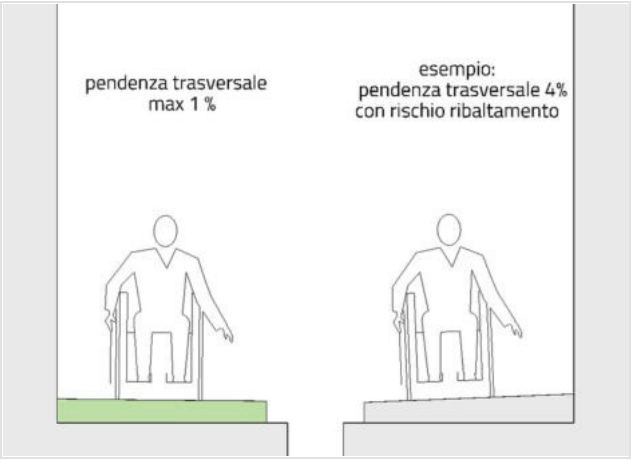

PS1702
Demolizione del marciapiede e ricostruzione

Rifacimento della pavimentazione del percorso o del marciapiede in materiale analogo all'esistente al fine di ottenere una pendenza trasversale costante max 1%, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

951 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03355**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 50,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

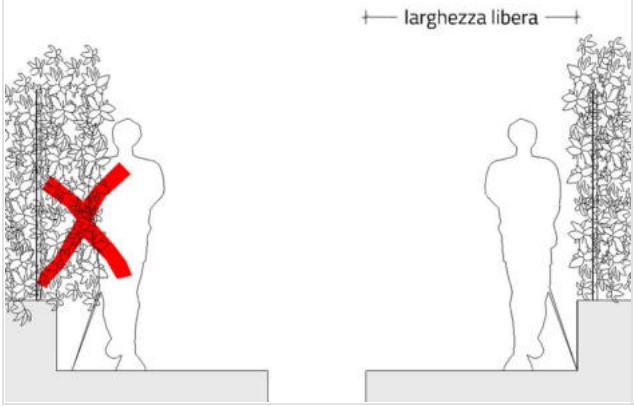

PS1963
Potatura della vegetazione

Potatura della vegetazione che valica l'area di pertinenza degli edifici, pubblici o privati, invadendo il percorso pedonale. Si suggerisce l'attivazione di una procedura di monitoraggio periodico con comunicazione al proprietario per sollecitare l'esecuzione dell'intervento.

STIMA DEL COSTO
Potatura della vegetazione

156 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 114, Udine

LIV. di priorità
3

ID Scheda
E 00FF5-03356

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 8 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 149 cm. Larghezza totale del marciapiede di 163 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

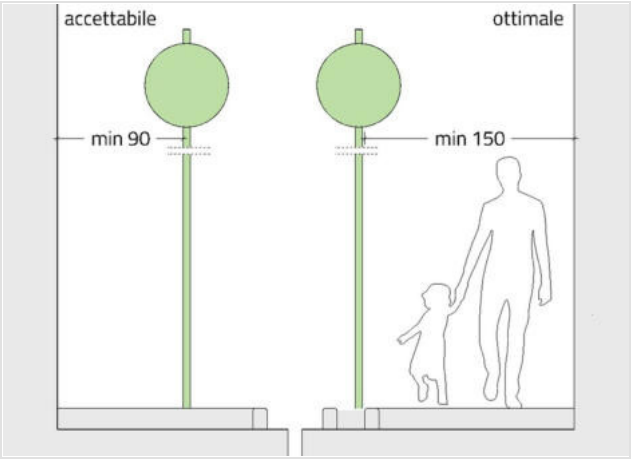

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 114, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03357**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | FERMATA TRASPORTO PUBBLICO | ARREDO URBANO

Assenza protezione agenti atmosferici	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Fermata priva di pensilina, segnaletica tattilo plantare e panchina con braccioli e schienale.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

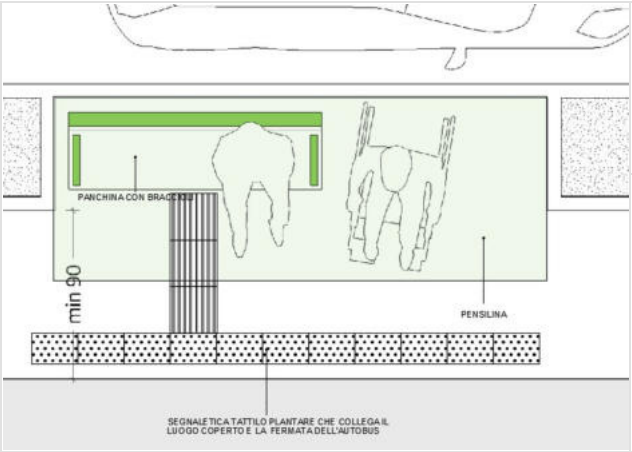

PS1751
Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus

Adeguamento della banchina di fermata dell'autobus con posa di segnaletica tattilo-plantare secondo le indicazioni di Abaco, posizionamento di pensilina e panchina con schienale e braccioli.

STIMA DEL COSTO
Adeguamento della fermata TPL

11.015 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03360**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	71	≥ 90cm
Dimensioni	X 71,00 cm	Y 1350,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

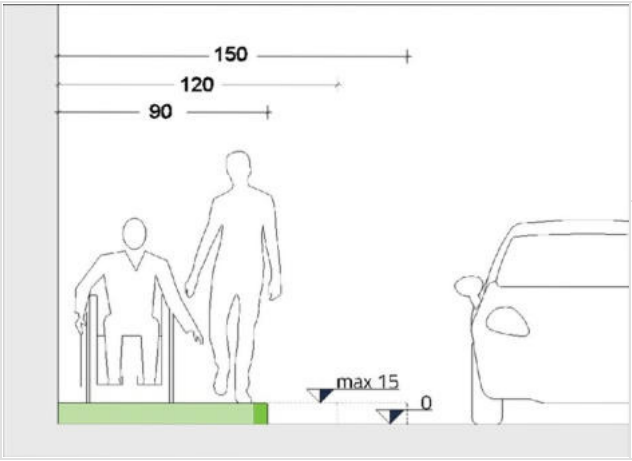

PS1847
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **5.632 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 106, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03361

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	3.5	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 71,00 cm	Y --
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03359	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Vicolo della Chiesa, Udine	29194 €

IPOTESI DI SOLUZIONE

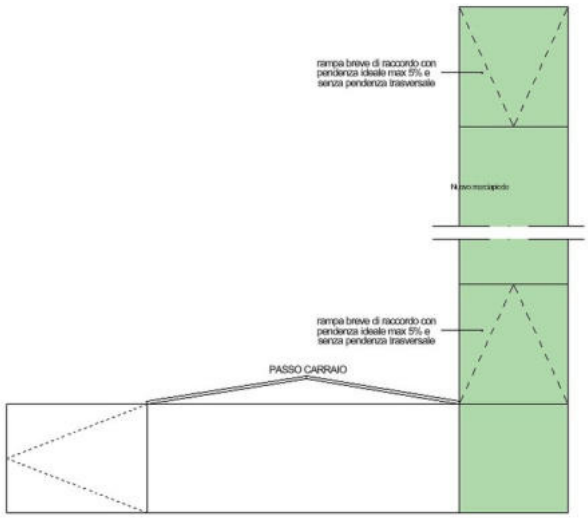

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03359.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03362**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **RAMPA BREVE DI RACCORDO**

Pendenza longitudinale	11	≤ 15%
Dimensioni	X 71,00 cm	Y 72,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

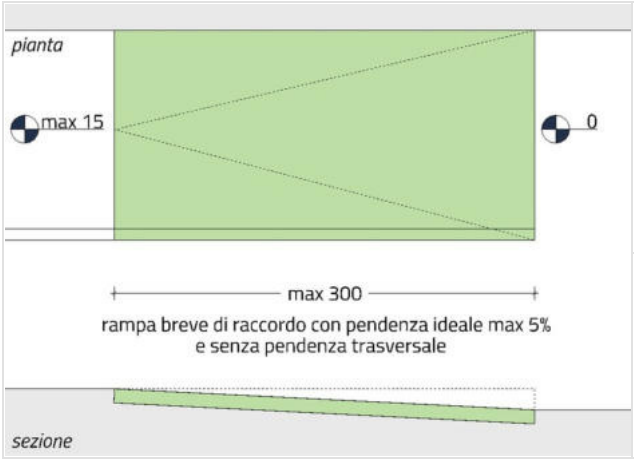

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.170 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03363**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	4	≤ 1%
Dimensioni	X 280,00 cm	Y 690,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

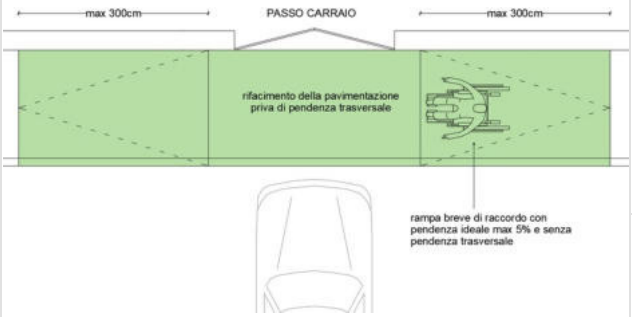

PS1843
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante allineamento in piano dell'area carrabile alla quota stradale e realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

6.498 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Laipacco 106, Udine	1	E 00FF5-03364

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	70	≥ 90cm
Dimensioni	X 70,00 cm	Y 450,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

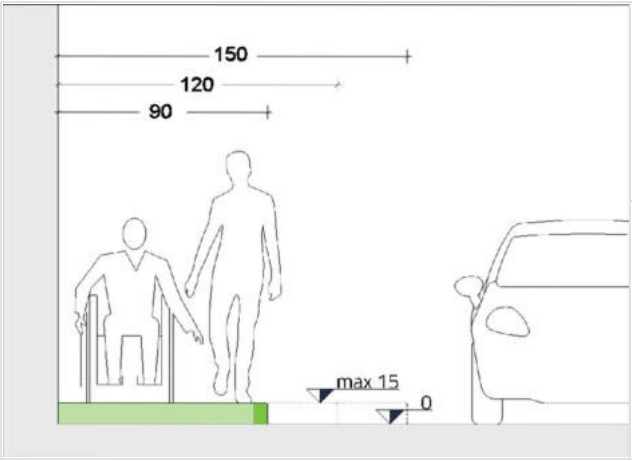

PS1847
Allargamento del marciapiede

Allargamento del marciapiede, in materiale analogo all'esistente. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Eventuali rampe di raccordo alla sede stradale per passo carraio o attraversamento devono essere conformi alle prescrizioni dell'Abaco.

STIMA DEL COSTO
Allargamento del marciapiede **1.776 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03365**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	9	≤ 1%
Dimensioni	X 90,00 cm	Y 950,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

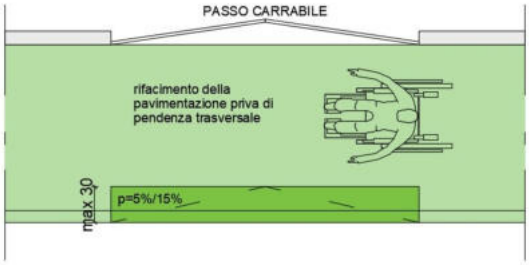

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

3.002 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 100, Udine

LIV. di priorità
2

ID Scheda
E 00FF5-03366

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	5	≤ 1%
Dimensioni	X 168,00 cm	Y 1240,00 cm
Materiale	Pietra a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

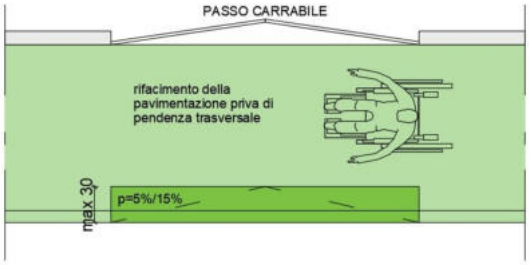

PS1823
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale. Realizzazione lungo la carreggiata di rampa carrabile in cls con larghezza max 30 cm, incluse demolizioni e ripristini. Compreso raccordo con altri livelli.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con pendenze dovute al passo carraio

5.758 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 100, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03367**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	8	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

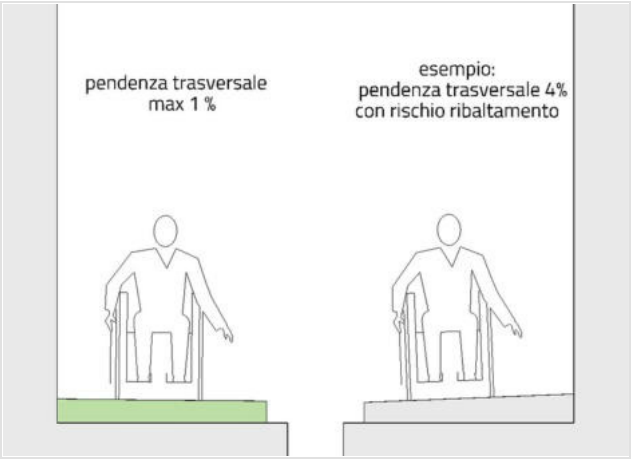

PS1702 (modificato)
Rifacimento in piano del tratto di percorso con pendenze

Rifacimento del tratto di percorso con pendenze mediante realizzazione di marciapiede in continuità con i tratti adiacenti ed in medesimo materiale, con pendenza trasversale max 1%.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso con riduzione della pendenza

2.240 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 100, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03368**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | ARREDO URBANO

Assenza	Si	
Dimensioni	X --	Y 1260,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

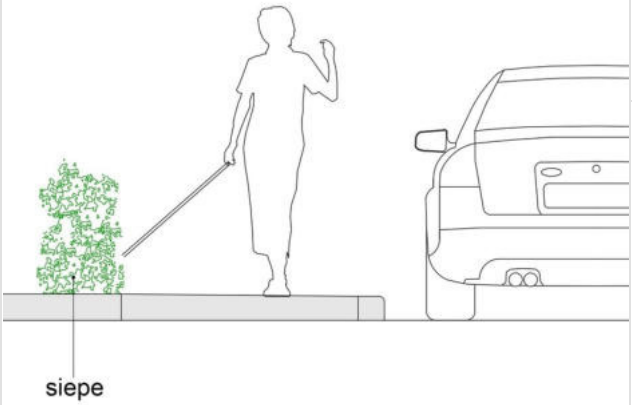

PS1806
Realizzazione di guida naturale

Realizzazione di guida naturale tramite piantumazione di siepe di altezza minima 40 cm.

STIMA DEL COSTO
Piantumazione di siepe

1.452 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03369**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 82,00 cm	Y 76,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

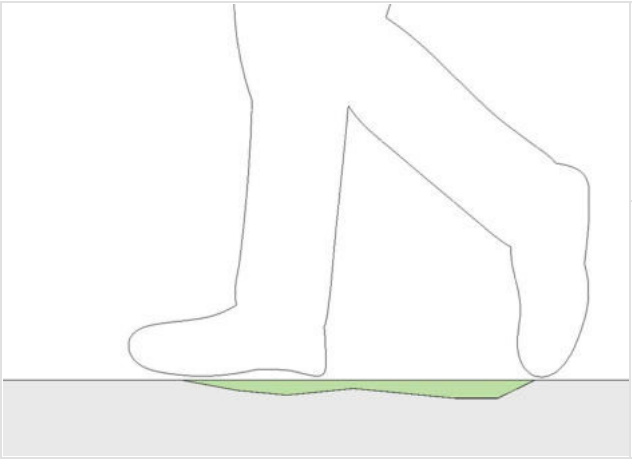

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Riparazione puntuale della pavimentazione **99 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03370**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 250,00 cm	Y 162,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03371	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03372	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

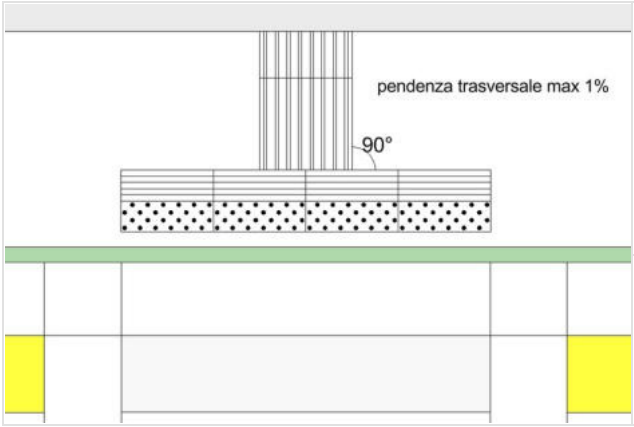

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Ricostruzione del tratto di pavimentazione fra il dosso e il marciapiede, con riempimento in materiale analogo per eliminare l'incasso creato dai dislivelli.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **492 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03371**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	11	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03370	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato **492 €**
E 00FF5-03372	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

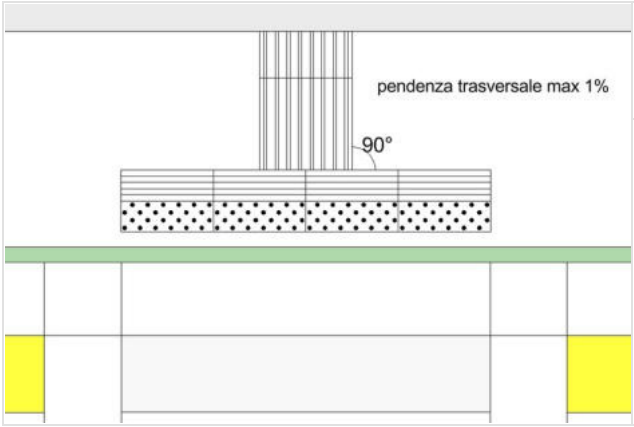

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03372**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | DISLIVELLO

Altezza	10	≤ 2,5 cm
Dimensioni	X 250,00 cm	Y --
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03370	LIV. 1	**Assenza Segnaletica tattilo plantare** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato **492 €**
E 00FF5-03371	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato **--**

IPOTESI DI SOLUZIONE

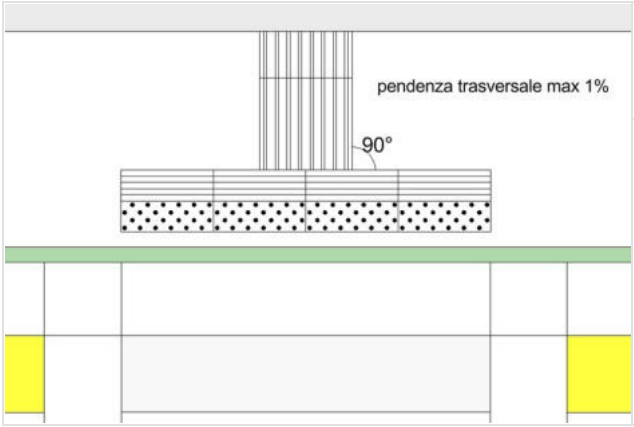

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03370.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03373**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA TATTILO PLANTARE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 260,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

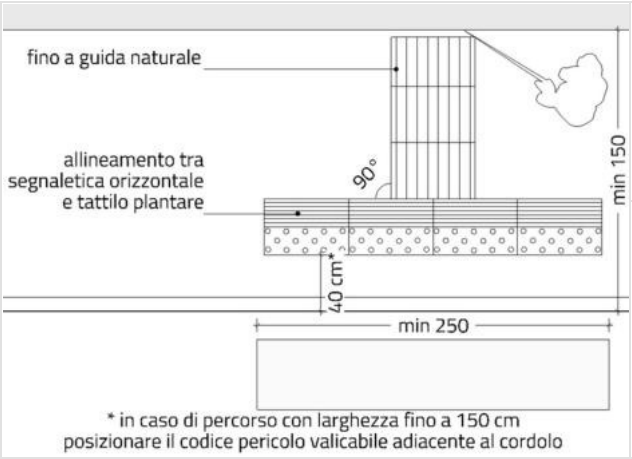

PS1850 (modificato)
Posa di segnaletica tattilo-plantare

Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Posa di segnaletica tattilo-plantare **527 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03374**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Non ortogonale	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03376	LIV. **1**	**Assenza contrasto cromatico Segnaletica orizzontale** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

(modificato)
Rifacimento della segnaletica orizzontale

Sistemazione dell'attraversamento pedonale mediante rifacimento della segnaletica orizzontale in posizione ortogonale alla sede stradale.

STIMA DEL COSTO
Sistemazione della segnaletica orizzontale dell'attraversamento pedonale

136 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03375**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Lunghezza	12	≤ 8 m
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale, posa di segnaletica tattilo-plantare

Realizzazione di un prolungamento del percorso pedonale, con contestuale riduzione della lunghezza dell'attraversamento pedonale. Posa di moduli tattilo-plantari tipo codice "direzione rettilinea" e “pericolo valicabile" realizzati in materiale idoneo al contesto e a contrasto cromatico rispetto alla pavimentazione, posati a raso e senza discontinuità rispetto alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di prolungamento del percorso pedonale e posa di segnaletica tattilo-plantare

1.788 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 106, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03376**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | SEGNALETICA ORIZZONTALE

Assenza contrasto cromatico	Si	
Dimensioni	X 270,00 cm	Y 1200,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03374	LIV. **1**	**Non ortogonale Attraversamento pedonale** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato **136 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1690 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03374.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130** Data Rilievo **01 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Laipacco 208, Udine**	LIV. di priorità **2**	ID Scheda **E 00FF5-03456**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | RAMPA BREVE DI RACCORDO

Pendenza longitudinale	12	≤ 15%
Dimensioni	X 170,00 cm	Y 110,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

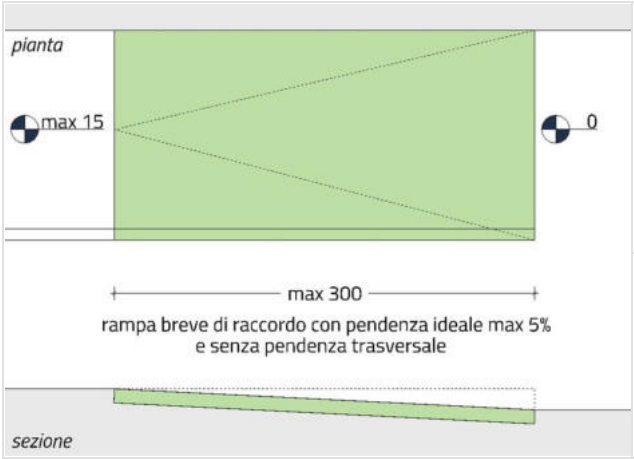

PS1735
Demolizione della rampa breve di raccordo con pendenza elevata e sua ricostruzione

Rifacimento della rampa di raccordo in materiale analogo all'esistente con riduzione della pendenza longitudinale in base alle caratteristiche del contesto, da collegare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale.

STIMA DEL COSTO
Demolizione di rampa breve di raccordo con pendenza eccessiva e sua ricostruzione

1.825 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Laipacco

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **01 Settembre 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Laipacco 134, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03457

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE | **SEGNALETICA TATTILO PLANTARE**

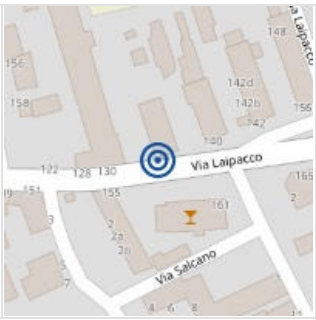

Assenza	Si	
Dimensioni	X 300,00 cm	Y 190,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03326	LIV. 1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Laipacco 134, Udine	Costo stimato **4242 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

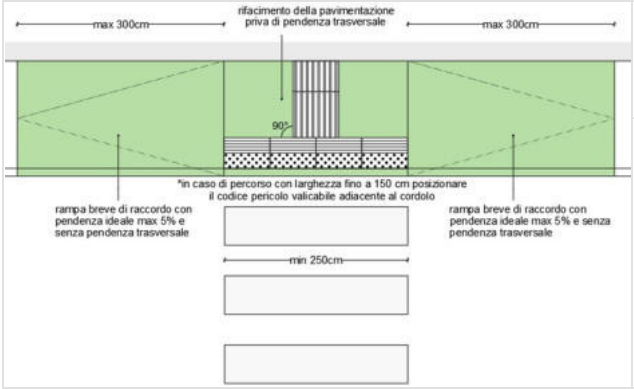

PS1669 (modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03326.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Salcano 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03196**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	53	≥ 90cm
Dimensioni	X 53,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03191	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato **7276 €**
E 00FF5-03192	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03193	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03194	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03464	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03191.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Salcano 2, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03197

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 460,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 460 cm. Larghezza del marciapiede di 80 cm. Dislivello di 4 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03203	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato 6390 €
E 00FF5-03198	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03206	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03205	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03204	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata
0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Salcano 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03198**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Larghezza	80	≥ 90cm
Dimensioni	X 80,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03203	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato **6390 €**
E 00FF5-03197	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Salcano 2, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03206	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03205	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03204	LIV. 1	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 155, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03203.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Salcano 2, Udine	1	E 00FF5-03199

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | **OSTACOLO VERTICALE**

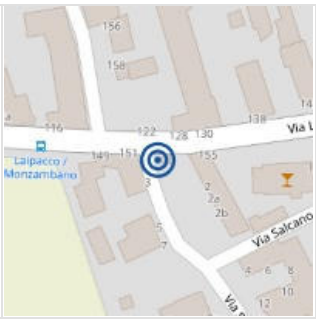

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 15 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 65 cm. Larghezza totale del marciapiede di 80 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

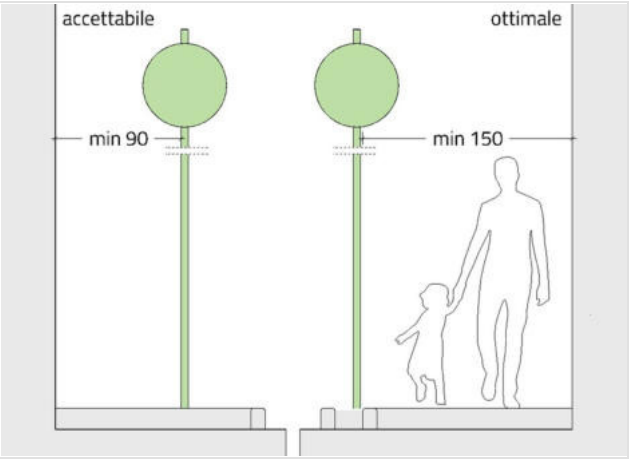

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Salcano 2, Udine	1	E 00FF5-03200

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

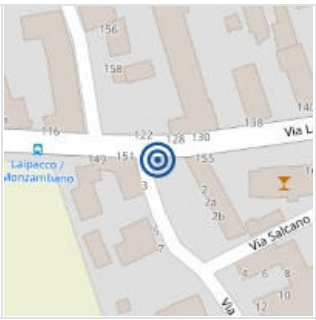

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 60 cm. Larghezza totale del marciapiede di 85 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

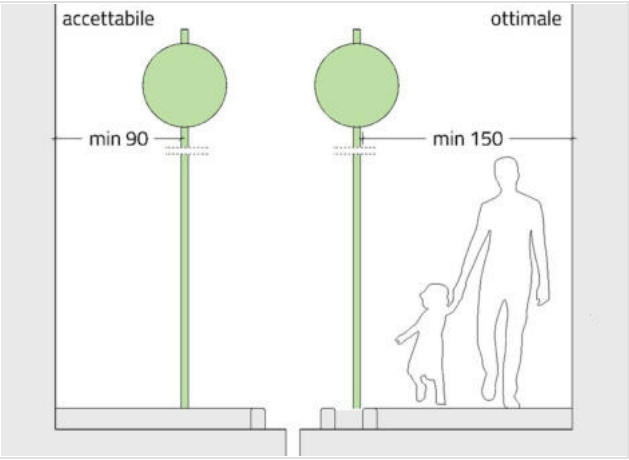

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **07 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Salcano 2, Udine	1	E 00FF5-03201

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

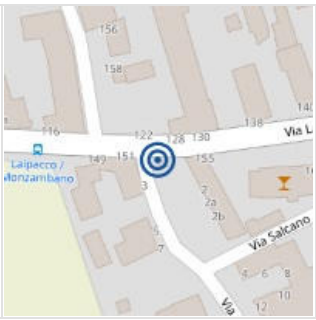

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 20 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 60 cm. Larghezza totale del marciapiede di 82 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

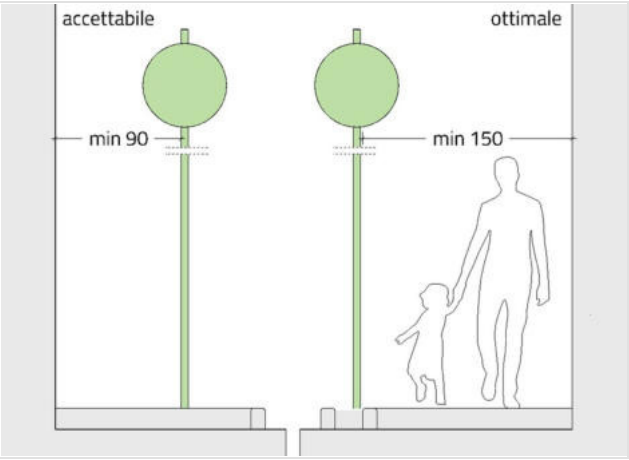

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **07 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Salcano 2, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03202

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

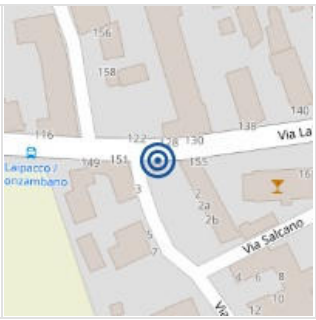

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 19 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 55 cm. Larghezza totale del marciapiede di 75 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

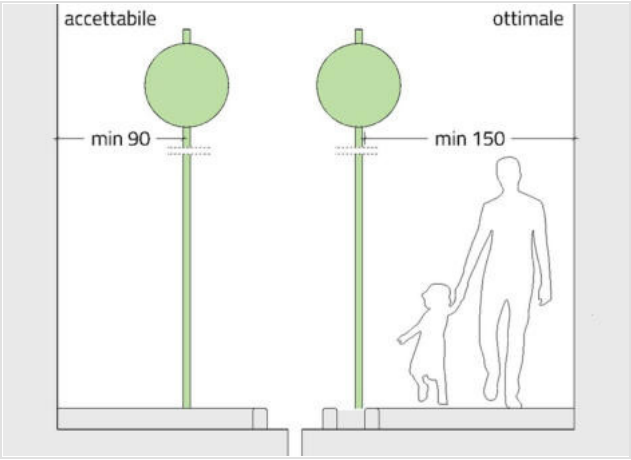

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

182 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Salcano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Settembre 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Salcano 3, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03464**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y --
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03191	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato **7276 €**
E 00FF5-03192	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03193	LIV. 1	**Palo segnaletica Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03194	LIV. 1	**Manufatto edilizio o tecnologico sporgente Ostacolo verticale** Via Laipacco 149, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03196	LIV. 1	**Larghezza Percorso pedonale** Via Salcano 3, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE



(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03191.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Idria

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Idria, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03217**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale in assenza di marciapiede 640 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03215	**1**	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 161, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1889 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di porzione di marciapiede in piano e rampa longitudinale con pendenza massima del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03218)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.130 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Idria

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Idria, Udine	1	E 00FF5-03218

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 640,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale in assenza di marciapiede 640 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS2061 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Realizzazione di porzione di marciapiede in piano e rampa longitudinale con pendenza massima del 5%. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della strada ID Scheda 00FF5-03217)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.307 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lonzano 1, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03245**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Vegetazione	Si	
Dimensioni	X 140,00 cm	Y 350,00 cm
Materiale	--	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

PS1972
Eliminazione della vegetazione

Eliminazione della vegetazione spontanea e costante manutenzione con diserbante da parte dell'ente proprietario del marciapiede.

STIMA DEL COSTO
Eliminazione della vegetazione

12 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **08 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025

Indirizzo
Via Lonzano 1, Udine

LIV. di priorità **1**

ID Scheda
E 00FF5-03247

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Pendenza trasversale	7	≤ 1%
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 490,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03249	LIV. 1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Lonzano 1, Udine	Costo stimato **4495 €**
E 00FF5-03248	LIV. 1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	Costo stimato --
E 00FF5-03244	LIV. 1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 185, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

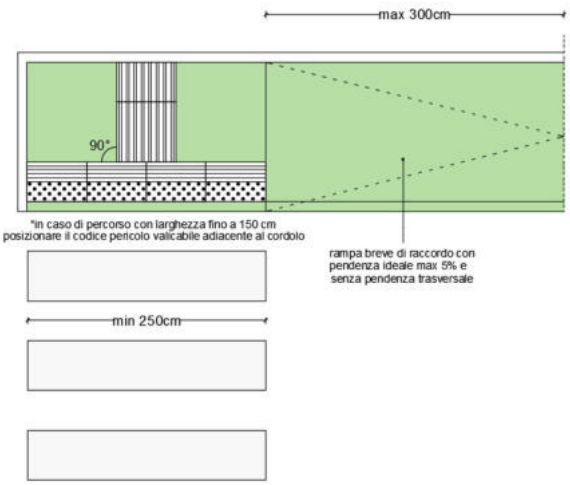

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03249.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata

0 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Via Lonzano 1, Udine	1	E 00FF5-03248

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 300,00 cm
Materiale	Porfido a cubetti	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato	
E 00FF5-03249	1	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Lonzano 1, Udine	4495 €	
E 00FF5-03247	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	--	
E 00FF5-03244	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 185, Udine	--	

IPOTESI DI SOLUZIONE

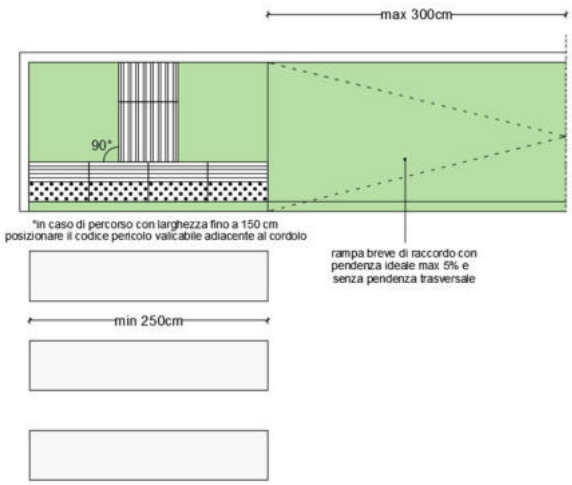

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03249.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore / Data Rilievo	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Lonzano 1, Udine	1	E 00FF5-03249

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 600 cm. Larghezza del marciapiede non presente 150 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03244	1	**Pendenza longitudinale Rampa breve di raccordo** Via Laipacco 185, Udine	--
E 00FF5-03247	1	**Pendenza trasversale Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	--
E 00FF5-03248	1	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Lonzano 1, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

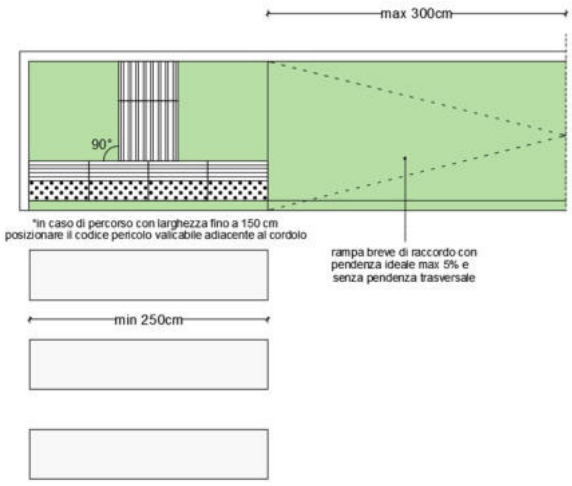

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa laterale in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03250)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso
4.495 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lonzano 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03250**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 600,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 600 cm. Larghezza del marciapiede non presente 110 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03251	**1**	**Ripiano orizzontale - Assenza Percorso pedonale** Via Lonzano 2, Udine	--

IPOTESI DI SOLUZIONE

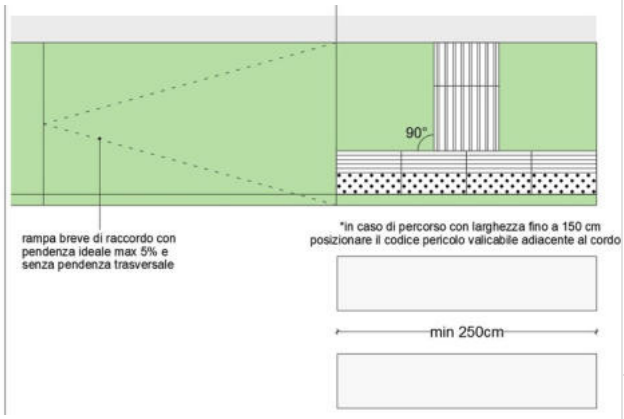

PS1809 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 90 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente in modo da garantire la continuità del percorso. Data la necessità di realizzare anche un nuovo attraversamento pedonale a raso, il marciapiede deve essere dotato di breve rampa lateralr in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti. Rampa con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), priva di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03249)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede e attraversamento pedonale a raso

4.420 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Lonzano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **08 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Lonzano 2, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03251**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 110,00 cm	Y 800,00 cm
Materiale	Ghiaino sciolto	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

	LIV.		Costo stimato
E 00FF5-03250	**1**	**Assenza Attraversamento pedonale** Via Lonzano 2, Udine	**4420 €**

IPOTESI DI SOLUZIONE

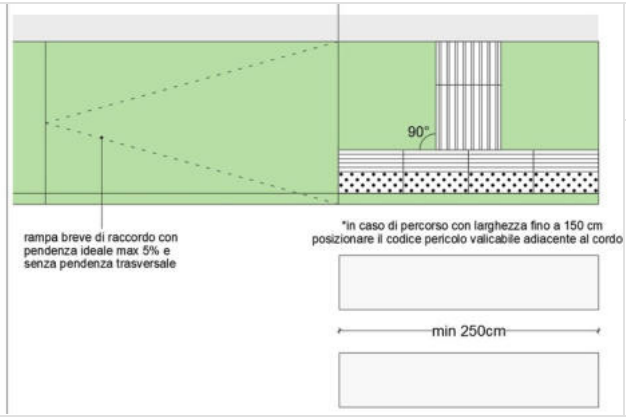

(modificato)
Soluzione già valutata

Criticità risolvibile mediante soluzione della criticità n 00FF5-03250.

STIMA DEL COSTO
Soluzione già valutata **0 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Monzambano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Via Monzambano, Laipacco	1	E 00FF5-03341

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Asfalto	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 720 cm. Larghezza del marciapiede di 100 cm. Dislivello di 10 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso (rampe laterali)

Realizzazione di attraversamento pedonale a raso. Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03342)

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di attraversamento pedonale a raso **3.585 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Monzambano

Rilevatore **0130**
Data Rilievo **09 Luglio 2025**
Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025

Indirizzo
Via Monzambano, Udine

LIV. di priorità
1

ID Scheda
E 00FF5-03342

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Assenza	Si	
Dimensioni	X 310,00 cm	Y 720,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
Larghezza della sede stradale di 720 cm. Larghezza del marciapiede di 133 cm. Dislivello di 13 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE



PS1809 (modificato)
Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali

Rifacimento del tratto di percorso con realizzazione di brevi rampe laterali in materiale analogo all'esistente, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini. Rampe con pendenza longitudinale max 5% (8% in caso di impossibilità), prive di pendenza trasversale. Posa di segnaletica tattilo-plantare conforme all'Abaco e di segnaletica verticale ed orizzontale conformi alle prescrizioni del Codice della Strada ed al suo Regolamento, incluse demolizioni e ripristini. (Lato opposto della Strada ID Scheda 00FF5-03341)

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso, comprese rampe di raccordo, e segnaletica tattilo-plantare

3.523 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Monzambano

Rilevatore	Indirizzo	LIV. di priorità	ID Scheda
Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monzambano, Udine**	2	E **00FF5-03343**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | PAVIMENTAZIONE

Sconnessioni	Si	
Dimensioni	X 133,00 cm	Y 650,00 cm
Materiale	Calcestruzzo	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

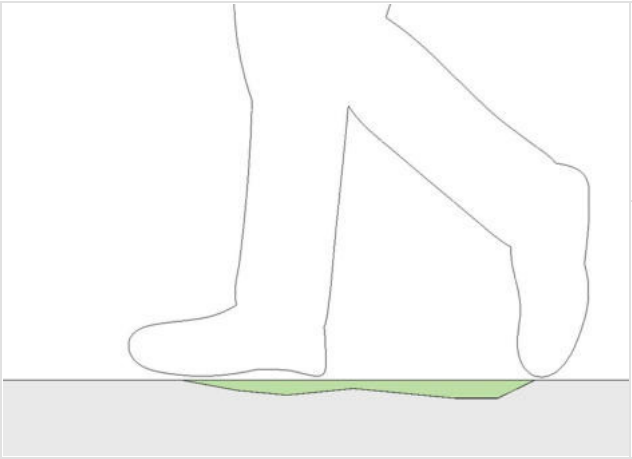

PS1739
Riparazione della pavimentazione

Rifacimento del sottofondo e della pavimentazione con materiale analogo all'esistente per il ripristino della planarità del piano di calpestio, da raccordare a raso e senza discontinuità alle pavimentazioni adiacenti, incluse demolizioni e ripristini.

STIMA DEL COSTO
Rifacimento del tratto di percorso **857 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Via Monzambano

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 23 Settembre 2025	Indirizzo **Via Monzambano, Udine**	LIV. di priorità **3**	ID Scheda **E 00FF5-03344**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE | OSTACOLO VERTICALE

Palo segnaletica	Si	
Dimensioni	X --	Y --
Materiale	Metallo	

Note relative al rilievo
Distanza di 30 cm tra palo (interasse) e muro. Larghezza minima di passaggio di 103 cm. Larghezza totale del marciapiede di 135 cm.

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

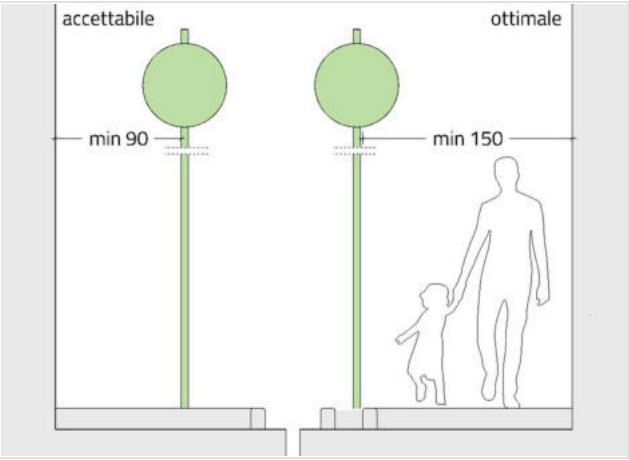

PS1733
Spostamento in area esterna al percorso pedonale

Rimozione del palo di segnaletica verticale e suo riposizionamento in area esterna ai percorsi pedonali, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento, inclusa eliminazione e rifacimento del plinto interrato.

STIMA DEL COSTO
Spostamento del palo di segnaletica verticale in area esterna al percorso pedonale

206 €

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Vicolo della Chiesa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Vicolo della Chiesa, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03358**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

Nessuna criticità collegata

IPOTESI DI SOLUZIONE

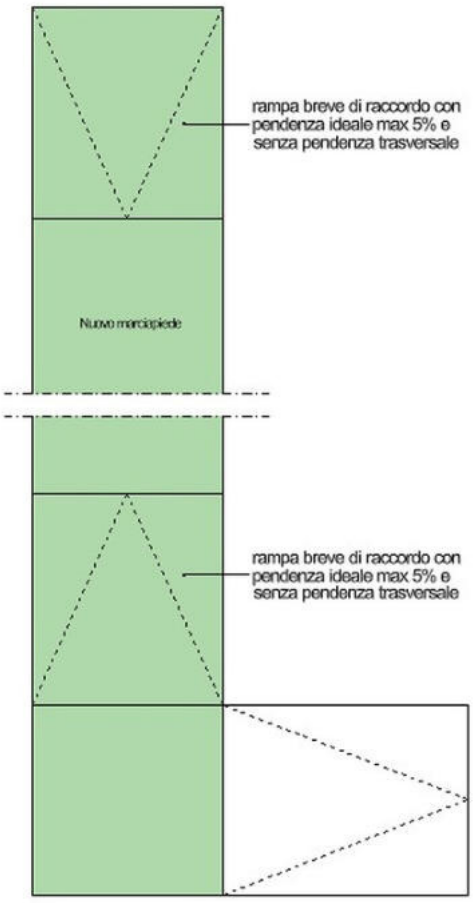

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente tramite rampe longitudinali con pendenza massima del 5% in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede **28.453 €**

PEBA comune di udine > LAIPACCO > Vicolo della Chiesa

Rilevatore **0130** Data Rilievo **09 Luglio 2025** Ultimo aggiornamento scheda: 29 Settembre 2025	Indirizzo **Vicolo della Chiesa, Udine**	LIV. di priorità **1**	ID Scheda **E 00FF5-03359**

RILIEVO STATO DI FATTO

ITINERARIO PEDONALE | PERCORSO PEDONALE

Ripiano orizzontale - Assenza	Si	
Dimensioni	X 150,00 cm	Y 9000,00 cm
Materiale	Seminato	

Note relative al rilievo
--

LINK ALTRE CRITICITÀ

E 00FF5-03361	LIV. **1**	**Altezza Dislivello** Via Laipacco 106, Udine	Costo stimato --

IPOTESI DI SOLUZIONE

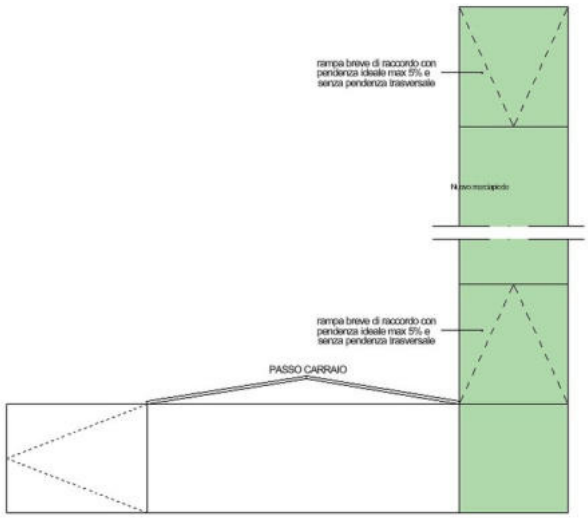

PS1749 (modificato)
Realizzazione di nuovo marciapiede

Realizzazione di marciapiede delimitato lungo la carreggiata da cordolo a contrasto cromatico. Larghezza min 150 cm, pendenza trasversale max 1%, dislivello da sede stradale max 15 cm. Il nuovo marciapiede dovrà raccordarsi al marciapiede esistente tramite rampe longitudinali con pendenza massima del 5% in modo da garantire la continuità del percorso.

STIMA DEL COSTO
Realizzazione di nuovo marciapiede

29.194 €
